

ЛИНЕЕН ГРАФИК

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

Обособена позиция № 9 "Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен"


№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. Мярка	Количество	Разходна норма труд ч.ч. за ед. количество	Човекочасове - общо	Времетраене труд ч.дни	Разходна норма механизация мсм	Бр. и вид на необходимата механизация		Общ брой мсм	Брой работници	Квалификацията на строителни работници	Продължителност в дни	Начало на СМР-та	Край на СМР-та	МЕСЕЦ 1				
								Брой механизация	Вид механизация							1	2	3	4	5
	Съставяне и подписване на двустранен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	ч.дни	1.00	8.00	8.00	1.00	-	-	-	-	1	Стр. инженер	1	1	1					
Обект:Асфалтиране на път за с.Синигер																				
1	Подравняване с грейдер	м2	300.00	-	-	-	0.00320	1	Грейдер	0.96	-	-	1	1	1					
2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	30.00	0.25000	7.50	0.94	0.02000	1	Валяк до 5т	0.60	1	Работник строителство	1	1	1					
							0.00110	1	Самосвал	0.03										
3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	т	36.00	1.09800	39.53	4.94	0.01100	1	Асфалторазстилаг	0.40	5	Работник строителство	1	2	2					
							0.02200	1	Валяк до 10т	0.79										
							0.01100	1	Валяк до 22т	0.40										
							0.01100	1	Валяк до 2т	0.40										
Обект:Асфалтиране на път Скалак-Къклица-Лимец-Матък Девесил																				
1	Подравняване с грейдер	м2	900.00	-	-	-	0.00320	1	Грейдер	2.88	-	-	3	2	4					
2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	90.00	0.25000	22.50	2.81	0.02000	1	Валяк до 5т	1.80	1	Работник строителство	3	2	4					
							0.00110	1	Самосвал	0.10										
3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	т	108.00	1.09800	118.58	14.82	0.01100	1	Асфалторазстилаг	1.19	5	Работник строителство	3	3	5					
							0.02200	1	Валяк до 10т	2.38										
							0.01100	1	Валяк до 22т	1.19										
							0.01100	1	Валяк до 2т	1.19										
	Съставяне и подписване на акт-образец 19 за действително извършени СМР-ти	ч.дни	1.00	8.00	8.00	1.00	-	-	-	-	1	Стр. инженер	1	5	5					
ВСИЧКО:						25.51				14.31	14									

Асфалторазстилаг: 1.59 мсм
 Валяк до 2 тона: 1.59 мсм
 Валяк до 5 тона: 2.40 мсм
 Валяк до 10 тона: 3.17 мсм
 Валяк до 22 тона: 1.59 мсм
 Грейдер: 3.84 мсм
 Самосвал: 0.13 мсм

ПОДПИС: _____
инж.Гюрчай Сюлейман !



ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА - Обособена позиция № 9 "Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен"

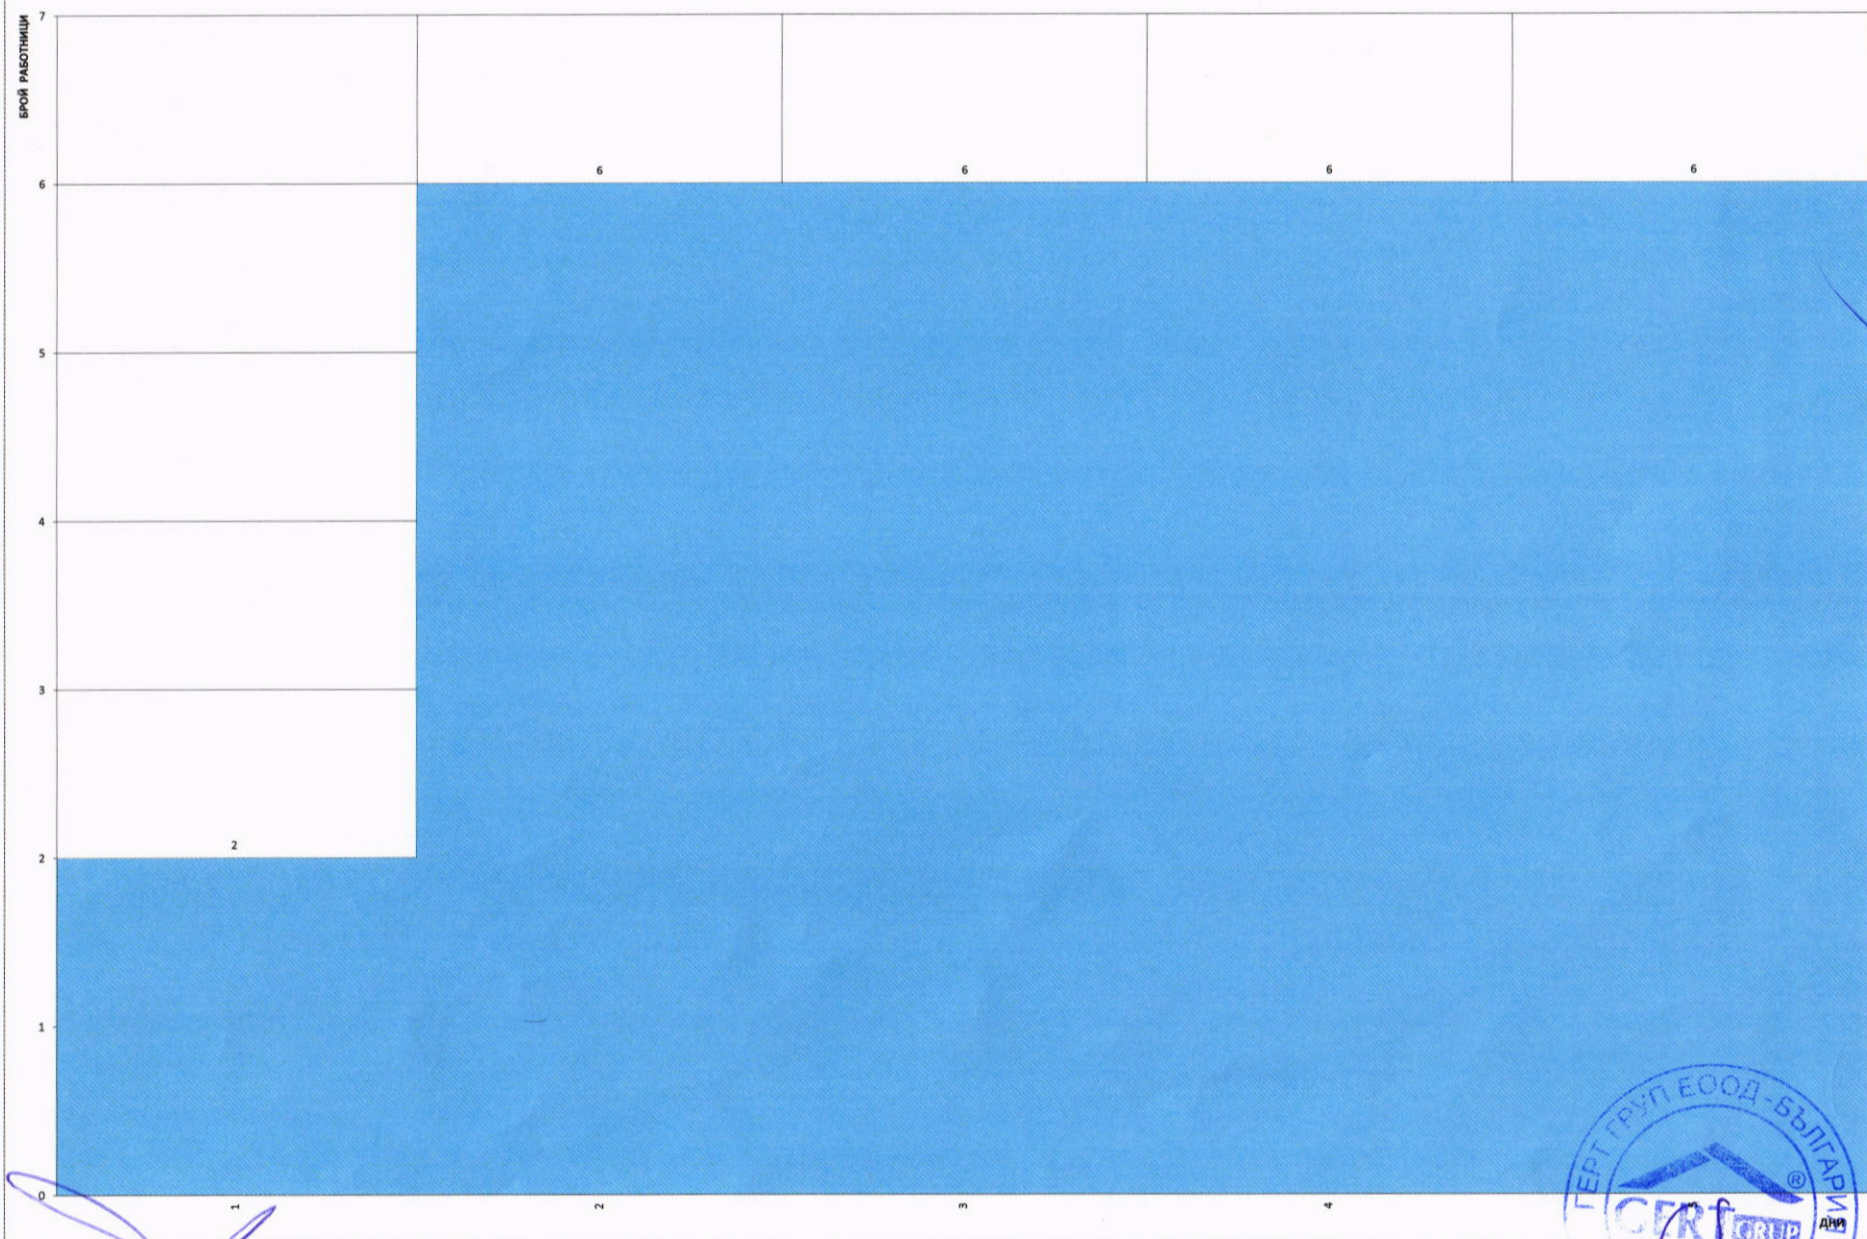


 ПОДПИС:
 / инж.Гюргий Сюсейман /
