ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ОФЕРЕНТ: "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ2212 /III-509, ТОКАЧКА-КРУМОВГРАД/-СКАЛАК-КЪКЛИЦА-ЛИМЕЦ-МАЛЪК ДЕВЕСИЛ – KRZ1220 ОТ КМ.0+000 ДО КМ.2+105

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Номер по ред	позиция съгл. ТС 2014	Описание	Показател ед.м	Показател Количество	бр. раб	Необходима механизация	от ден	до ден	бр. кал. дни
		Въвеждане и поддържане на ВОБД							
		Извършване на геодезически замервания							
1	2000	**ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА**	м	2 105,00					
1.1	2304	Почистване на банкетите	м2	5 262,50		Грейдер, Челен товарач	7	10	4
1.2	2305	Демонтаж на съществуваща предпазна ограда	m	639,00	4	Автокран,Ел.агрегат, Автомобил бордови	1	6	6
2	3000	**ЗЕМНИ РАБОТИ - МАСОВ ИЗКОП-НАСИП**	м3	12 894,38					
2.1	3300	ИЗКОПИ	м3	11 464,38		Грейдер, Челен товарач, Багер, булдозер, самосвал	1	26	26
2.1.1	3302	Видове изкопи	м3	11 464,38		Грейдер, Челен товарач, Багер	1	26	26
2.1.1.1	3302.3	Изкоп на неподходящ материал за изграждане на насип от почистване на банкети с дълбочина h=0.15m	m3	789,38		Грейдер, Челен товарач	7	10	4
2.1.1.2	3302.2	Изкоп на подходящ материал за изграждане на насип в у-к от км 0+305-0+400 - скални почви	m3	1 300,00		Багер	9	21	13
2.1.1.3	3302.3	Изкоп на неподходящ материал за изграждане на насип масов изкоп в земни почви	m3	9 375,00		Багер	1	26	26
2.1.2	3304	Технология на изкопните работи	м3	11 464,38		Грейдер, Челен товарач, Багер	1	26	26
2.1.2.1	3304.1	Депониране на неподходящ материал на депо до 20км	m3	10 164,38		Булдозер, Самосвал	1	26	26
2.1.2.2	3304.2	Депониране на подходящ материал на депо до 2км	m3	1 300,00		Булдозер, Самосвал	9	21	13
2.2	3400	Изграждане на насип от подходящ материал на депо до 2км	m3	1 200,00		Булдозер, Грейдер, Валяк вибрационен	22	27	6
1 2.3		Технологично фрезоване за постигане на проектни нива на студени рециклирания пласт и депониране на депо до 2км за влагане в студено рециклирания пласт	m3	230,00	3	Пътна фреза, Самосвал	3	8	6
3		**ПЪТНИ РАБОТИ**	m2	17 798,00					
3.1	6000	Изграждане на основен пласт от студено рециклиран материал на място с дебелина на пласта h=0.15-0.30m	m2	13 300,00	7	Рециклатор, Грейдер, Валяк вибрационен,Цистерна	43	52	10
3.1.1	4204	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м3	1 750,00		Рециклатор, Грейдер, Валяк вибрационен,Цистерна	43	52	10
3.1.2	6000	Технология на студено рециклирания пласт	м2	13 300,00		Рециклатор, Грейдер, Валяк вибрационен,Цистерна	43	52	10
3.2	3500	Изграждане на банкети	m2	4 498,00	7	Грейдер, Валяк вибрационен, Самосвал	60	72	13
3.2.1	3502,1	Банкети - Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м3	1 124,50		Грейдер, Валяк вибрационен, Самосвал	60	72	13
4	5000	**АСФАЛТОВИ РАБОТИ**	m2	12 115,00					
4.1	5700	Първи битумен разлив	m2	12 380,00		Автогодрунатор	53	58	6
4.2	5500	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР)(включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)	тон ton	1 782,72	7	Асфалтополагач, Валяк бандажен, Валяк бандажен-до 3 т, Валяк пневматичен,Водоноска	53	58	6
4.3	5800	Втори битумен разлив	m2	12 115,00		Автогодрунатор	59	62	4
4.4	5600	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см. (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)	m2	12 115,00	7	Асфалтополагач, Валяк бандажен, Валяк бандажен-до 3 т, Валяк пневматичен,Водоноска	59	62	4
5		**Изграждане на тротоари в зоната на мах.Победа**	m2	500,00					
5.1		Бетонов бордюр 18/35/100	m^1	310,00	5	Бордови автомобил, Бетоновоз	28	37	10
5.1.1		Доставка и полагане на бетон В15 за основа	м3	21,70		Бетоновоз	28	37	10
5.1.2		Доставка и полагане на бордюр 18/35/100	бр	310,00		Бордови автомобил	28	37	10
5.2		Бетонов бордюр 8/16/50	m^1	310,00	5	Бордови автомобил,Бетоновоз	38	42	5
5.2.1		Доставка и полагане на бетон В15 за основа	м3	3,10		Бетоновоз	38	42	5
5.2.2		Доставка и полагане на бордюр 8/16/50	м3	620,00		Бордови автомобил	38	42	5
5.3		Тротоарна настилка за колесно движение 2т	m^2	500,00	5	Багер, Валяк вибрационен, Автомобил бордови, Самосвал	36	51	16
5.3.1		Доставка и полагане на заклинен трошен камък с дебелина h=25см	м3	125,00		Багер, Валяк вибрационен,Самосвал	36	38	3
5.3.2		Доставка и полагане на подложен пясък с дебелина h=5см	м3	25,00		Багер, Валяк вибрационен,Самосвал	37	39	3
5.3.3		Доставка и полагане на бетонови плочи с дебелина h=5см	м2	750,00		Автомобил бордови	38	51	14
6	8000	**ОТВОДНЯВАНЕ**	m	2 105,00					
6.1	8330	Направа на отводнителен окоп с променливо напречно сечение	m	2 195,00	5	Багер, Самосвал,Автокран	1	44	44
6.1.1		Направа на отводнителен окоп с покритие от перфорирана стандартна геоклетъчна система от HDPE ленти, запълнена с дренажен материал d=5-20mm	м	2 045,00		Багер, Самосвал	6	44	39
6.1.2		Направа на отводнителен окоп от готови СТБ елементи 58/50/200 положени върху пясъчно легло с дебелина h=10cm	м	150,00		Багер, Автокран	1	5	5
6.2	8320	Направа на отводнителни улей по откосите - Италиански тип	m	88,00	5	Бордови автомобил, Бетоновоз, Багер	43	52	10

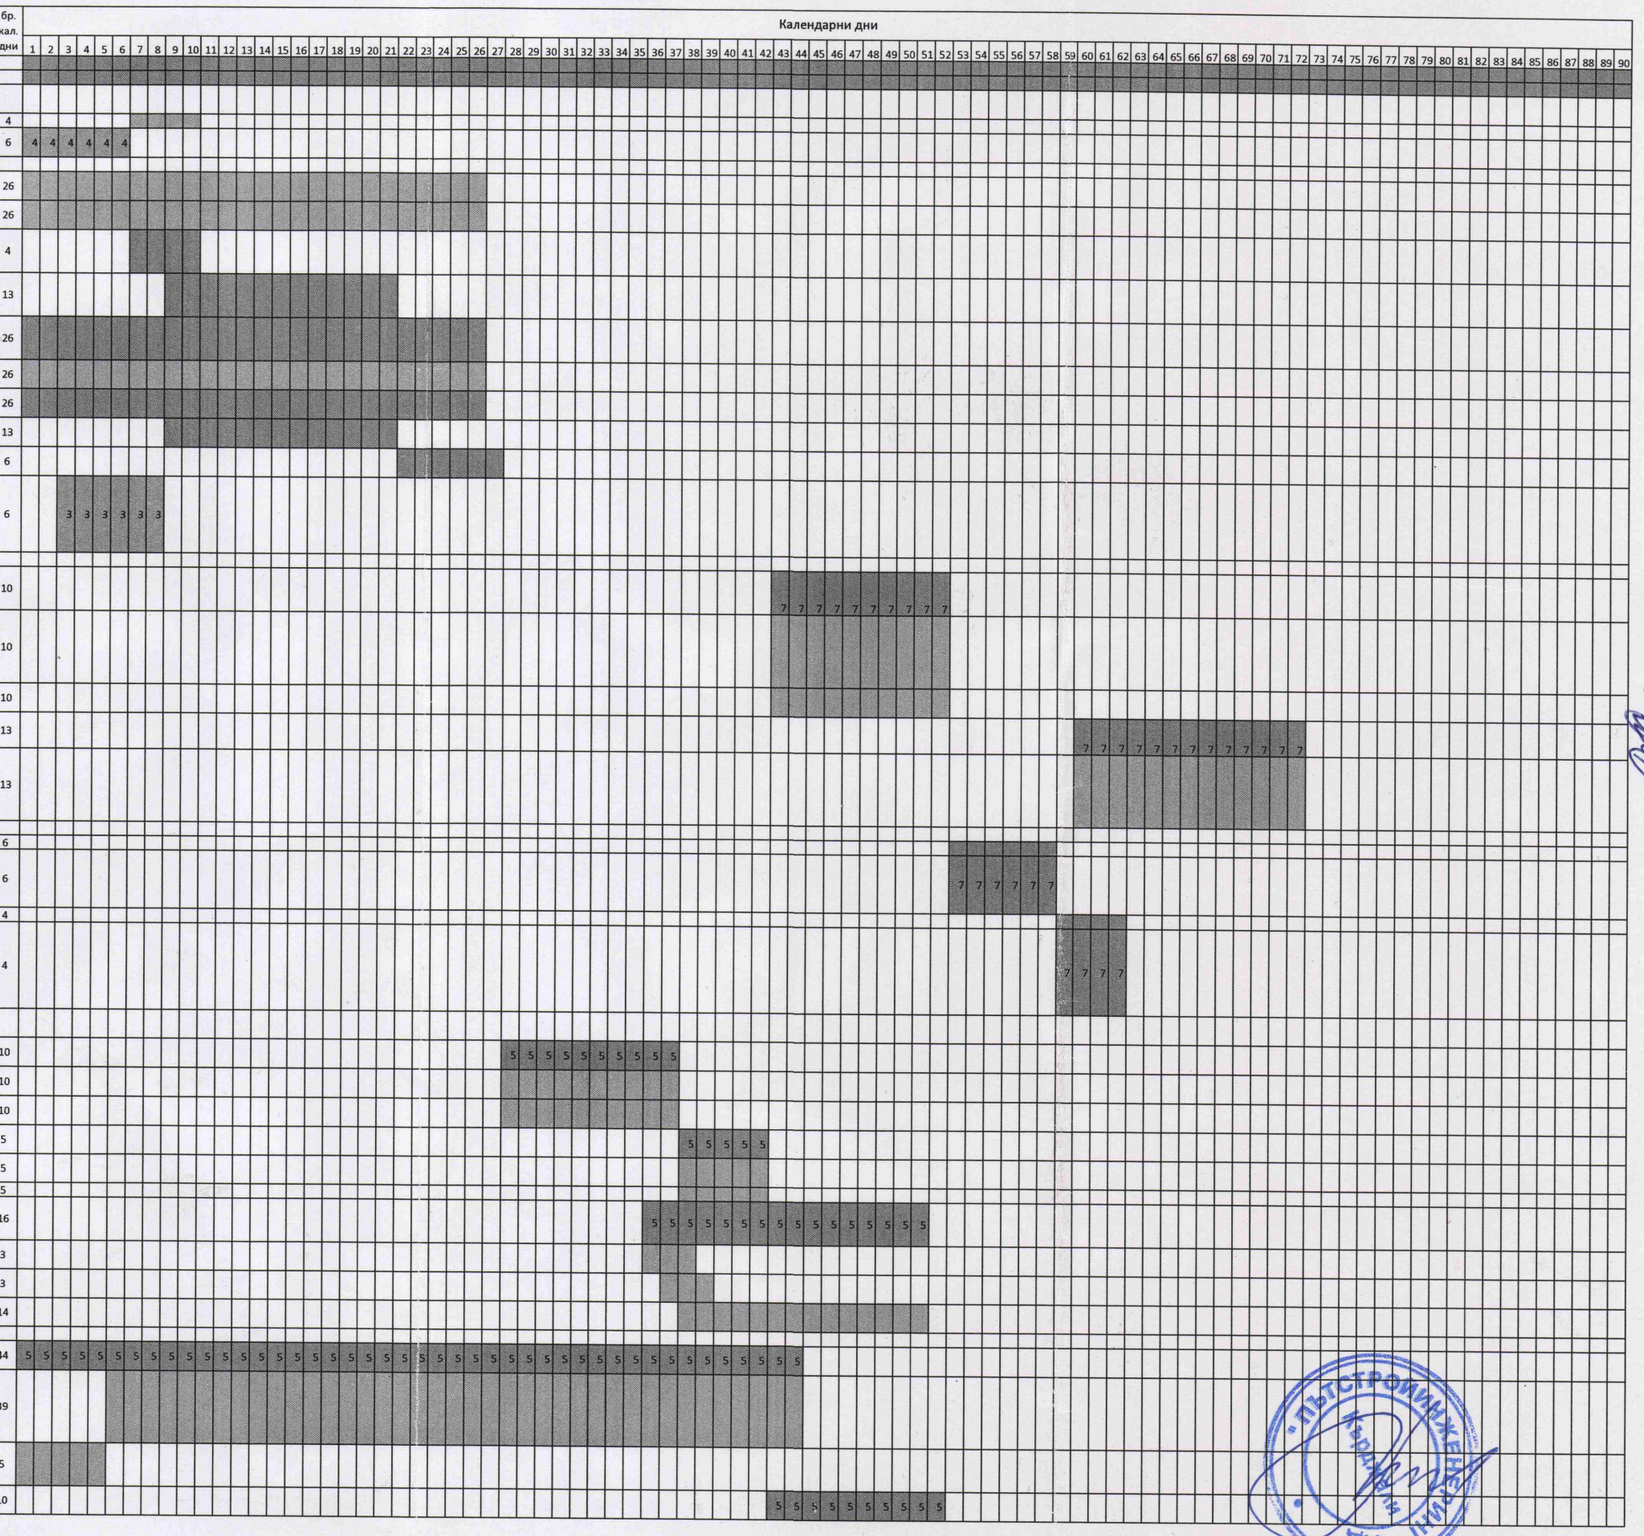

"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД
Кърджали
