Номер по ред	позиция съгл. ТС 2014	Описание	Показател ед.м	Показател Количество	бр. раб	Необходима механизация	от ден	до ден	бр. кал. дни
6.2.1		Подравняване на основата за постигане на проектни коти	м2	66,00		Багер	43	52	10
6.2.2		Доставка и полагане на бетон С 8/10 за основа с дебелина h=0.1m	м3	6,60		Бетоновоз	43	52	10
6.2.3		Доставка и полагане на бетонови улей съгласно БДС 11483.	бр	176,00		Бордови автомобил	43	52	10
6.3	8340	Направа на отводнителна ригола с променлива ширина и дебелина на монолитно положения бетон h=0.2m	m	455,00	6	Багер, Самосвал,Автомобил бордови,Валяк,Бетоновоз	43	72	30
6.3.1		Доставка и полагане на бетонов бордюр 18/35/100	$м^1$	455,00		Автомобил бордови	47	72	26
6.3.2		Подравняване на изкоп за постигане на проектни коти	$м^2$	531,00		Багер, Самосвал	43	53	11
6.3.3	4204	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	$м^3$	80,00		Багер, Самосвал,Валяк	46	54	9
6.3.4		Доставка и полагане на бетон С 25/30 за покритие на отводнителната ригола	$м^3$	106,00		Бетоновоз	47	72	26
6.4	8000	Направа на нови водоотводни колектори съгласно графичната част на проекта, с обща дължина L=462 и променлив напречен профил	m	462,00	6	Багер, Самосвал, Бордови автомобил, Автокран,Валяк,Бетоновоз	1	42	42
6.4.1		Направа на изкоп за съоръжения със средна ширина B=1.2m и дълбочина до 2.5м	$м^3$	1 200,00		Багер, Самосвал	1	25	25
6.4.2		Направа на обратен насип от дренажен материал, за съоръжения със средна ширина B=1.2m и дълбочина до 2.5м	$м^3$	1 112,66		Багер, Самосвал, Валяк	6	42	37
6.4.3		Доставка и полагане на плътна тръба DN 500 PP SN8	$м^1$	352,00		Автокран	4	18	15
6.4.4		Доставка и полагане на плътна тръба DN 600 PP SN8	$м^1$	20,00		Автокран	19	20	2
6.4.5		Доставка и полагане на перф. тръба DN 200 PP SN8 LP220*	$м^1$	400,00		Автокран	21	41	21
6.4.6		Направа на бетонова ревизионна шахта - вток с размери в план 1.5/1.5м	бр	9,00		Бетоновоз	10	20	11
6.4.7		Направа на бетонова ревизионна шахта - отток с размери в план 1.5/1.5м	бр	8,00		Бетоновоз	21	30	10
6.4.8		Направа на ревизионна шахта DN1000 от готови СТБ елементи	бр	12,00		Багер, Самосвал, Автокран	31	42	12
6.5		**Ремонт на съществуващи водостоци и нови подпорни стени съгласно част конструктивна**	бр pcs	9,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	1	35	35
6.5.1	8610	Водосток 1-На км:0+189	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	1	3	3
6.5.2	8610	Водосток 2-На км: 0+414	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	4	8	5
6.5.3	8610	Водосток 3-На км: 0+542	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	9	13	5
6.5.4	8610	Водосток 3А-На км: 0+670	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	14	16	3
6.5.5	8610	Водосток 4-На км: 0+891	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	17	19	3
6.5.6	8610	Водосток 5-На км: 1+092	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	20	22	3
6.5.7	8610	Водосток 6-На км: 1+571	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	23	27	5
6.5.8	8610	Водосток 7-На км: 1+752	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	28	32	5
6.5.9	8610	Водосток 8-На км: 1+817	бр	1,00	5	Багер, Самосвал,Бетоновоз	33	35	3
6.5.10	8620	Изграждане на нова подпорна стена за задържане на банкета в у-к от км 0+433 до км 0+448	m	15,00	5	Багер, Самосвал, Бетоновоз	1	10	10
6.5.11	8620	Изграждане на нова подпорна стена за задържане на банкета в у-к от км 0+675 до км 0+700	m	25,00	5	Багер, Самосвал, Бетоновоз	11	27	17
7	11000	**ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**	м	2 105,00					
7.1	1100	Изграждане на нови ограничителни системи съгласно проектната документация	бр	20,00	5	Багер с хидрочук	65	86	22
1.7.1	11115.1	Доставка и монтаж на стоманена ограда	м	1 692,00		Багер с хидрочук	65	86	22
1.7.2	11115.3	Занулявания за начало и край	бр	40,00		Багер с хидрочук	65	86	22
7.2	11200	Пътни знаци	бр	20,00	5	Автомобил бордови	87	88	2
7.2.1		Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	42,85		Автомобил бордови	87	88	2
7.2.2		Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	75,00		Автомобил бордови	87	88	2
7.2.3		Доставка и монтаж на индивидуални, рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	2,20		Автомобил бордови	87	88	2
7.2.4		Укрепване на индивидуални знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	2,00		Автомобил бордови	87	88	2
7.3	11200	Пътна маркировка	m	2 105,00	5	Маркировачна машина	89	90	2
7.3.1		Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	1 423,90		Маркировачна машина	89	90	2
		Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи,детайли, комплакти и др.)							
		Осигуряване на терени за нуждите на строителството-за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа							
		Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания							
		Съставяне на строителни книжа и изготвяне на едзекутивна документация на строежа							

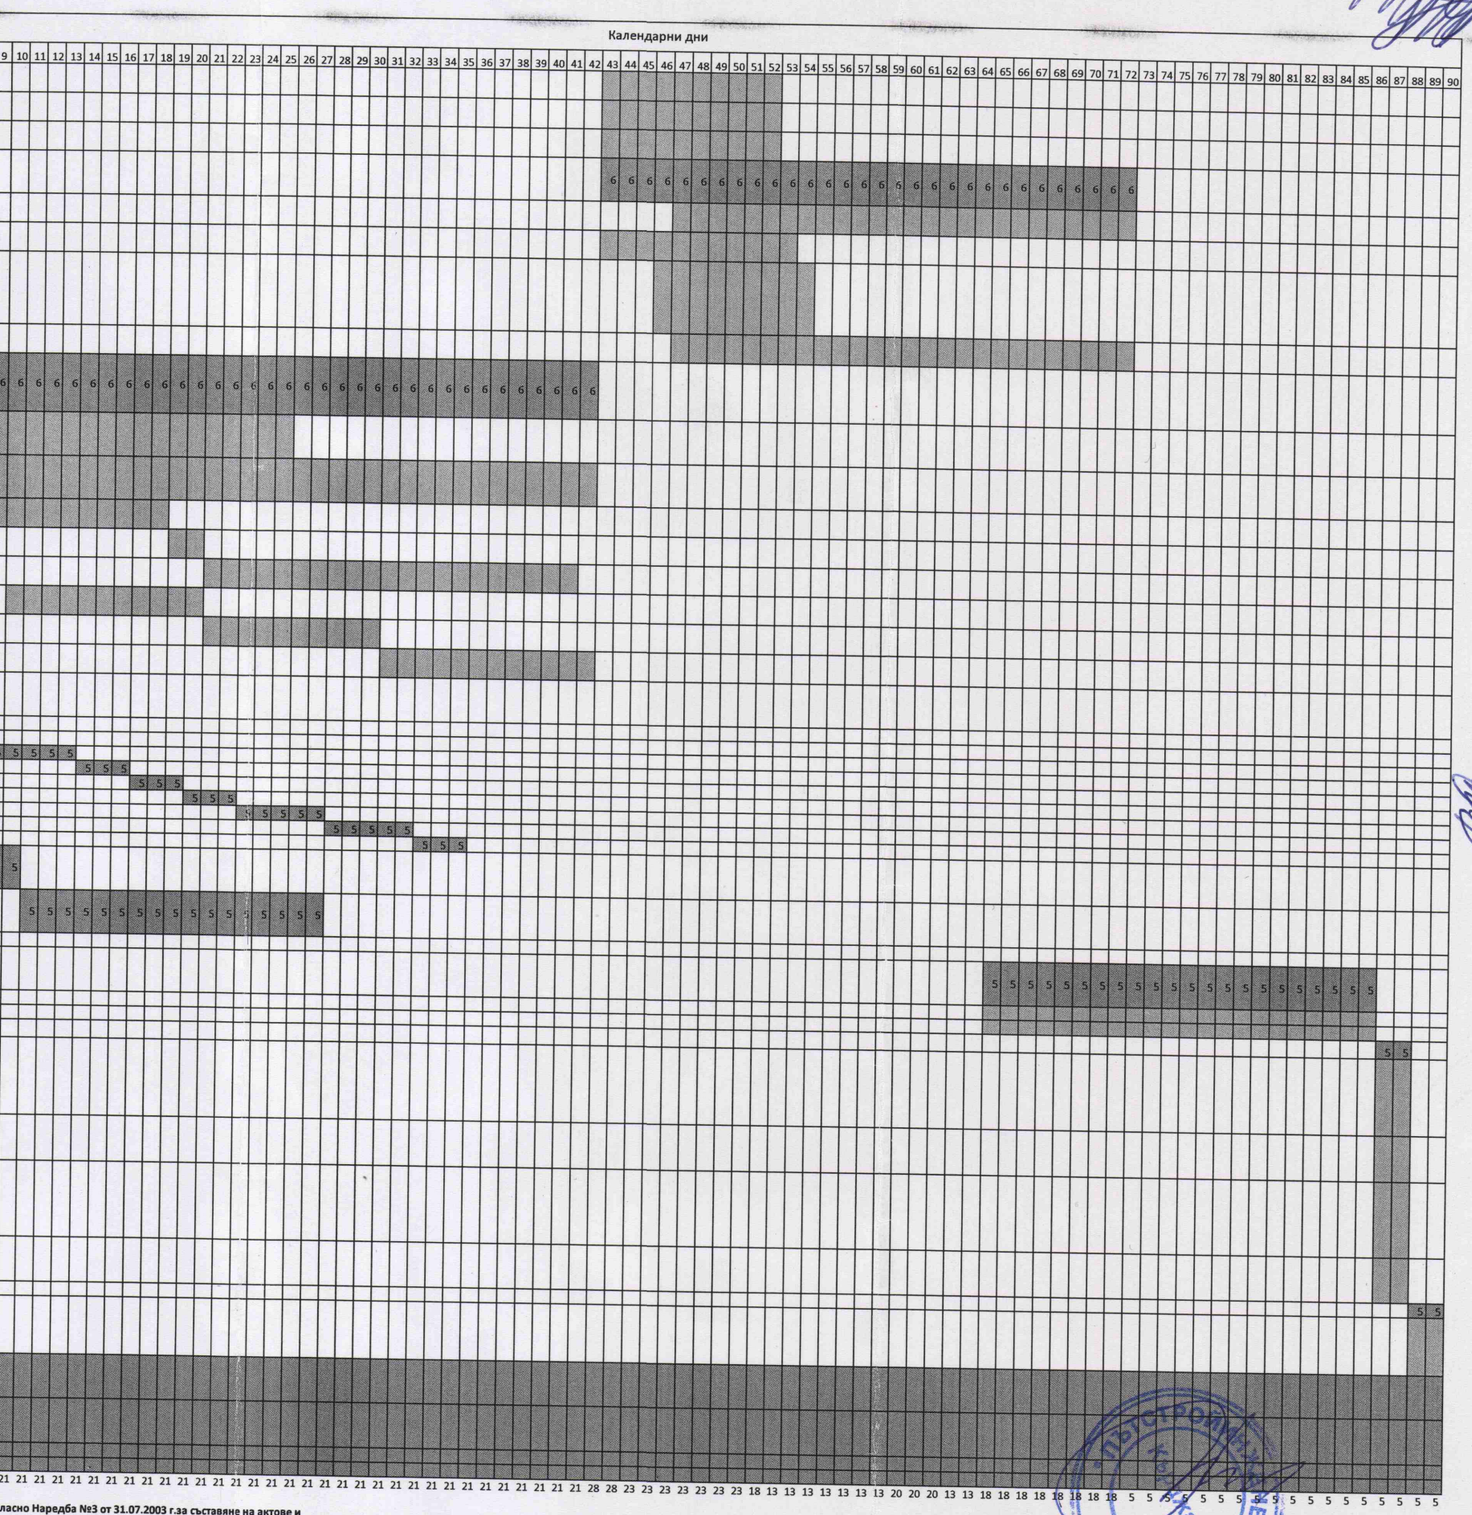

Забележка: За начало на Графика се счита датата на подписване на Протокол (обр.2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата, посочена в Уведомлението на Изпълнителя до Възложителяза готовността за приемане на строежа и съставяне на Констативен акт (обр.15)

ИЗП.ДИРЕКТОР:

(инж.Гинка Маринова)
