ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК :

ЗА ОБЕКТ :"Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в Център за временно настаняване на хора в нужда в гр.Крумовград"
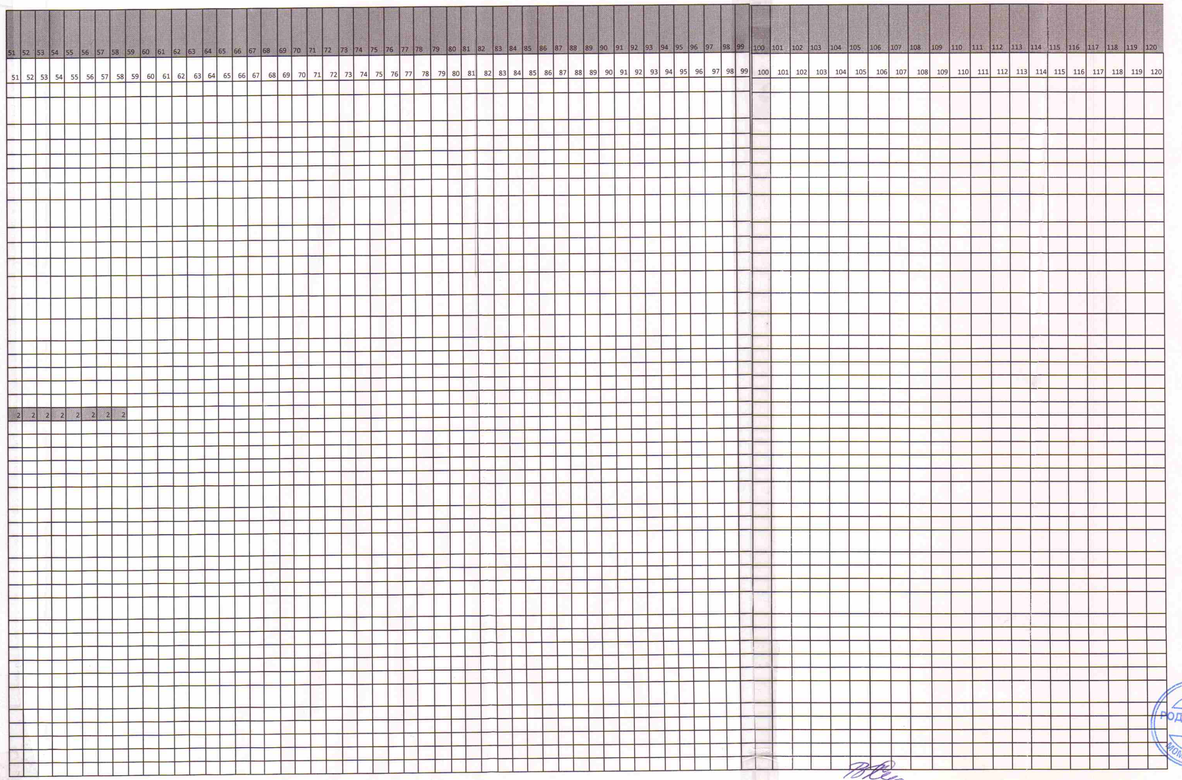
ном.	име	марка	к-во	норма време/ч,м / и /мсм/	бр. работници	бр.механизация	ч.дни	продължителност / к.дни
	Част "Архитектура" / Част "Архитектура"							
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЦ	м3	√ 0.58		1		0.35	0.35
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	КЪРТАЧИ			0.400	1	1		
	ТРУД							
	РАБОТНИК II ст.			2.550	1			
	РАБОТНИК I ст.			2.300				
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ	м2	√ 35.5		1		1.39	1.39
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	КЪРТАЧИ			0.100		1		
	ТРУД							
	РАБОТНИК II ст.			0.100				
	РАБОТНИК I ст.			0.214				
3	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	√ 53		1		3.64	3.64
	ТРУД							
	РАБОТНИК II ст.			0.550				
4	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	√ 36		2		2.48	1.24
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.550				
5	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА	м2	√ 561.92		2		47.06	23.53
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.670 √				
6	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	√ 692.11		4		99.49	24.87
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			1.150 √				
7	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛАМАРИНЕНИ ПЕРВАЗИ.	м	√ 141.93		1		5.85	5.85
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.330 √				
8	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ, КАЛКАН, МЕД.	м2	√ 175		2		7.66	3.83
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.200 √				
	РАБОТНИК I ст.			0.150 √				
9	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-043>>	м3	√ 7.64		2		6.69	3.34
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М			0.025 √		1		
	ТРУД							
	ЗИДАР III ст.			4.200 √				
	РАБОТНИК I ст.			2.800 √				
10	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>>	м2	√ 17.2		2		4.73	2.37
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М			0.005 √		1		
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			1.000 √				
	ЗИДАР II ст.			1.200
