ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

ОП 7 „Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Поточница“

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. Мярка	Количество	Разходна норма труд ч.ч. за ед.количество	Човекочасове - общо	Времетраене труд ч.дни	Разходна норма механизация мсм	Бр. и вид на необходимата механизация: Брой механизация	Бр. и вид на необходимата механизация: Вид механизации	Общ брой мсм	Брой работници	Квалификацията на строителни работници	Продължителност в дни	Начало на СМР-та	Край на СМР-та
	Съставяне и подписване на двустранен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	ч.дни	1.00	8.00	8.00	1.00	-	-	-	-	1	Стр. инженер	1	1	1
Обект:Асфалтиране на път Поточница-Поточарка-Стари Чал															
1	Подравняване с грейдер	м2	900.00	-	-	-	0.00320	1	Грейдер	2.88	-	-	3	1	3
2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	90.00	0.25000	22.50	2.81	0.02200	1	Валяк до 5т	1.98	1	Работник строителство	3	1	3
							0.00110	1	Самосвал	0.10					
3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	т	108.00	1.09800	118.58	14.82	0.01100	1	Асфалторазстилач	1.19	7	Работник строителство	3	2	4
							0.02200	1	Валяк до 10т	2.38					
							0.01100	1	Валяк до 22т	1.19					
							0.01100	1	Валяк до 2т	1.19					
Обект:Асфалтиране на главна улица м. Целина с.Поточарка															
1	Подравняване с грейдер	м2	600.00	-	-	-	0.00320	1	Грейдер	1.92	-	-	2	4	5
2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	60.00	0.25000	15.00	1.88	0.02200	1	Валяк до 5т	1.32	1	Работник строителство	2	4	5
							0.00110	1	Самосвал	0.07					
3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	т	72.00	1.09800	79.06	9.88	0.01100	1	Асфалторазстилач	0.79	8	Работник строителство	2	5	6
							0.02200	1	Валяк до 10т	1.58					
							0.01100	1	Валяк до 22т	0.79					
							0.01100	1	Валяк до 2т	0.79					
	Съставяне и подписване на акт-образец 19 за действително извършени СМР-ти	ч.дни	1.00	8.00	8.00	1.00	-	-	-	-	1	Стр. инженер	1	6	6
	ВСИЧКО:					**31.39**				**18.17**	**19**				

Асфалторазстилач:	1.98	мсм
Валяк до 2 тона:	1.98	мсм
Валяк до 5 тона:	3.30	мсм
Валяк до 10 тона:	3.96	мсм
Валяк до 22 тона:	1.98	мсм
Грейдер:	4.80	мсм
Самосвал:	0.17	мсм

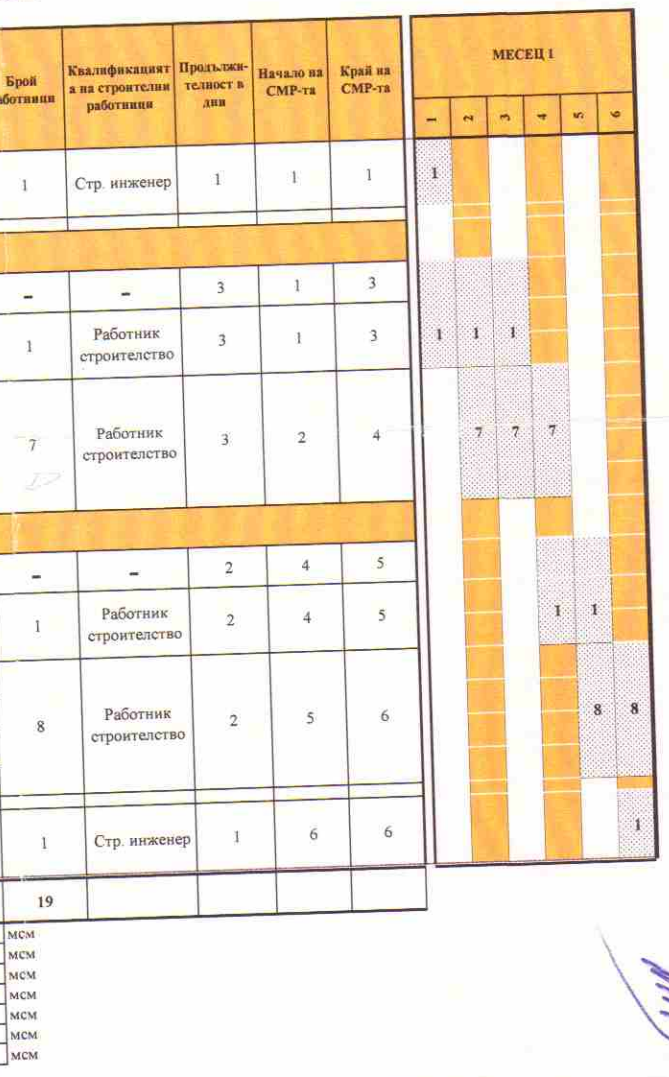

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА - ОП 7 „Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Поточница“

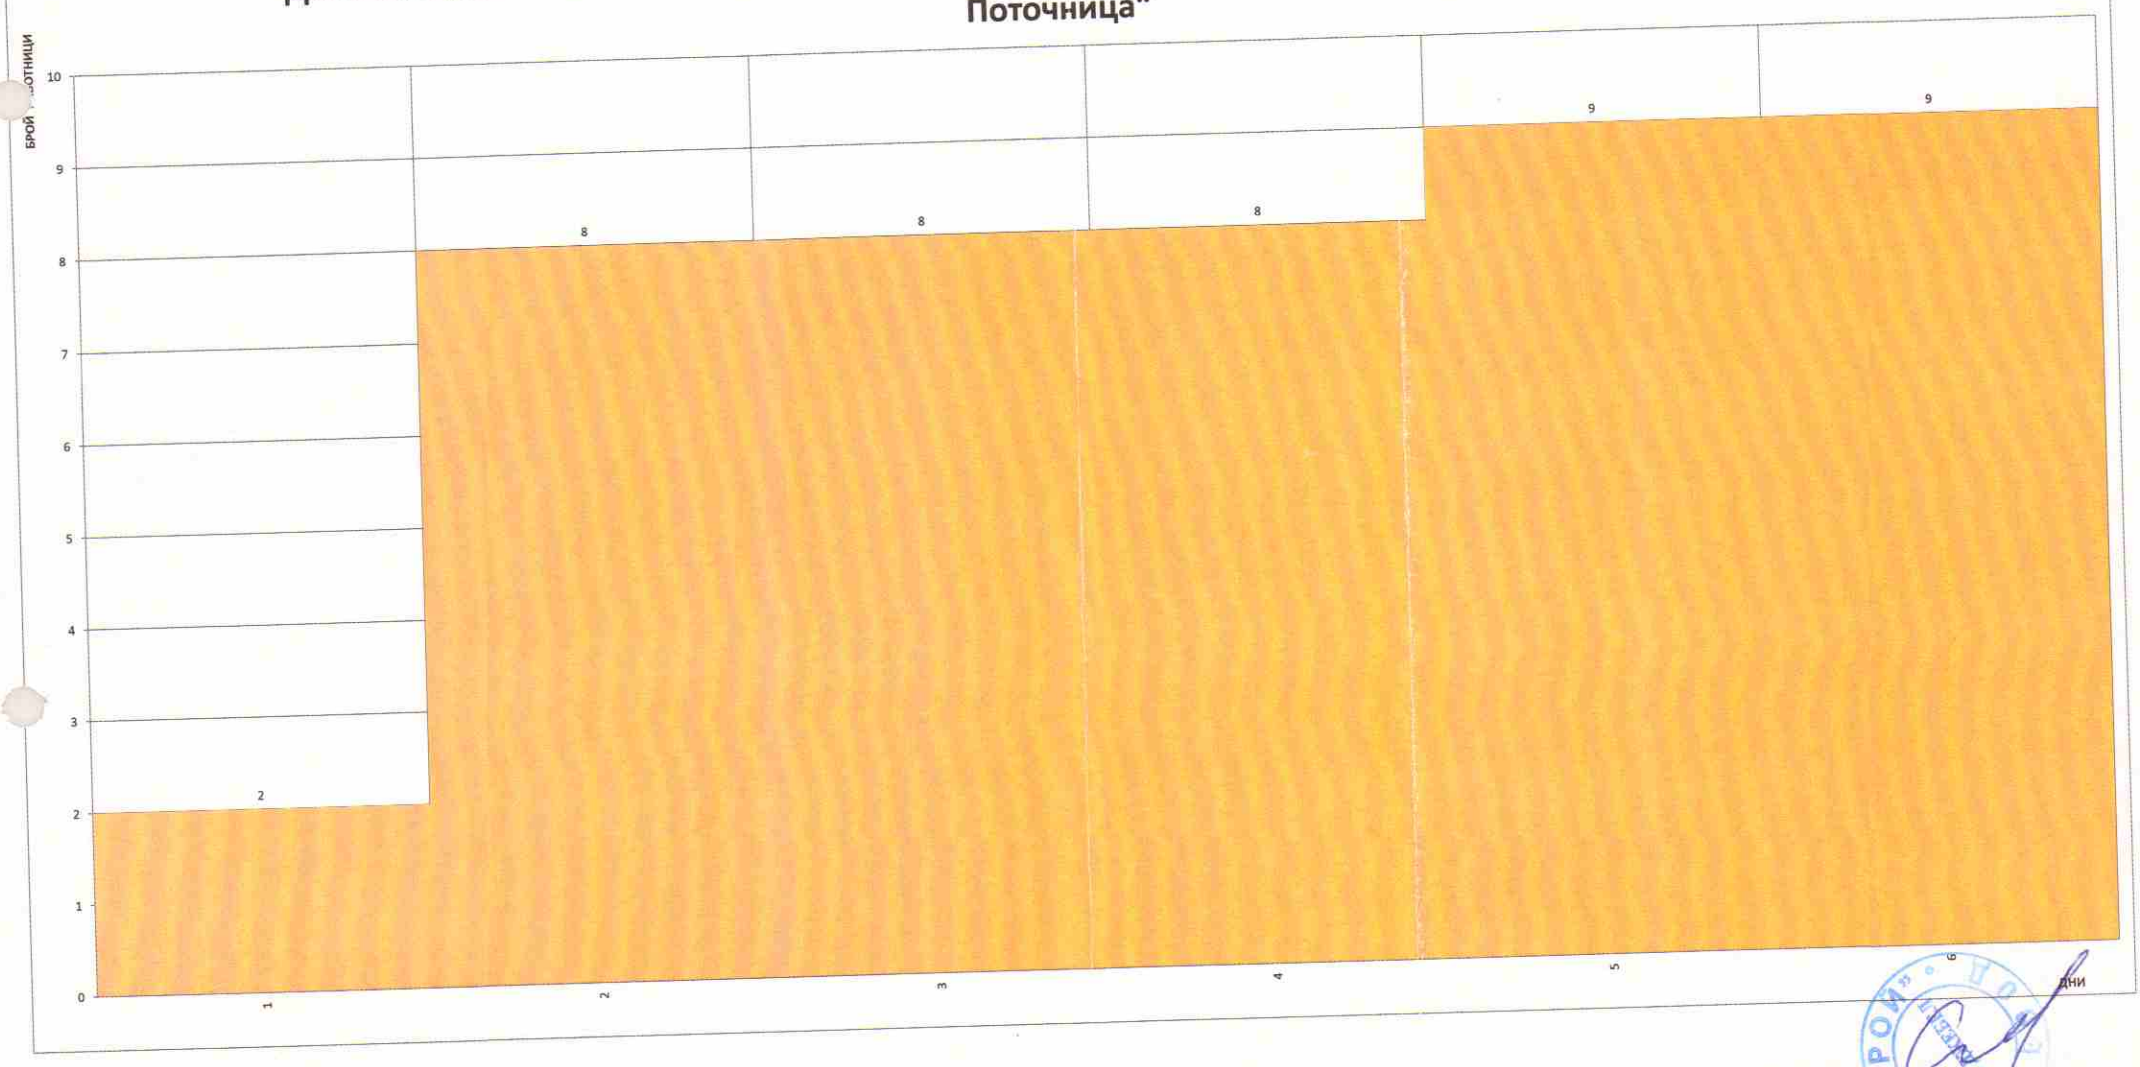

УПРАВИТЕЛ:.....

/ Сенай Басим /
