ГРАФИК НА ИЗПОЛЗВАНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ

Номер	Наименование	мярка	К-во	начало	край	механизация	р.м.	мсм	дни	машини
	Обособена позиция №10 "Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен", Община Крумовград									
	Бетонова настилка на път за м. Дядовци, с Голямо Каменяне									
1	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	497,00	Ден 1	Ден 3	Няма механизация	0,000	0,000	3	0
				Ден 4	Ден 4	багер	0,010	0,490	1	1
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	49,00	Ден 4	Ден 4	товарен автомобил самосвал	0,005	0,245	1	1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	63,00	Ден 5	Ден 5	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 6	Ден 7	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	49,00	Ден 8	Ден 14	Бетоновоз	0,030	1,470	7	1
	Бетонова настилка на път за м. Хвойнова, с. Девисславо									
6	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 52	Ден 52	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
				Ден 53	Ден 53	багер	0,010	0,150	1	1
7	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 53	Ден 53	товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
8	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 54	Ден 54	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
9	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 55	Ден 55	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
10	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 56	Ден 57	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за м. Букова, с. Девисславо									
11	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 58	Ден 58	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
				Ден 59	Ден 59	багер	0,010	0,150	1	1
12	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 59	Ден 59	товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
13	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 60	Ден 60	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
14	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 61	Ден 61	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
15	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 62	Ден 63	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за м. Дюлтерска, с. Аврен									
16	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 25	Ден 26	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
				Ден 27	Ден 27	багер	0,010	0,300	1	1
17	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 27	Ден 27	товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
18	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 28	Ден 28	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
19	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 29	Ден 30	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
20	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 31	Ден 34	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Узунджа, с. Аврен									
21	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 35	Ден 35	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
				Ден 36	Ден 36	багер	0,010	0,150	1	1
22	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 36	Ден 36	товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
23	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 37	Ден 37	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
24	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 38	Ден 38	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
25	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 39	Ден 40	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за махала с. Черничево									
26	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 15	Ден 16	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
				Ден 17	Ден 17	багер	0,010	0,300	1	1
27	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 17	Ден 17	товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
28	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 18	Ден 18	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
29	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 19	Ден 20	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
30	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 21	Ден 24	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Подпорни стени в с. Етрек									
31	Дълбаване на бетон с багер хидрочук	м3	27,00	Ден 100	Ден 101	Багер хидрочук	0,330	8,910	2	1
32	Изкоп с шир. до 0.60м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви <<01-01-029>>	м3	20,00	Ден 102	Ден 103	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
33	Кофраж за подпорни стени <<02-05-028>>	м2	262,00	Ден 104	Ден 122	Товарен автомобил самосвал.	0,004	0,096	19	1
34	Изработка и монтаж на армировка <<02-06-003>>	кг	979,00	Ден 123	Ден 125	Няма мехванизация	0,000	0,000	3	0
35	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени <<02-07-020>>	м3	62,00	Ден 126	Ден 132	Бетоновоз	0,030	1,860	7	1
36	Изработка и монтаж на предпазен парапет тежъл тип 1бет/м <<12-01-0481>>	м	35,00	Ден 133	Ден 134	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
	Бетонова настилка на път за м. Красева, с. Малък Девисла									
37	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 64	Ден 65	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
				Ден 66	Ден 66	багер	0,010	0,300	1	1
38	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 66	Ден 66	товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
39	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 67	Ден 67	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
40	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 68	Ден 69	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
41	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 70	Ден 73	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Централа, с. Малък Девисла									
42	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 74	Ден 75	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
				Ден 76	Ден 76	багер	0,010	0,300	1	1
43	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 76	Ден 76	товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
44	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 77	Ден 77	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
45	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 78	Ден 79	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
46	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 80	Ден 83	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка за м. Долна, с. Голям Девисла									
47	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 84	Ден 85	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
				Ден 86	Ден 86	багер	0,010	0,300	1	1
43	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 86	Ден 86	товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
49	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 87	Ден 87	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
50	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 88	Ден 89	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
51	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 90	Ден 93	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка за м. Горна, с. Голям Девисла									
52	Ручно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 94	Ден 94	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
				Ден 95	Ден 95	багер	0,010	0,150	1	1
53	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 95	Ден 95	товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
54	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 96	Ден 96	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
55	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 97	Ден 97	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
56	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 98	Ден 99	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Подпорна стена на път за с. Девислица, мах. Лъкатова									
57	Изкоп с шир. до 0.60м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви <<01-01-029>>	м3	5,00	Ден 41	Ден 41	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
58	Кофраж за подпорни стени <<02-05-028>>	м2	76,00	Ден 42	Ден 48	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	7	1
59	Изработка и монтаж на армировка <<02-06-003>>	кг	36,00	Ден 49	Ден 49	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
60	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени <<02-07-020>>	м3	16,00	Ден 50	Ден 51	Бетоновоз	0,030	0,480	2	1

Първи месец

Втори месец

Трети месец

Четвърти месец

Пети месец

ЕТ "ЕРЗП ИНВЕСТ"
Р. ТЪРНОВО
КОФР

ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ

Номер	Наименование	Мярка	К-во	Норма време ч.ч.	Времетрене ч.ч.	Времетрене ч.дни	Брой работници	Дни	Начало	Край
	Обособена позиция №10 "Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Голямо Каменяне и Аврен", община Кърмовград									
	Бетонова настилка на път за м. Дядовци, с Голямо Каменяне									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	497,00	0,23	114,31	14,29	5	3	Ден 1	Ден 3
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	49,00	0,28	13,72	1,72	2	1	Ден 4	Ден 4
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	63,00	0,70	44,10	5,51	6	1	Ден 5	Ден 5
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 6	Ден 7
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	49,00	4,19	205,31	25,66	4	7	Ден 8	Ден 14
	Бетонова настилка на път за м. Хвойнова, с. Девисилово									
6	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	5	1	Ден 52	Ден 52
7	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 53	Ден 53
8	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 54	Ден 54
9	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 55	Ден 55
10	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 56	Ден 57
	Бетонова настилка на път за м. Букова, с. Девисилово									
11	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	5	1	Ден 58	Ден 58
12	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 59	Ден 59
13	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 60	Ден 60
14	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 61	Ден 61
15	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 62	Ден 63
	Бетонова настилка на път за м. Дългерска, с. Аврен									
16	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	5	2	Ден 25	Ден 26
17	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 27	Ден 27
18	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 28	Ден 28
19	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 29	Ден 30
20	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 31	Ден 34
	Бетонова настилка на път за м. Узунка, с. Аврен									
21	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	5	1	Ден 35	Ден 35
22	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 36	Ден 36
23	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 37	Ден 37
24	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 38	Ден 38
25	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 39	Ден 40
	Бетонова настилка на път за махала с. Черничево									
26	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	5	2	Ден 15	Ден 16
27	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 17	Ден 17
28	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 18	Ден 18
29	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 19	Ден 20
30	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 21	Ден 24
	Подпорни стени в с. Етрек									
31	Разбиване на бетон с багер чукдачук	м3	27,00	2,64	71,28	8,91	5	2	Ден 100	Ден 101
32	Изкоп с шир. до 0.60м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви <<01-01-029>>	м3	20,00	4,41	88,20	11,03	6	2	Ден 102	Ден 103
33	Кофраж за подпорни стени <<02-05-028>>	м2	262,00	4,03	1056,91	132,11	7	19	Ден 104	Ден 122
34	Изработка и монтаж на армировка <<02-06-003>>	кг	979,00	0,10	97,90	12,24	5	3	Ден 123	Ден 125
35	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени <<02-07-020>>	м3	62,00	4,19	259,78	32,47	5	7	Ден 126	Ден 132
36	Изработка и монтаж на предпазен паралет тежъл тип 15кг/м <<12-01-049>>	м	35,00	1,68	58,63	7,33	4	2	Ден 133	Ден 134
	Бетонова настилка на път за м. Красева, с. Малък Девисил									
37	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	5	2	Ден 64	Ден 65
38	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 66	Ден 66
39	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 67	Ден 67
40	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 68	Ден 69
41	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 70	Ден 73
	Бетонова настилка на път за м. Централна, с. Малък Девисил									
42	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	5	2	Ден 74	Ден 75
43	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 76	Ден 76
44	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 77	Ден 77
45	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 78	Ден 79
46	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 80	Ден 83
	Бетонова настилка за м. Долна, с. Голям Девисил									
47	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	5	2	Ден 84	Ден 85
48	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 86	Ден 86
49	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 87	Ден 87
50	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 88	Ден 89
51	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 90	Ден 93
	Бетонова настилка за м. Горна, с. Голям Девисил									
52	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	5	1	Ден 94	Ден 94
53	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 95	Ден 95
54	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 96	Ден 96
55	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 97	Ден 97
56	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 98	Ден 99
	Подпорна стена на път за с. Девсилица, мах. Лиляшка									
57	Изкоп с шир. до 0.60м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви <<01-01-029>>	м3	5,00	4,41	22,05	2,76	3	1	Ден 41	Ден 41
58	Кофраж за подпорни стени <<02-05-028>>	м2	76,00	4,03	306,58	38,32	6	7	Ден 42	Ден 48
59	Изработка и монтаж на армировка <<02-06-003>>	кг	36,00	0,10	3,60	0,45	1	1	Ден 49	Ден 49
60	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени <<02-07-020>>	м3	16,00	4,19	67,04	8,38	5	2	Ден 50	Ден 51

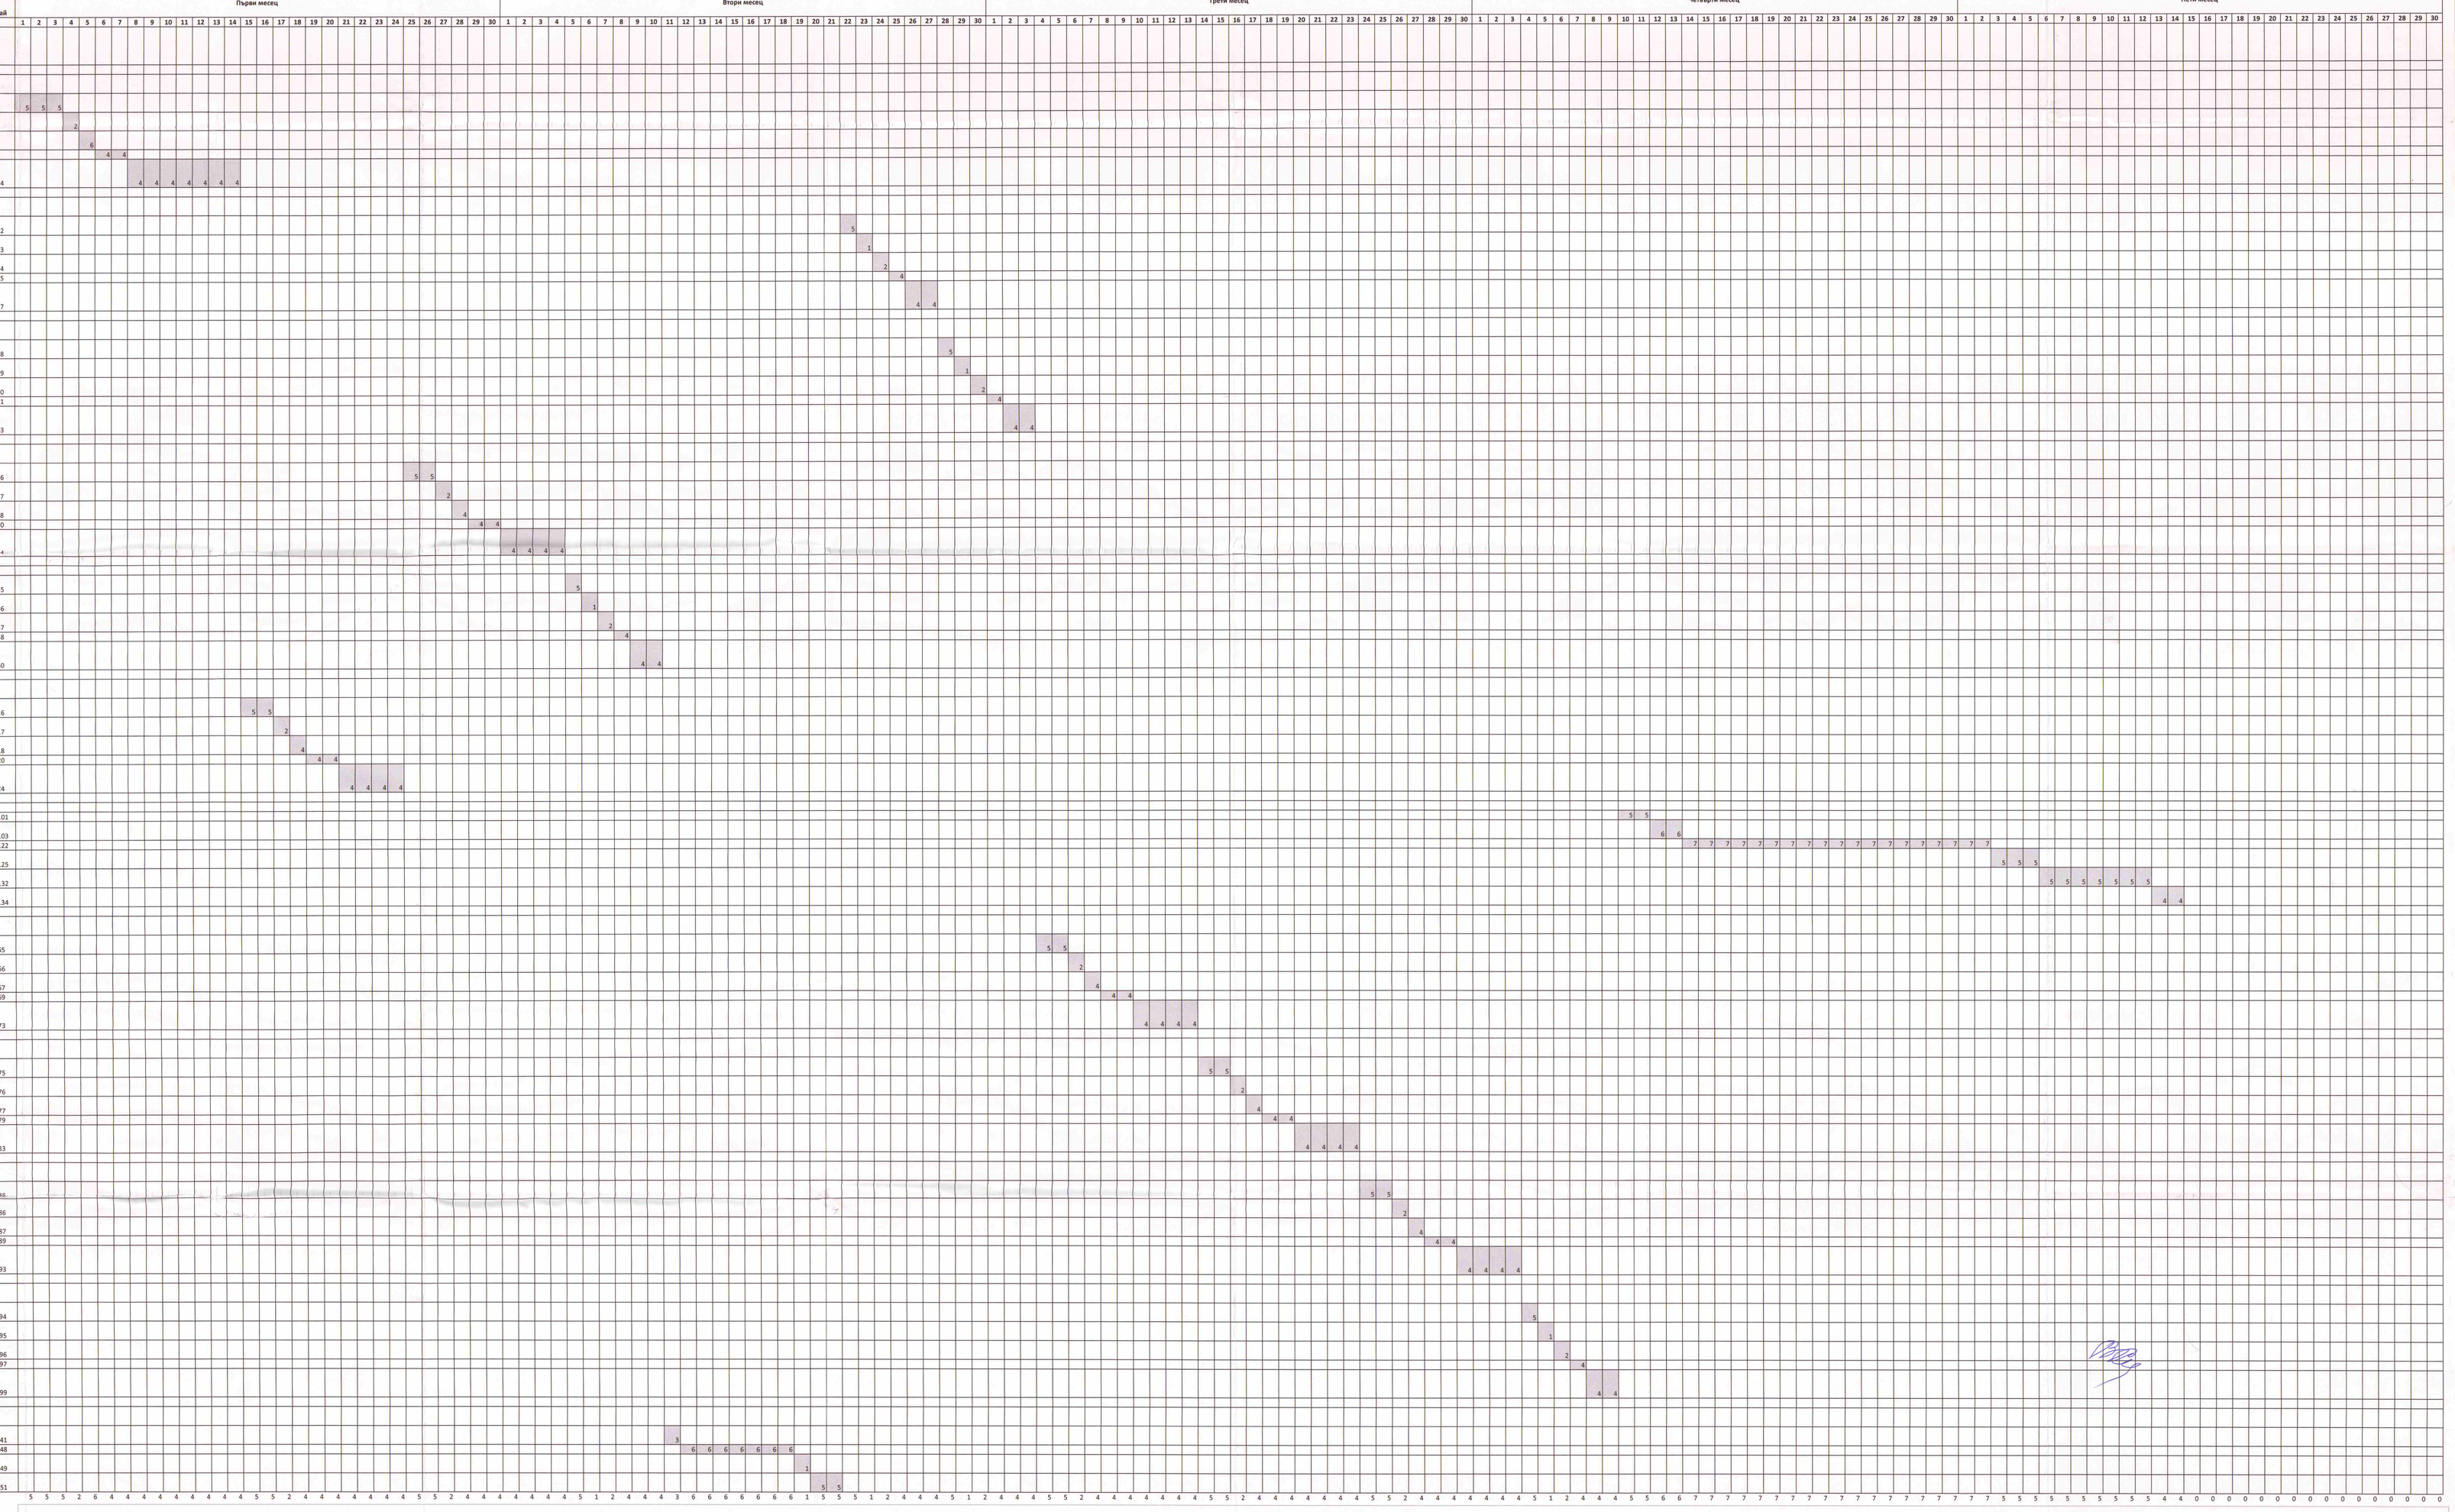
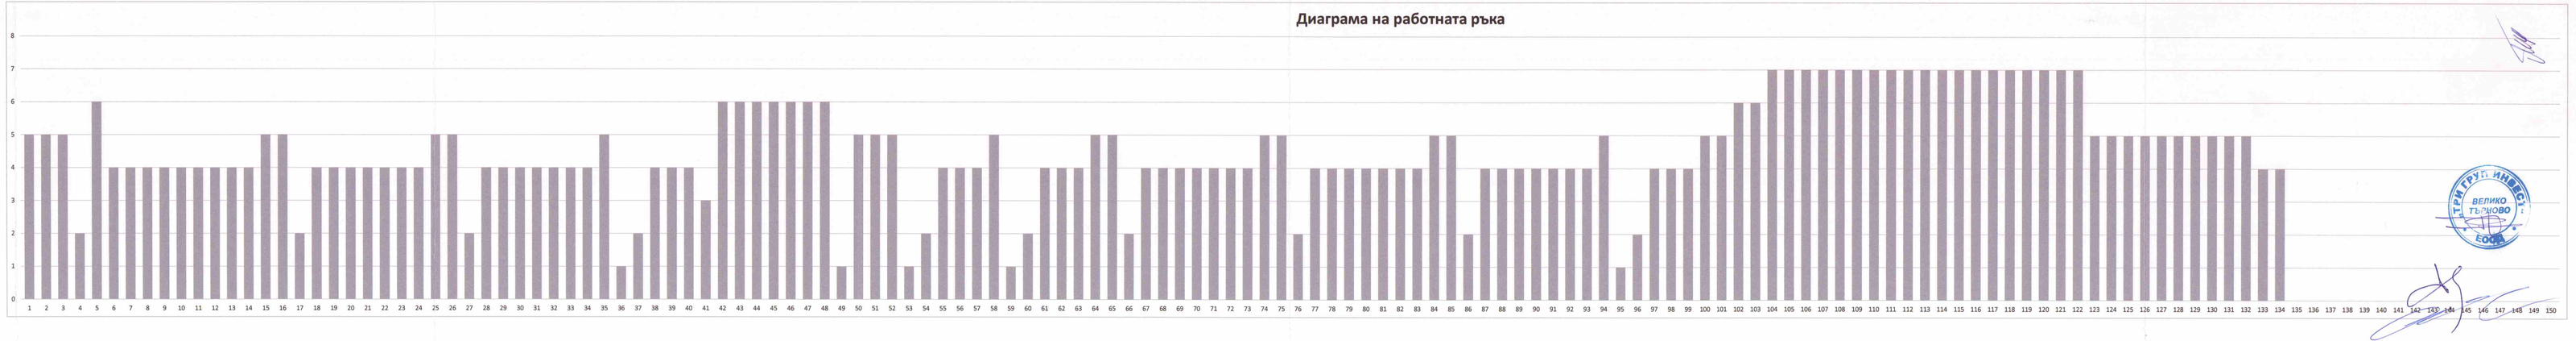
ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА
