ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ

Номер	Наименование	мярка	Х-во	Норма време ч.ч.	Времетрене ч.ч.	Времетрене ч. дни	Брой работници	Дни	Начало	Край
	Обособена позиция №2 "Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Пригродски"община Кръмовград									
	Подпорна стена на улица в с. Орех									
1	Износ с шир. до 0.60м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви <<01-01-020>>	м3	12,00	4,41	52,92	6,62	4	2	Ден 1	Ден 2
2	Кофраж за подпорни стени <<02-05-028>>	м2	24,00	4,03	96,82	12,10	5	3	Ден 3	Ден 5
3	Изработка и монтаж на армировка <<02-06-003>>	кг	96,00	0,10	9,60	1,20	2	1	Ден 6	Ден 6
4	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени <<02-07-020>>	м3	4,00	4,19	16,76	2,10	3	1	Ден 7	Ден 7
	Бетонова настилка на път за м. Зейка, с. Орех									
5	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	3	2	Ден 8	Ден 9
6	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 10	Ден 10
7	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 11	Ден 11
8	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 12	Ден 12
9	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 13	Ден 14
	Бетонова настилка на път за м. Бодрово, с. Орех									
10	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	240,00	0,23	55,20	6,90	4	2	Ден 15	Ден 16
11	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	24,00	0,28	6,72	0,84	1	1	Ден 17	Ден 17
12	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	30,00	0,70	21,00	2,63	3	1	Ден 18	Ден 18
13	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	18,00	2,72	49,01	6,13	4	2	Ден 19	Ден 20
14	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	24,00	4,19	100,56	12,57	5	3	Ден 21	Ден 23
	Бетонова настилка на път за м. Врана, с. Лозичка									
15	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	3	2	Ден 24	Ден 25
16	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 26	Ден 26
17	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 27	Ден 27
18	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 28	Ден 28
19	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 29	Ден 30
	Бетонова настилка на път за м. Тайник, с. Овощри									
20	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	3	3	Ден 31	Ден 33
21	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 34	Ден 34
22	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 35	Ден 35
23	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 36	Ден 37
24	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 38	Ден 41
	Бетонова настилка на път за м. Косовци, с. Дъбинка									
25	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	3	2	Ден 49	Ден 50
26	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 51	Ден 51
27	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 52	Ден 52
28	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 53	Ден 53
29	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 54	Ден 55
	Бетонова настилка на път за м. Байково, с. Дъбинка									
30	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	3	2	Ден 56	Ден 57
31	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 58	Ден 58
32	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 59	Ден 59
33	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 60	Ден 60
34	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 61	Ден 62
	Бетонова настилка на път за м. Младост, с. Горна Кула									
35	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	3	3	Ден 63	Ден 65
36	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 66	Ден 66
37	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 67	Ден 67
38	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 68	Ден 69
39	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 70	Ден 73
	Бетонова настилка на път за м. Джуровци, с. Горна Кула									
40	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	3	3	Ден 74	Ден 76
41	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 77	Ден 77
42	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 78	Ден 78
43	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 79	Ден 80
44	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 81	Ден 84
	Бетонова настилка на път за м. Лаличци, с. Горна Кула									
45	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	3	3	Ден 85	Ден 87
46	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 88	Ден 88
47	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 89	Ден 89
48	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 90	Ден 91
49	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 92	Ден 95
	Бетонова настилка на път за м. Релей, с. Златолист									
50	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	3	2	Ден 118	Ден 119
51	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 120	Ден 120
52	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 121	Ден 121
53	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 122	Ден 122
54	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 123	Ден 124
	Бетонова настилка на път за м. Мехи, с. Долна Кула									
55	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	3	3	Ден 96	Ден 98
56	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 99	Ден 99
57	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 100	Ден 100
58	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 101	Ден 102
59	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 103	Ден 106
	Бетонова настилка на път за м. Песчарка, с. Долна Кула									
60	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	0,23	69,00	8,63	3	3	Ден 107	Ден 109
61	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	0,28	8,40	1,05	2	1	Ден 110	Ден 110
62	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	0,70	26,60	3,33	4	1	Ден 111	Ден 111
63	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	2,72	59,91	7,49	4	2	Ден 112	Ден 113
64	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	4,19	125,70	15,71	4	4	Ден 114	Ден 117
	Бетонова настилка на път за м. Рогоз, с. Баракци									
65	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	0,23	34,50	4,31	3	2	Ден 42	Ден 43
66	Доставка и полагане на баластра за основа дебл. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	0,28	4,20	0,53	1	1	Ден 44	Ден 44
67	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	0,70	13,30	1,66	2	1	Ден 45	Ден 45
68	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	2,72	29,95	3,74	4	1	Ден 46	Ден 46
69	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	4,19	62,85	7,86	4	2	Ден 47	Ден 48

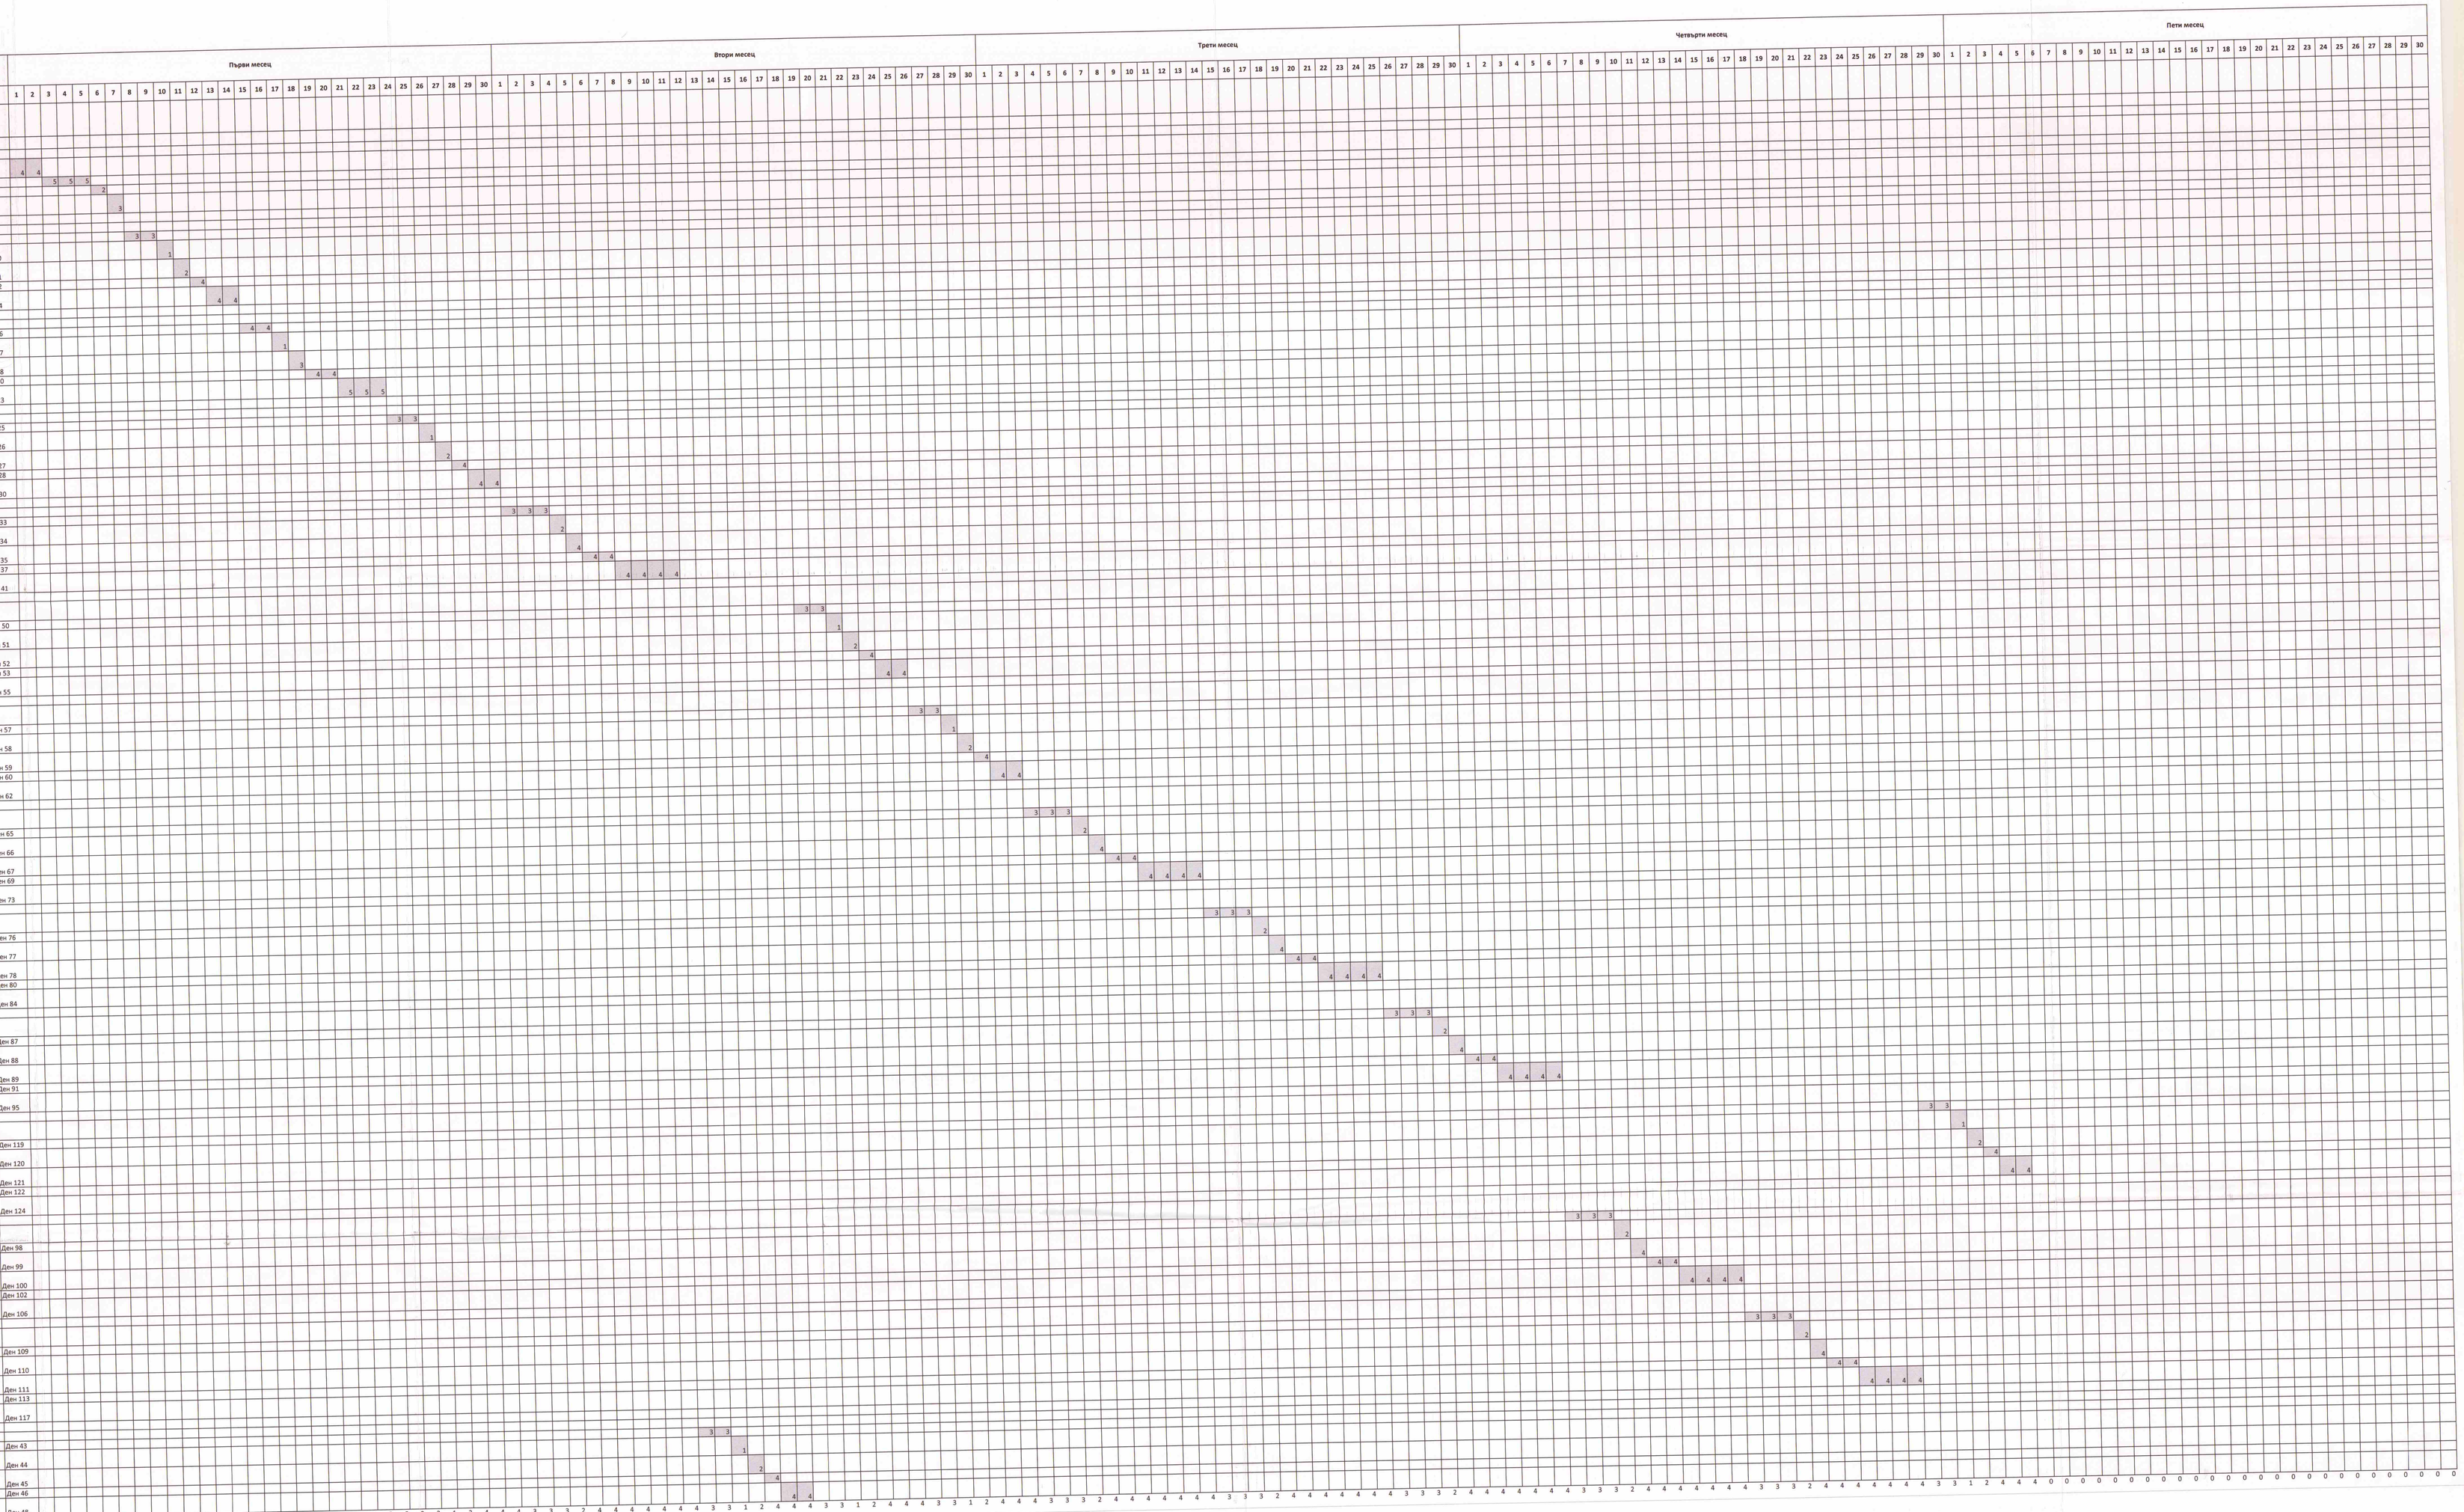

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

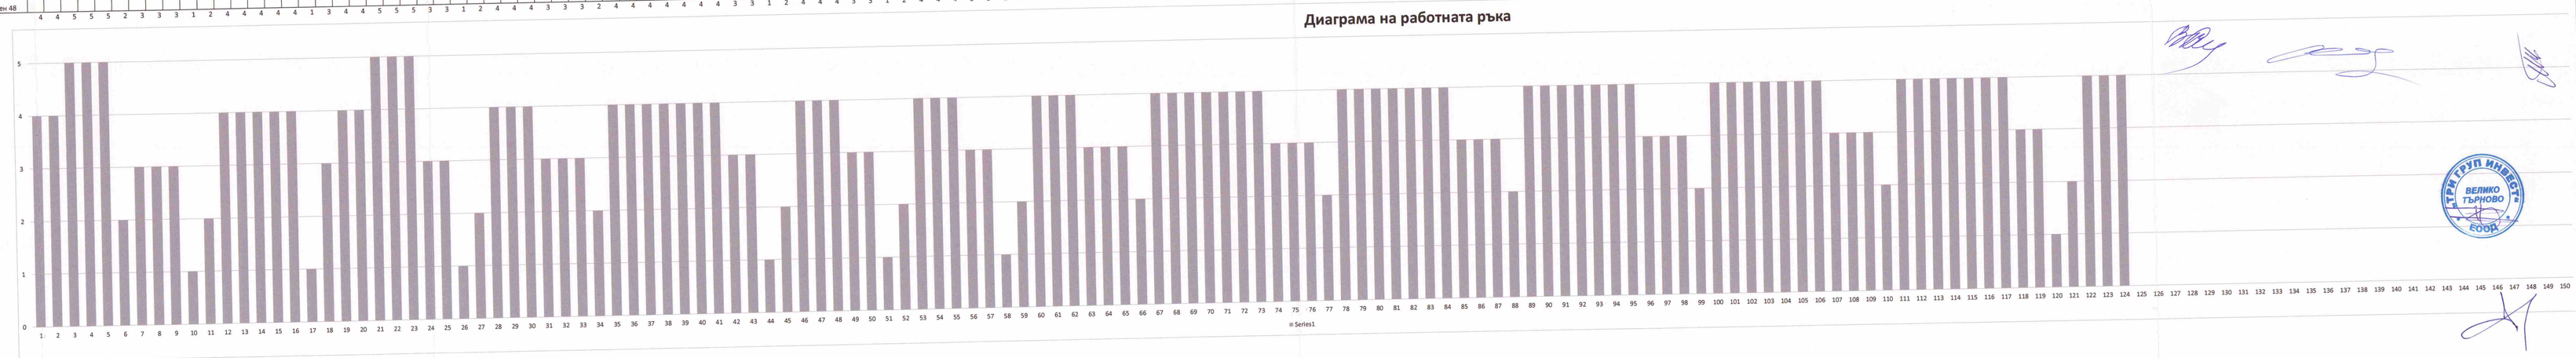

ГРАФИК НА ИЗПОЛЗВАНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ
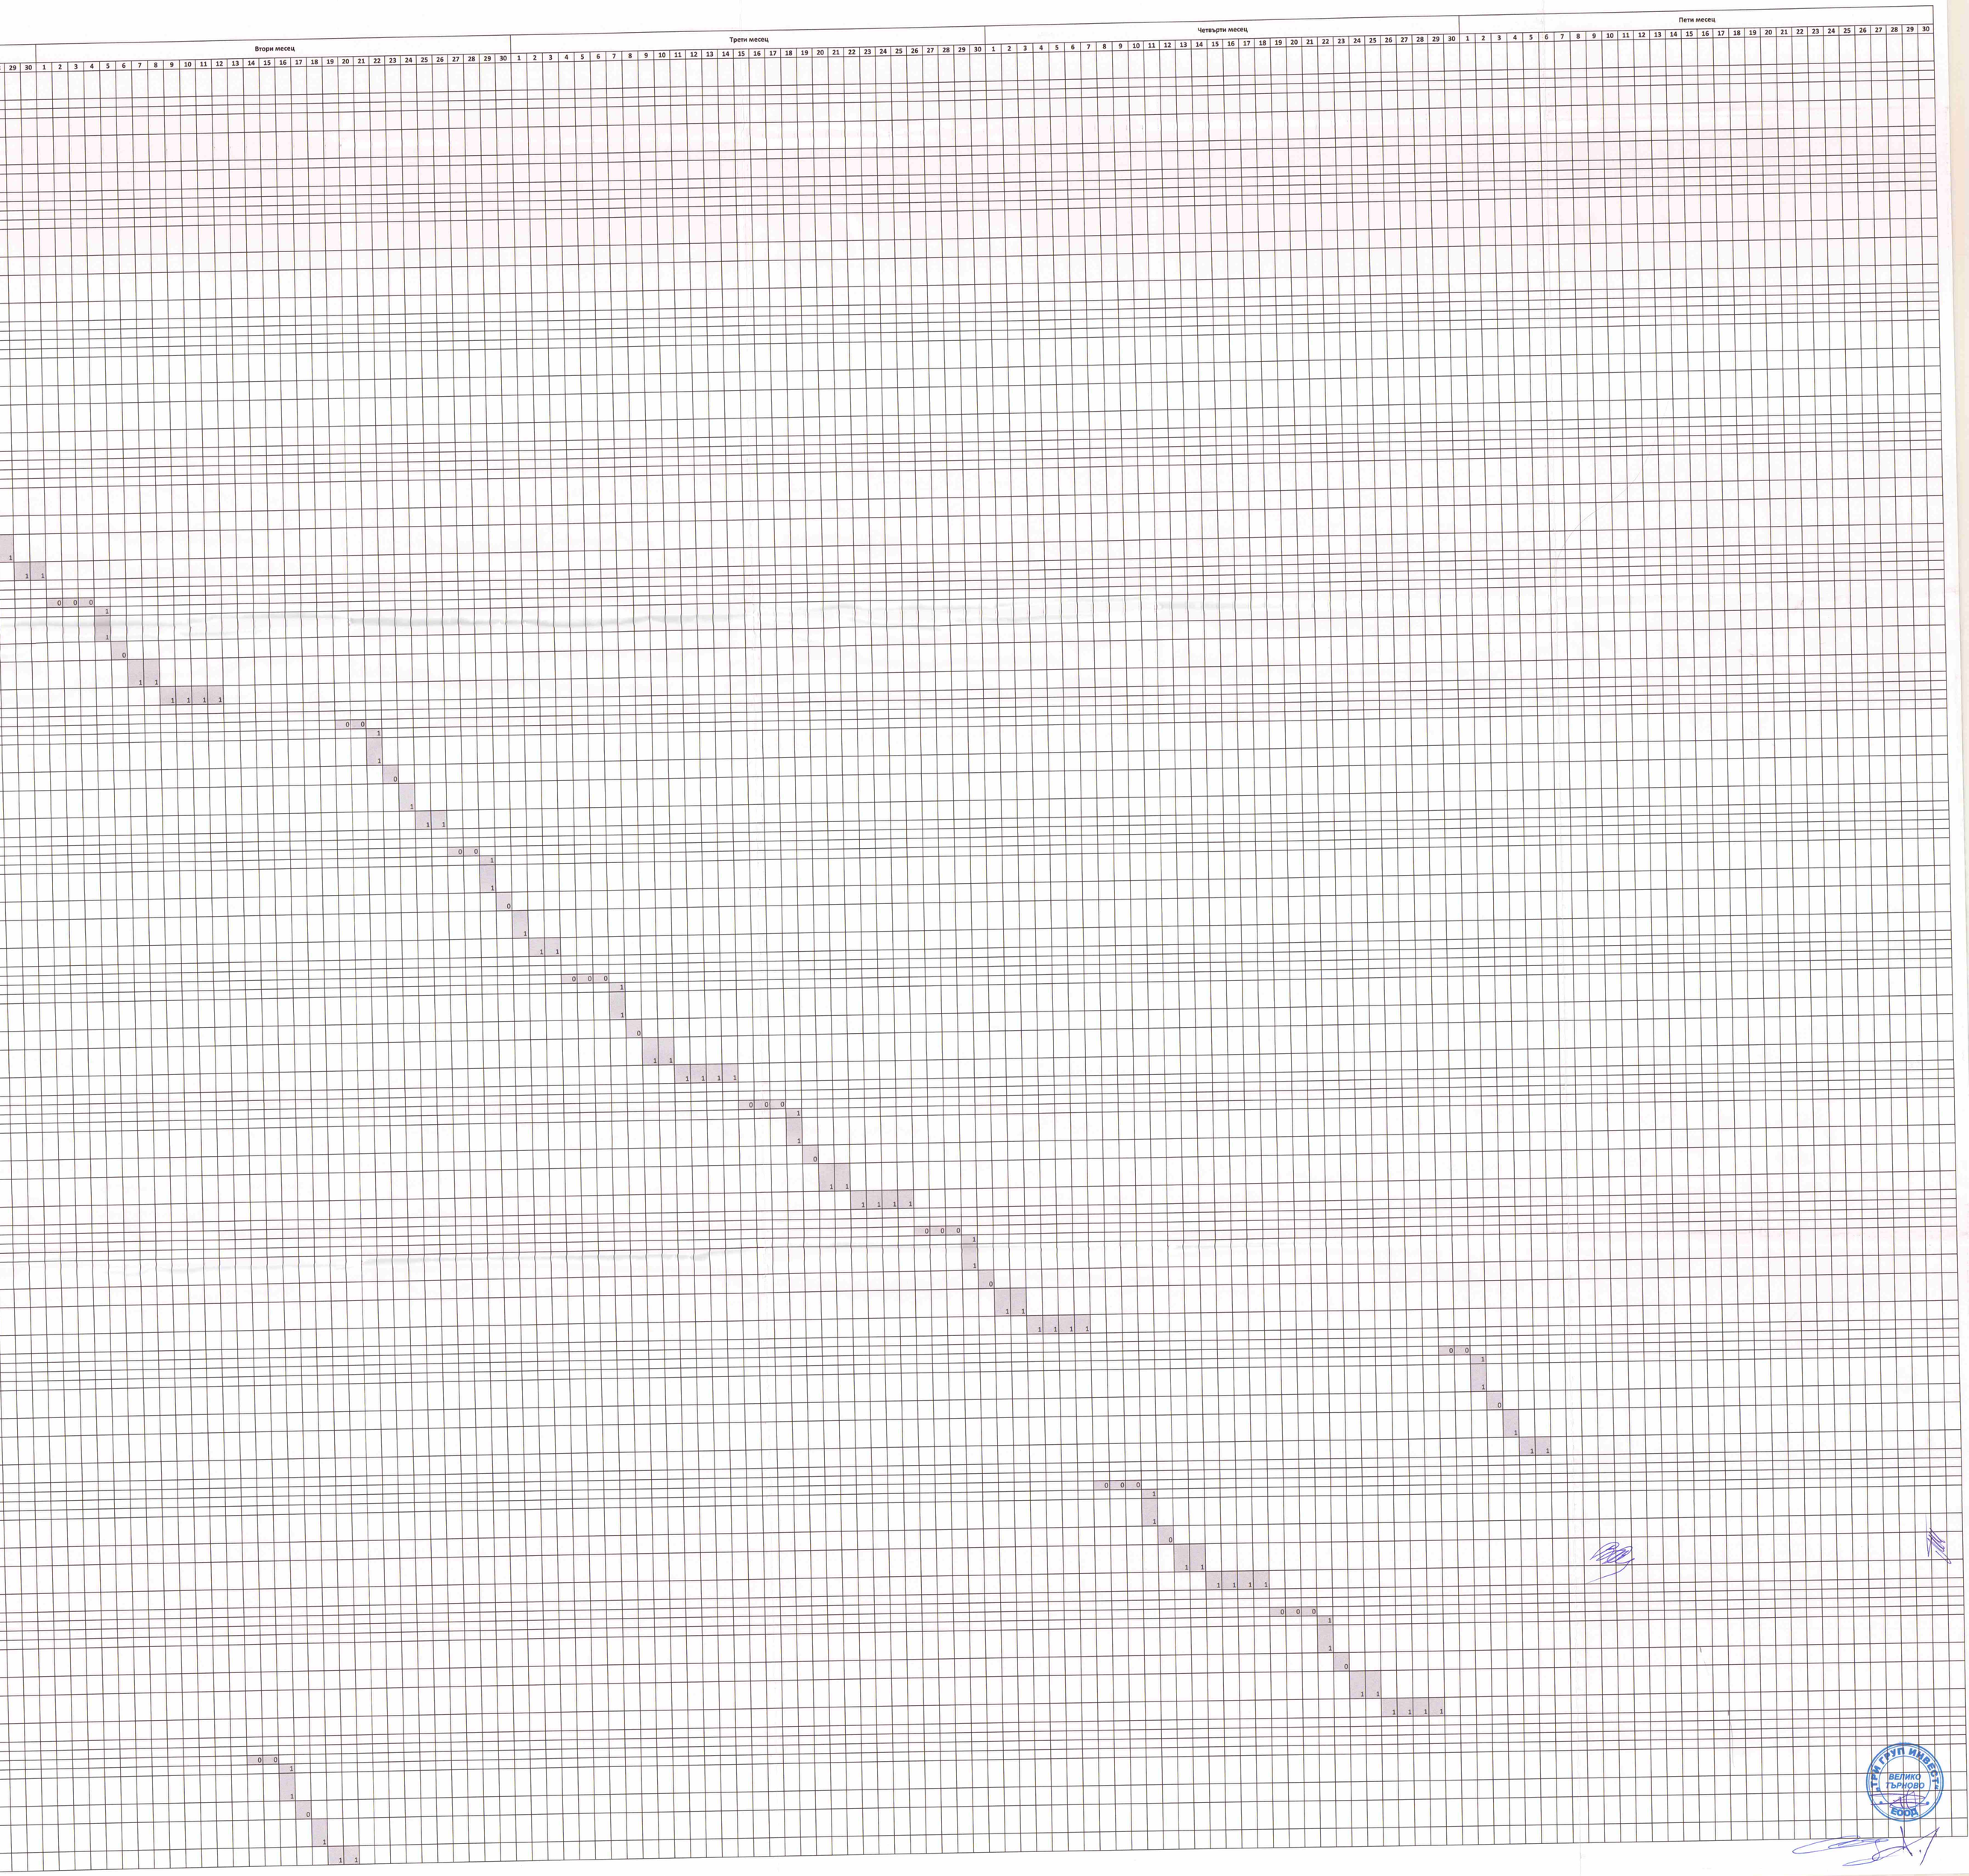
Номер	Наименование	марка	К-во	начало	край	механизация	р.ч.	МОМ	дни	машини
	Обособена позиция №2 "Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Приградски", община Кърджали									
	Подпорна стена на улица в с. Орех									
1	Изкоп с шир. до 0.60м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви <<01-01-029>>	м3	12,00	Ден 1	Ден 2	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
2	Кофраж за подпорни стени <<02-05-028>>	м2	24,00	Ден 3	Ден 5	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,096	3	1
3	Изработка и монтаж на армировка <<02-06-003>>	кг	96,00	Ден 6	Ден 6	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
4	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за основи и стени <<02-07-020>>	м3	4,00	Ден 7	Ден 7	Бетоновоз	0,030	0,120	1	1
	Бетонова настилка на път за м. Зейка, с. Орех									
5	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 8	Ден 9	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
6	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 10	Ден 10	багер	0,010	0,150	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
7	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 11	Ден 11	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
8	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 12	Ден 12	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
9	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 13	Ден 14	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за м. Бодрово, с. Орех									
10	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	240,00	Ден 15	Ден 16	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
11	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	24,00	Ден 17	Ден 17	багер	0,010	0,240	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,120	1	1
12	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	30,00	Ден 18	Ден 18	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
13	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	18,00	Ден 19	Ден 20	товарен автомобил самосвал	0,004	0,072	2	1
14	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	24,00	Ден 21	Ден 23	Бетоновоз	0,030	0,720	3	1
	Бетонова настилка на път за м. Врана, с. Лулечка									
15	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 24	Ден 25	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
16	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 26	Ден 26	багер	0,010	0,150	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
17	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 27	Ден 27	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
18	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 28	Ден 28	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
19	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 29	Ден 30	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за м. Тайник, с. Овчари									
20	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 31	Ден 33	Няма механизация	0,000	0,000	3	0
21	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 34	Ден 34	багер	0,010	0,300	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
22	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 35	Ден 35	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
23	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 36	Ден 37	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
24	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 38	Ден 41	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Косойци, с. Джанка									
25	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 49	Ден 50	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
26	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 51	Ден 51	багер	0,010	0,150	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
27	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 52	Ден 52	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
28	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 53	Ден 53	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
29	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 54	Ден 55	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за м. Байково, с. Джанка									
30	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 56	Ден 57	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
31	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 58	Ден 58	багер	0,010	0,150	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
32	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 59	Ден 59	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
33	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 60	Ден 60	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
34	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 61	Ден 62	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за м. Младост, с. Горна Кула									
35	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 63	Ден 65	Няма механизация	0,000	0,000	3	0
36	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 66	Ден 66	багер	0,010	0,300	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
37	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 67	Ден 67	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
38	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 68	Ден 69	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
39	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 70	Ден 73	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Джуровци, с. Горна Кула									
40	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 74	Ден 76	Няма механизация	0,000	0,000	3	0
41	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 77	Ден 77	багер	0,010	0,300	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
42	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 78	Ден 78	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
43	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 79	Ден 80	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
44	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 81	Ден 84	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Лалинци, с. Горна Кула									
45	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 85	Ден 87	Няма механизация	0,000	0,000	3	0
46	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 88	Ден 88	багер	0,010	0,300	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
47	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 89	Ден 89	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
48	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 90	Ден 91	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
49	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 92	Ден 95	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Репей, с. Зарпозлист									
50	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 118	Ден 119	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
51	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 120	Ден 120	багер	0,010	0,150	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
52	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 121	Ден 121	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
53	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 122	Ден 123	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
54	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 123	Ден 124	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
	Бетонова настилка на път за м. Метла, с. Долна Кула									
55	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 96	Ден 98	Няма механизация	0,000	0,000	3	0
56	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 99	Ден 99	багер	0,010	0,300	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
57	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 100	Ден 100	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
58	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 101	Ден 102	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
59	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 103	Ден 106	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Пясъчник, с. Долна Кула									
60	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 107	Ден 109	Няма механизация	0,000	0,000	3	0
61	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 110	Ден 110	багер	0,010	0,300	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1
62	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 111	Ден 111	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
63	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 112	Ден 113	товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
64	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 114	Ден 117	Бетоновоз	0,030	0,900	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Рогоз, с. Бярцци									
65	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	150,00	Ден 42	Ден 43	Няма механизация	0,000	0,000	2	0
66	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	15,00	Ден 44	Ден 44	багер	0,010	0,150	1	1
						товарен автомобил самосвал	0,005	0,075	1	1
67	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	19,00	Ден 45	Ден 45	Няма механизация	0,000	0,000	1	0
68	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	11,00	Ден 46	Ден 46	товарен автомобил самосвал	0,004	0,044	1	1
69	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	15,00	Ден 47	Ден 48	Бетоновоз	0,030	0,450	2	1
