ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Номер	Наименование	мярка	К-во	Норма време ч.ч.	Времетра ене ч.ч.	Времетра ене	Брой работници	Дни	Начало	Край
	Обособена позиция №6 "Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямва Чинка и Токачка",община Крумовград									
	Бетонова настилка на път за м. Черешарка, с. Лещарка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300	0,264	79,2	9,9	5	2	Ден 21	Ден 22
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30	0,28	8,4	1,05	2	1	Ден 23	Ден 23
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38	0,7	26,6	3,325	4	1	Ден 24	Ден 24
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22	3,458	76,076	9,5095	5	2	Ден 25	Ден 26
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30	4,19	125,7	15,7125	4	4	Ден 27	Ден 30
	Бетонова настилка на път за м. Дъбравец, с. Тополка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300	0,264	79,2	9,9	5	2	Ден 11	Ден 12
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30	0,28	8,4	1,05	2	1	Ден 13	Ден 13
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38	0,7	26,6	3,325	4	1	Ден 14	Ден 14
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22	3,458	76,076	9,5095	5	2	Ден 15	Ден 16
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30	4,19	125,7	15,7125	4	4	Ден 17	Ден 20
	Бетонова настилка на път за м. Житница, с. Голяма Чинка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300	0,264	79,2	9,9	5	2	Ден 31	Ден 32
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30	0,28	8,4	1,05	2	1	Ден 33	Ден 33
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38	0,7	26,6	3,325	4	1	Ден 34	Ден 34
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22	3,458	76,076	9,5095	5	2	Ден 35	Ден 36
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30	4,19	125,7	15,7125	4	4	Ден 37	Ден 40
	Бетонова настилка на път за с. Малка Чинка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	180	0,264	47,52	5,94	3	2	Ден 41	Ден 42
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	18	0,28	5,04	0,63	1	1	Ден 43	Ден 43
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	23	0,7	16,1	2,0125	3	1	Ден 44	Ден 44
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	13	3,458	44,954	5,61925	3	2	Ден 45	Ден 46
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	18	4,19	75,42	9,4275	4	3	Ден 47	Ден 49
	Бетонова настилка на път за м. Извън регулация, с. Кандилка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300	0,264	79,2	9,9	5	2	Ден 1	Ден 2
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30	0,28	8,4	1,05	2	1	Ден 3	Ден 3
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38	0,7	26,6	3,325	4	1	Ден 4	Ден 4
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22	3,458	76,076	9,5095	5	2	Ден 5	Ден 6
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30	4,19	125,7	15,7125	4	4	Ден 7	Ден 10
	Бетонова настилка на път за м. Тополица, с. Метлика									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300	0,264	79,2	9,9	5	2	Ден 60	Ден 61
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30	0,28	8,4	1,05	2	1	Ден 62	Ден 62
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38	0,7	26,6	3,325	4	1	Ден 63	Ден 63
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22	3,458	76,076	9,5095	5	2	Ден 64	Ден 65
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30	4,19	125,7	15,7125	4	4	Ден 66	Ден 69
	Бетонова настилка на път за с. Рибино									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300	0,264	79,2	9,9	5	2	Ден 50	Ден 51
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30	0,28	8,4	1,05	2	1	Ден 52	Ден 52
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38	0,7	26,6	3,325	4	1	Ден 53	Ден 53
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22	3,458	76,076	9,5095	5	2	Ден 54	Ден 55
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30	4,19	125,7	15,7125	4	4	Ден 56	Ден 59

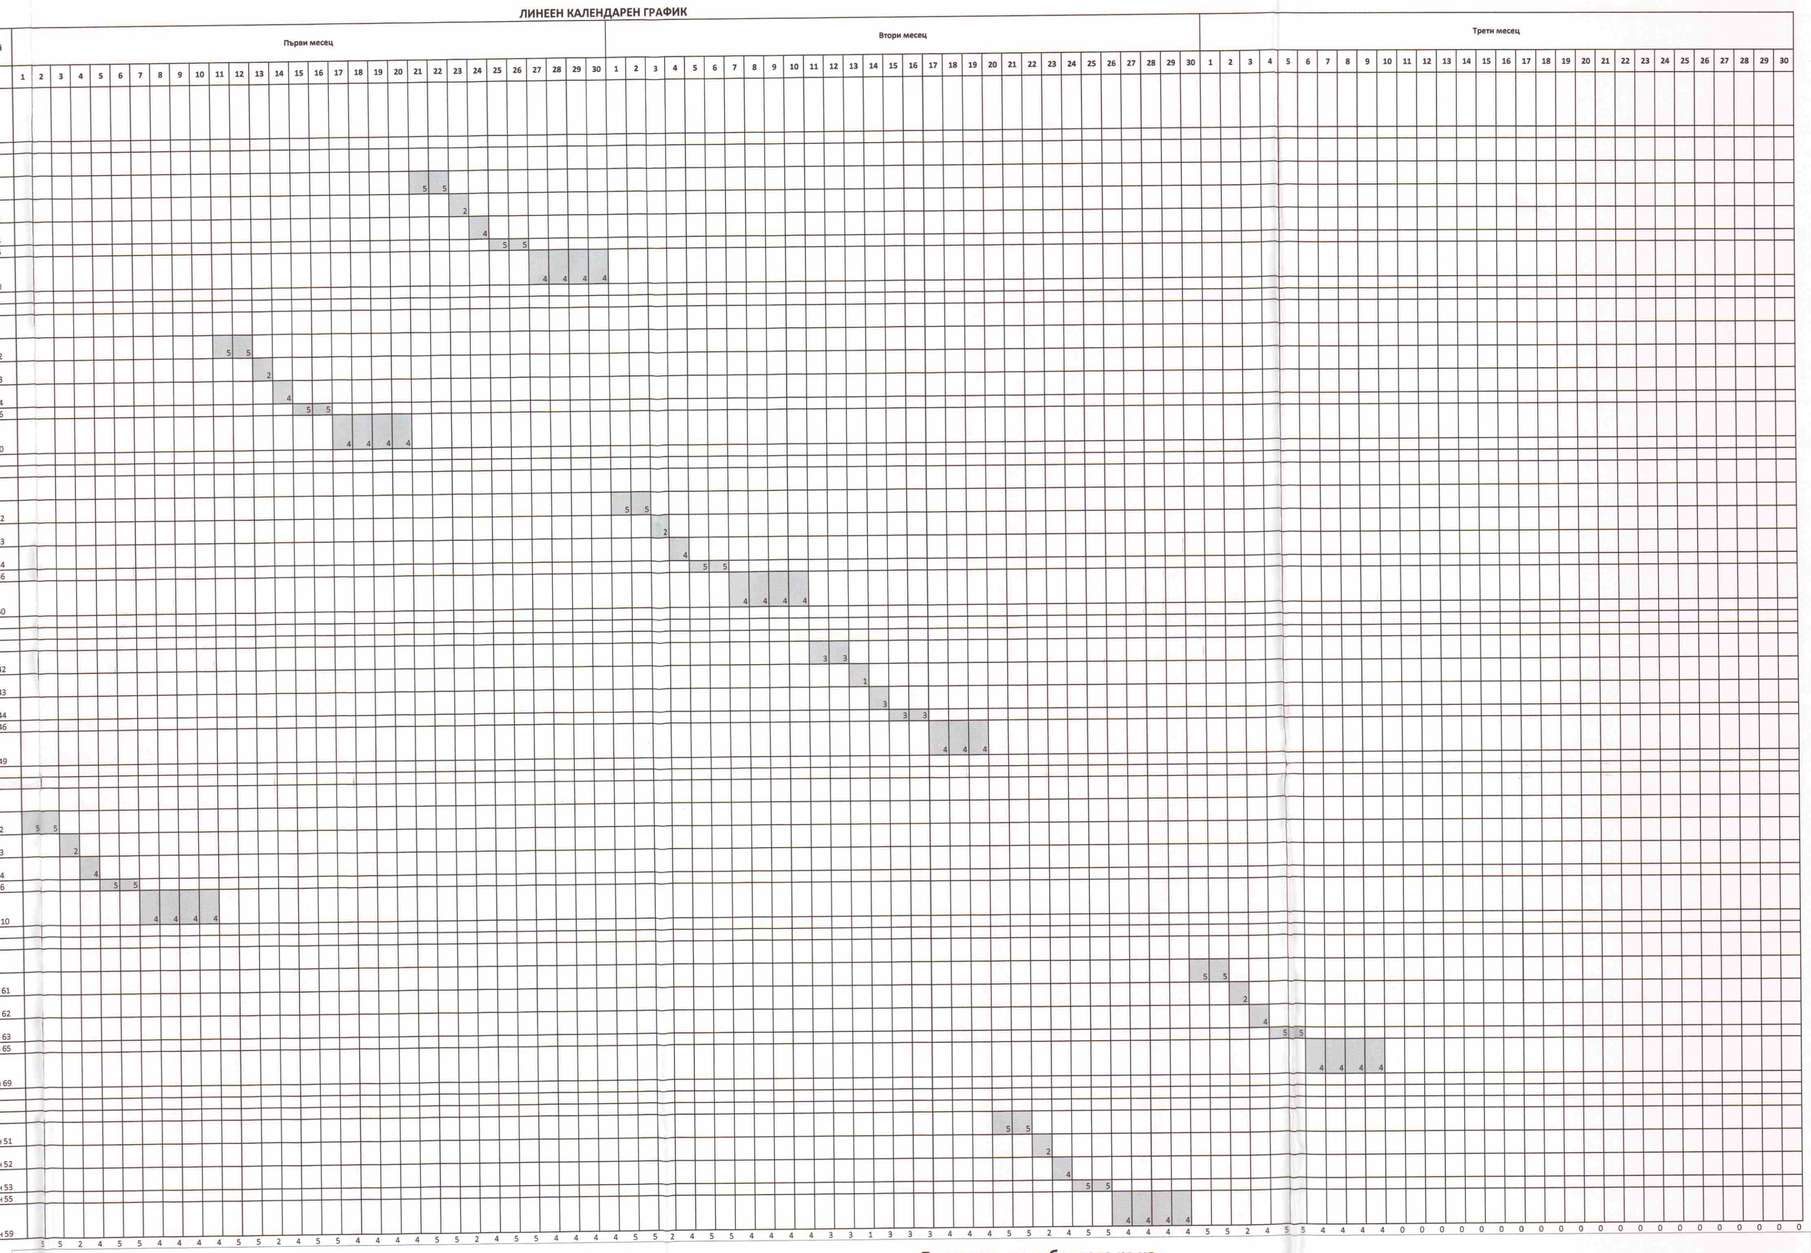

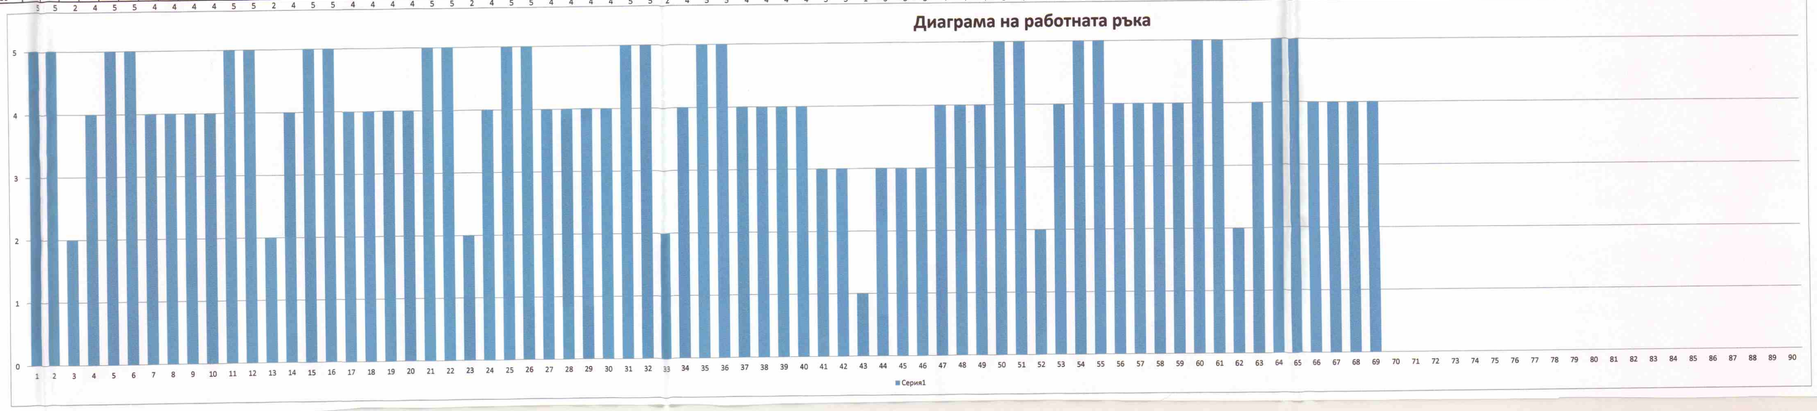

ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГРАФИК НА ИЗПОЛЗВАНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ

Номер	Наименование	мярка	К-во	Начало	Край	Механиция	Р.Н.	мсм	дни	машини
	Обособена позиция №6 "Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямва Чинка и Токачка",община Крумовград									
	Бетонова настилка на път за м. Черешарка, с. Лещарка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 21	Ден 22	Няма механизация	0,000	0	2	0
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 23 Ден 23	Ден 23 Ден 23	Багер Товарен автомобил самосвал	0,010 0,005	0,3 0,15	1 1	1 1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 24	Ден 24	Няма механизация	0,000	0	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 25	Ден 26	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 27	Ден 30	Бетоновоз	0,030	0,9	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Дъбравец, с. Тополка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 11	Ден 12	Няма механизация	0,000	0	2	0
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 13 Ден 13	Ден 13 Ден 13	Багер Товарен автомобил самосвал	0,010 0,005	0,3 0,15	1 1	1 1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 14	Ден 14	Няма механизация	0,000	0	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 15	Ден 16	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 17	Ден 20	Бетоновоз	0,030	0,9	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Житница, с. Голяма Чинка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 31	Ден 32	Няма механизация	0,000	0	2	0
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 33 Ден 33	Ден 33 Ден 33	Багер Товарен автомобил самосвал	0,010 0,005	0,3 0,15	1 1	1 1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 34	Ден 34	Няма механизация	0,000	0	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 35	Ден 36	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 37	Ден 40	Бетоновоз	0,030	0,9	4	1
	Бетонова настилка на път за с. Малка Чинка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	180,00	Ден 41	Ден 42	Няма механизация	0,000	0	2	0
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	18,00	Ден 43 Ден 43	Ден 43 Ден 43	Багер Товарен автомобил самосвал	0,010 0,005	0,18 0,09	1 1	1 1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	23,00	Ден 44	Ден 44	Няма механизация	0,000	0	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	13,00	Ден 45	Ден 46	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,052	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	18,00	Ден 47	Ден 49	Бетоновоз	0,030	0,54	3	1
	Бетонова настилка на път за м. Извън регулация, с. Кандилка									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 1	Ден 2	Няма механизация	0,000	0	2	0
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 3 Ден 3	Ден 3 Ден 3	Багер Товарен автомобил самосвал	0,010 0,005	0,3 0,15	1 1	1 1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 4	Ден 4	Няма механизация	0,000	0	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 5	Ден 6	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 7	Ден 10	Бетоновоз	0,030	0,9	4	1
	Бетонова настилка на път за м. Тополица, с. Метлика									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 60	Ден 61	Няма механизация	0,000	0	2	0
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 62 Ден 62	Ден 62 Ден 62	Багер Товарен автомобил самосвал	0,010 0,005	0,3 0,15	1 1	1 1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 63	Ден 63	Няма механизация	0,000	0	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 64	Ден 65	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 66	Ден 69	Бетоновоз	0,030	0,9	4	1
	Бетонова настилка на път за с. Рибино									
1	Ръчно подравняване в земни почви <<01-01-056>>	м2	300,00	Ден 50	Ден 51	Няма механизация	0,000	0	2	0
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб. 10 см <<03-01-009>>	м3	30,00	Ден 52 Ден 52	Ден 52 Ден 52	Багер Товарен автомобил самосвал	0,010 0,005	0,3 0,15	1 1	1 1
3	Желязна скара под бет. настилка с размери 4/2 <<02-06-003>>	бр.	38,00	Ден 53	Ден 53	Няма механизация	0,000	0	1	0
4	Направа и разваляне на кофраж <<02-05-013>>	м2	22,00	Ден 54	Ден 55	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	2	1
5	Доставка и полагане на бетон за основи, настилки, подложки и др. на място <<02-07-020>>	м3	30,00	Ден 56	Ден 59	Бетоновоз	0,030	0,9	4	1

Първи месец

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																					0	0								
2																							1							
3																								0						
4													1	1																
5																												1	1	1
1											0	0																		
2													1																	
3													1																	
4														0																
5															1	1														
1																	0	0												
2																	1													
3																	1													
4																		0												
5																			1	1										
1																									0	0				
2																											1			
3																											1			
4																												0		
5																													1	1
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														

Втори месец

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0	0																												
2			1																											
3			1																											
4				0																										
5					1	1																								
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														

Трети месец

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
