



**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА КРУМОВГРАД 2021-2027 Г.
ЗА 2024 ГОДИНА**

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на фигурите	3
Списък на таблиците	3
Списък на използваните съкращения.....	4
1. Въведение	6
2. Общи условия за изпълнение на ПИРО 2021-2027 и в частност промените в социално-икономическите условия на общината	8
2.1. Демографско развитие на общината	8
2.2. Икономическо развитие на общината.....	10
2.3. Пазар на труда в общината.....	11
2.4. Социално развитие.....	12
3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение	14
4. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО	18
5. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране.....	20
6. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО	30
7. Приложения.....	32

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО	7
Фигура 2. Индикативна стойност и реално изплатени средства по проекти в община Крумовград, по приоритети за 2024 г.	21
Фигура 3. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2024 година проекти (по индикативни стойности) по приоритетни области	22
Фигура 4. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за 2024.....	23
Фигура 5. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за 2024 г.....	24

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Основни демографски показатели за община Крумовград и област Кърджали за 2022 и 2023 г.	9
Таблица 2. Ключови икономически показатели на община Крумовград.....	10
Таблица 3. Дейност на местата за настаняване в община Крумовград	10
Таблица 4. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта	11
Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието	12
Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването	13
Таблица 7. Социални услуги в община Крумовград и техният капацитет към 2024 година	13
Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО към 2024 година.....	15
Таблица 9. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО към 2024 година.....	16
Таблица 10. Реално финансово изпълнение по приоритети за 2024 г. спрямо заложеното в ПИРО	23
Таблица 11. Сравнение между заложените в ПИРО проектни идеи и конкретните резултати през 2024 година.....	25

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АН	Авторски надзор
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ВОКС	Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи
ГД	Годишен доклад
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДСП	Домашен социален патронаж
ЕЕ	Енергийна ефективност
ЕС	Европейски съюз
ЕСТИ	Единна система за туристическа информация
ЕТ	Едноличен търговец
ЕФСУ	Европейски фондове за споделено управление
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИДН	Идентификационен номер
ИП	Инвестиционен проект
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
КК	Кадастрална карта
КККР	Кадастрална карта и кадастрален регистър
КР	Кадастрален регистър
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ	Местна инициативна група
МО	Междинна оценка
МСП	Малки и средни предприятия
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НСИ	Национален статистически институт
НУ	Начално училище
ОБУ	Обединено училище
ОДК	Общински детски комплекс
ОУ	Основно училище
ОУПО	Общ устройствен план на община
ПГТ	Професионална гимназия по транспорт
ПЗ	План за застрояване
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПО	Последваща оценка
ПП	Парцеларен план
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ППР	Проучвателни и проектни работи
ПРЗ	План за регулация и застрояване
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2014-2020
ПРЧР	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ПУП	Подробен устройствен план
ПХОМП	Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027
РУО	Регионално управление на образованието
СМР	Строително-монтажни работи
СН	Строителен надзор

СУ	Средно училище
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип
ЦПЛР	Център за подкрепа за личностно развитие
о.т.	Осева точка
STEM/СТЕМ	Science, Technology, Engineering, Math Наука, Технология, Инженерство, Математика

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за интегрирано развитие на община Крумовград за периода 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските планове за развитие да определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

Изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Основа за изготвянето на докладите е информацията, която се събира чрез действащата в Общината система за наблюдение и оценка на плана.

Целта на годишния доклад е да обобщи постигнатото през календарната година и да оцени доколкото ефективно и ефикасно е изразходван публичният ресурс, отчитайки социално-икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно осигуряване за развитието на общината.

Изготвените годишни доклади от своя страна са основа за разработването на междинната и последващата оценки на ПИРО, поради което те самостоятелно се явяват важен елемент от системата за наблюдение и оценка на плана.

Предмет на наблюдение и оценка в годишния доклад е постигането на заложените в ПИРО цели и приоритети както по отношение на финансирането, така и по отношение на постигнатия напредък по определените индикатори за наблюдение. В доклада още се прави преглед и оценка на извършените дейности, свързани с информирането и запознаването на широк кръг от заинтересовани страни относно изпълнението на ПИРО, вкл. конкретните проекти към него.

Съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие кметът на общината *„ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“* в т.ч. *„представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет“*. Кметът е натоварен и с функцията да *„осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му“*.

Съгласно ППЗРР в цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданските общности в общината.

Годишният доклад се одобрява от общински съвет по предложение на кмета на общината.

След одобряването на доклада той се публикува на сайта на Общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.

Настоящият доклад в хронологичен ред е **петият документ**, който следва да бъде изготвен за периода от 2021 г. (когато е приет настоящият ПИРО) до 2028 г. (когато следва да се изготви последният годишен доклад и да се направи обобщена последваща оценка на постигнатото от ПИРО). Докладът представя резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на община Крумовград за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г. Документът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане и следва да послужи за основа при изготвянето на предстоящата последваща оценка на ПИРО, която се очаква да бъде направена през 2028 година.


В процеса на разработване на доклада са използвани следните **информационни източници**:

- План за интегрирано развитие на община Крумовград за периода 2021 – 2027 година;
- Отчет за капиталовите разходи на Община Крумовград за 2024 г.;
- Други справки и отчети на Община Крумовград;
- Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
- Текуща статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);
- Официалната интернет страница на Община Крумовград;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Крумовград, Областна дирекция „Земеделие“, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Дирекция „Бюро по труда“ и експлоатационните дружества.

При изготвянето на настоящия доклад следва да се поясни, че **съществуват обективни ограничения** по отношение на част от данните, използвани в него. Причина за това е, че националната статистика не разполага с по-актуални обработени данни към момента на изготвянето му.

Навсякъде в доклада са използвани последните налични данни от различните институции като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО

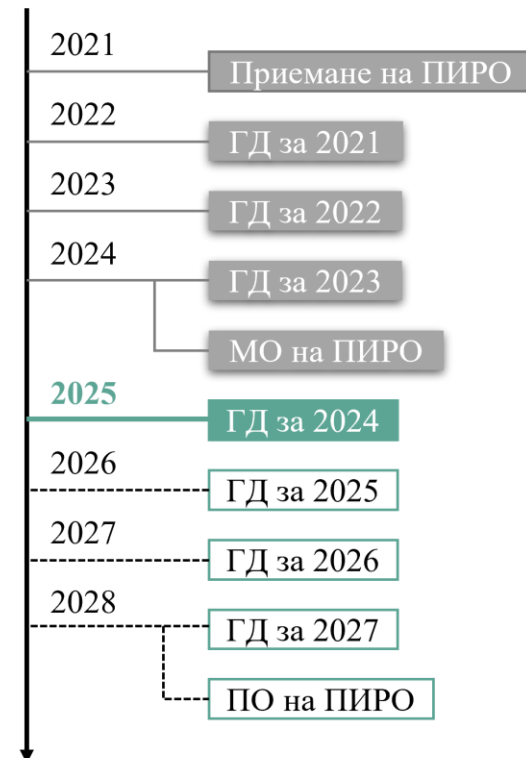

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

Общите условия за изпълнението на ПИРО, съгласно ЗРР, могат да бъдат класифицирани по отношение на факторите, които влияят върху актуализацията на плана. Според чл. 22 от ППЗРР, приет с ПМС 183 от 04.08.2020, факторите са:

- съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
- промени в свързаното национално законодателство или в правото на ЕС;
- съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на плана;
- приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от Европейския съюз (в този случай се актуализира и програмата за реализиране на плана).

По отношение на **икономическите и социалните условия**, 2024 година се характеризира с годишна инфлация от 2,2%¹ по данни на НСИ, продължаваща политическа нестабилност на национално ниво (седми поредни парламентарни избори), както и избори за европейски парламент. Динамичните политически процеси, включително смяната на правителства, преговорите и новите политически коалиции през 2024 г. неминуемо оказаха влияние и нарушиха ритъма на работа на местната администрация, включително и по изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския съюз. Войната в Украйна е водещо събитие и през 2024 г., което продължи да оставя своя сериозен отпечатък – липсата на суровини и затруднен износ на компаниите в страната.

Положително е, че след решение на Народното събрание, общините получиха възможността да получават държавни средства за реализацията на местни инфраструктурни проекти. Също така, постепенно започнаха да се отварят и различни покани за кандидатстване с проекти в новия програмен период, което бе възможност общинските администрации да подадат важни за социално-икономическото развитие на общината проектни предложения.

По отношение на **свързаното национално законодателство или правото на ЕС** през 2024 година не са настъпили промени. В този смисъл ПИРО Крумовград 2021-2027 е изготвен и към момента отговаря на условията по ЗРР и другите актуални, действащи нормативни актове.

Няма **съществени промени в действащите секторни стратегии и програми**, които да оказват влияние върху изпълнението на ПИРО.

В следващите подточки са представени основни изводи и данни за социално-икономическото състояние на общината, за да се разкрият настъпилите промени. Направени са сравнения между стойностите, използвани в Годишния доклад за 2023 г. и актуалните данни. Където е уместно са посочени и референтни стойности за област Кърджали.

2.1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Поради липса на данни за 2024 година е направено сравнение между последните налични данни от НСИ – за 2022 и 2023 година. В известна степен те са достатъчни, за да покажат настъпилите промени в общината за разглеждания период.

¹ Измерена според индекса на потребителските цени (ИПЦ) декември 2024 г. спрямо декември 2023 г.

През 2023 година продължава да се наблюдава положителна тенденция за увеличаване на населението в общината. Спрямо 2022 година ръстът е с 482 човека (2,8%), като тази картина е сходна с данните за цялата област Кърджали (2,8%). Продължава и ръстът на населението по групи (в трудоспособна, над трудоспособна и под трудоспособна възраст). За периода 2022-2023 година най-голямо е увеличението в групата на над трудоспособното население (3,6%), следвано от населението в под трудоспособна възраст (3,5%). На областно ниво данните за увеличението на населението по възрастови групи са сходни, с изключение на населението в под трудоспособна възраст, което се увеличава само с 1,7%.

Сравнявайки коефициента на механичен прираст между 2022 (22,9‰) и 2023 (34,4‰) година се вижда продължаваща тенденция за силна миграция на население към община Крумовград. Причините за това са комплексни – търсене на по-добри икономически условия, търсене на работа, по-добри условия за живот и т.н.

Положително влияние върху демографската ситуация в община Крумовград оказва и естественият прираст. През 2023 г. стойността на коефициента на естествен прираст достига до -6,6‰ (за сравнение през 2022 г. стойността е -8,3‰). Това се дължи основно на по-високото ниво на раждаемост и по-ниското ниво на смъртност в общината. През 2023 г. са родени 149 деца, а са починали 263 души. За сравнение през 2022 г. родените са 142 деца, а починалите – 282.

Процесите, свързани с миграцията към общината, все още не могат да компенсират застаряващото население. За 2023 година коефициентът на възрастова зависимост, измерващ броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и над 65 години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) се увеличава с 1,6%. Стойността на коефициента на демографско заместване, показващ лицата, които влизат в трудоспособна възраст спрямо тези, излизащи от нея, намалява с 0,16%. Тези показатели разкриват, че ситуацията с намирането на кадри за икономиката в общината продължават да бъдат на дневен ред.

От разгледаните показатели може да се направи изводът, че за периода 2022-2023 г. не се отчитат сериозни демографски промени. Основен принос за увеличаването на населението в община Крумовград има механичният прираст. Положителното демографско развитие на общината е от важно значение както за пазара на труда, така и за икономическия растеж.

Таблица 1. Основни демографски показатели за община Крумовград и област Кърджали за 2022 и 2023 г.

Показател	Мярка	Община Крумовград			Област Кърджали		
		2022	2023	Δ изм.	2022	2023	Δ изм.
Население към 31.12. - общо	брой	17 102	17 584	+2,8%	142 508	146 562	+2,8%
<i>в под трудоспособна възраст</i>	брой	2 529	2 618	+3,5%	19 229	19 572	+1,8%
<i>в трудоспособна възраст</i>	брой	9 749	9 967	+2,2%	81 257	83 307	+2,5%
<i>в над трудоспособна възраст</i>	брой	4 824	4 999	+3,6%	42 022	43 683	+4,0%
Коефициент на раждаемост	‰	8,36	8,59	+0,2‰	7,75	8,24	+0,5‰
Коефициент на смъртност	‰	16,61	15,16	-1,5‰	17,20	14,69	-2,5‰
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението)	‰	-8,25	-6,57	+1,67‰	-9,45	-6,45	+3,0‰
Коефициент на механичен прираст (вътрешна миграция, на 1000 души от населението)	‰	22,91	34,37	+11,5‰	21,55	34,50	+12,9‰
Дял на подтрудоспособното население от общото население	%	14,79	14,89	+0,10%	13,49	13,35	-0,14%

Показател	Мярка	Община Крумовград			Област Кърджали		
		2022	2023	Δ изм.	2022	2023	Δ изм.
Коефициент на възрастова зависимост (отношение между лицата в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и над 65 години) и в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) на 100 души	%	63,0	64,55	+1,6%	62,37	63,56	+1,2%
Коефициент на демографско заместване (отношение на населението във възрастовата група 15-19 и възрастовата група 60-64)	%	52,0	51,84	-0,16%	46,63	47,01	+0,38%

Източник: НСИ, собствени изчисления

2.2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Официалните статистически данни на НСИ показват, че през 2023 година броят на предприятията в община Крумовград намалява с 24 спрямо предходната година. С най-голямо намаление в абсолютна стойност при броя на предприятията се открояват секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ (-8) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (-7). Това води до намаляване броя на заетите лица със 17 души. В периода 2022-2023 г. се увеличава броят на предприятията в сектор „Строителство“ (+2). Поради конфиденциалност на значителна част от данните, предоставени от НСИ, е трудно да се очертае пълната картина на развитието на икономиката в общината. Забелязва се ръст с около 34,6% при показателя „Разходи за придобиване на ДМА“ за периода 2022-2023 г.

Таблица 2. Ключови икономически показатели на община Крумовград

Показател	Мярка	2022	2023	Δ изм.
Брой предприятия	брой	895	871	-24
Заети лица	брой	1 925	1 908	-17
Произведена продукция	хил. лв.	..	..	-
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	369 299	..	-
Разходи за придобиване на ДМА	хил. лв.	35 580	47 874	+12 294

Източник: по данни на НСИ

Забележка: .. – данните са конфиденциални, съгласно Закона за статистиката.

По отношение на туризма, от официалните данни на НСИ се забелязва увеличаване на местата за настаняване (+1). Броят на реализираните нощувки намалява за периода 2022-2023 г. Поради конфиденциалност на данните за приходите от нощувки за 2022 г. не може да бъде направено сравнение по този показател.

Таблица 3. Дейност на местата за настаняване в община Крумовград

Година	Места за настаняване (брой)	Легла (брой)	Легла-денонощия (брой)	Реализирани нощувки (брой)	Пренощували лица (брой)	Приходи от нощувки (лева)
2022	6	161	48 213	4 005	2 818	..
2023	7	189	62 515	2 870	1 837	118 860

Източник: по данни на НСИ

Забележка: .. – данните са конфиденциални, съгласно Закона за статистиката.

Съществен принос за устойчивото икономическо развитие на община Крумовград оказва дейността на „Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ с учредители „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград. Фондът разглежда и финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места в сферата на производството, земеделието и животновъдството.

2.3. ПАЗАР НА ТРУДА В ОБЩИНАТА

През 2024 година пазарът на труда в община Крумовград се характеризира с намаляване на регистрираната безработица (-0,75%). Новоразкритите работни места в общината по данни на дирекция „Бюро по труда“ – Крумовград намаляват от 2 до 1 новоразкрито работно място. Работните места на първичния пазар на труда за 2023 г. са 392, докато за 2024 г. намаляват до 260.

Заетостта регистрира спад с около 0,9% спрямо 2022 година, когато заетите в местната икономика са 1 925 души. Към 2023 година техният брой е 1 908 души, което е намаление със 17 човека.

Таблица 4. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта

Показател	Мярка	Община Крумовград		Област Кърджали
		2023	2024	2023
Регистрирани безработни лица - общо	брой	748	708	4 996
Разкрити нови работни места*	брой	392	260	-
Коефициент на безработица	%	14,02	13,27	2,60

* през 2023 г. - 392 на първичен пазар на труда, от които 2 новоразкрити; през 2024 г. - 260, от които 1 новоразкрито, на първичен пазар - 257

Източник: ДБТ – Крумовград

През 2024 година броят на сключените договори с работодатели по програми и мерки за заетост е 27 договора. По ПРЧР 2021-2027 г. броят на сключените договори е 16, а по мярка за заетост е 1 договор.

През 2024 година общият брой на безработните лица, включени в заетост, е 42 лица. Значително по-голям е броят на заетите лица, възползвали се от мерки за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация – 136 лица.

На територията на община Крумовград се изпълняват следните национални програми, със съответния брой сключени договори за 2024 г.:

- НП „Помощ при пенсиониране“ (1 договор);
- Програма „Старт на кариерата“ (1 договор);
- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 1 (1 договор), Компонент 2 (3 договора) и Компонент 3 (4 договора);
- Регионални програми за заетост (2 договора);
- „Родители в заетост“ (ПРЧР 2021-2027 г.) – 1 договор;
- „Младежка заетост“ (15 договора).

Съществен принос за навлизането на младите хора на пазара на труда в община Крумовград оказва „Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“.

2.4. СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

По отношение на образователна ситуация и инфраструктура, през учебната 2022/2023 година не се регистрират съществени изменения. Броят на детските градини остава непроменен, но се закриват 3 групи в тях. Наблюдава се спад при броя на децата в детските градини. Капацитетът в детските заведения е достатъчен, за да обезпечи интереса за записване на децата от общината.

Броят на училищата също остава непроменен. Учащите в тях, обаче, намаляват с около 3% или 38 ученика само за една учебна година. За броя на учителите в системата не са налични по-актуални данни от посочените в следващата таблица.

По данни на РУО – Кърджали през 2024 г. преждевременно напусналите системата на образованието деца и ученици от община Крумовград са 7 на брой. Това е 0,39% от всички деца и ученици в задължителна училищна възраст в община Крумовград.

За учебната 2024/2025 година в списъка със защитените детски градини от община Крумовград са включени две детски градини – ДГ „Слънце“, с. Токачка и ДГ „Искра“, с. Странджено. В списъка със защитените училища от община Крумовград е включено ОУ „Иван Вазов“, с. Поточница.

Основните показатели в сферата на образованието са представени обобщено в следващата таблица, като за референция е поставена и стойността за област Кърджали.

Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието

Показател	Мярка	Крумовград		Област Кърджали
		2022/2023	2023/2024	2023/2024
Детски градини	брой	8	8	59
Педагогически персонал в детските градини	брой	50	52	417
Групи в детски градини	брой	27	24	182
Места на 100 деца в детските градини	брой	149**	191***	136***
Децата в детските градини	брой	478	468	3 800
Места в детските градини	брой	731**	911***	5 408***
Училища на територията на общината	брой	12	12	71
Учители в общообразователните и специални училища	брой	165*	162**	1 296**
Учащи в общообразователните и специалните училища	брой	1 415	1 377	11 420

*данните са за учебната 2020/2021 година; **данните са за учебната 2021/2022 година; ***данните са за учебната 2022/2023 година

Източник: НСИ

По отношение на здравеопазването също не се наблюдават съществени изменения в тази област. Единственото болнично заведение в общината разполага с 54 легла.

На територията на община Крумовград продължава да функционира само една детска ясла. През 2022 г. капацитетът ѝ е достатъчен, за да задоволи потребностите на населението, но през 2023 г. се забелязва, че детската ясла е запълнена със своя максимален капацитет и не достигат 4 места. През 2023 г. се повишава натовареността (теоретично обслуженото население на 1 специалист) на лекарите и лекарите по дентална медицина, основна причина за което е по-големият брой на населението. В сравнение с областта тези показатели са значително по-неблагоприятни.

Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването

Показател	Мярка	Крумовград		Област Кърджали
		2022	2023	2023
Детски ясли	брой	1	1	14
Места в детските ясли	брой	36	36	508
Деца в детските ясли	брой	35	40	425
Население на един лекар	брой	658	676	392
Население на един лекар по дентална медицина	брой	2 138	2 512	1 094
Лечебни заведения - болнична помощ	брой	1	1	6
Легла в лечебните заведения - болнична помощ	брой	54	54	786
Лечебни заведения - извънболнична помощ	брой	1	1	21
Легла в лечебните заведения - извънболнична помощ	брой	-	-	12

Източник: НСИ

През 2024 година в община Крумовград се предлагат осем социални услуги в общността, осигуряващи по-лек живот на различни групи от населението ѝ. Те са представени в следващата таблица, заедно с капацитета и обслужените потребители през 2024 година.

От данните се забелязва, че нараства броят на ползвателите на социални услуги. Това показва важността на предоставяните социални услуги за общността. При повечето от услугите се забелязва недостиг на места и значително превишаване на капацитета на социалните заведения.

За подпомагане на социалните услуги през 2024 година се реализират 3 проекта, финансирани от европейските фондове – „Топъл обяд в община Крумовград“ (ПХОМП 2021-2027), „Грижа в дома в община Крумовград“ и „Бъдеще за децата в община Крумовград“ (ПРЧР 2021-2027).

В края на 2024 г. по проект „Грижа в дома в община Крумовград“ се обслужват 176 потребителя, а по проект „Топъл обяд в община Крумовград“ потребителите, получили топъл обяд, са 980 души.

Таблица 7. Социални услуги в община Крумовград и техният капацитет към 2024 година

Социални услуги в общността	Адрес	Капацитет	Обслужени потребители 2024 г.
Център за обществена подкрепа	гр. Крумовград, ул. „Г. С. Раковски“ № 9	30	88
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания № 1	гр. Крумовград, ул. „Г. С. Раковски“ № 9	8	9
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания № 2	гр. Крумовград, ул. „Г. С. Раковски“ № 9	8	13
Дом за стари хора	гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев“ № 2	50	44
Асистентска подкрепа	-	122	169
Лична помощ по реда на Закона за личната помощ	-	-	194
Център за временно настаняване – гр. Крумовград	-	21	6
Домашен социален патронаж – гр. Крумовград	-	165	165

Източник: Община Крумовград

3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. по изпълнението на ПИРО Крумовград, въз основа на заложените в него **индикатори за резултат и индикатори за продукт**. Първите отразяват постигането на трите стратегически цели, заложените в ПИРО, а вторите – на приоритетите.

Оценката е направена на база на данни, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска администрация.

Определените в ПИРО Крумовград стратегически цели са:

- *Стратегическа цел 1: Промяна на икономическия профил – засилена роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите;*
- *Стратегическа цел 2: Добре уредени и привлекателни населени места;*
- *Стратегическа цел 3: Развити туристически атракции.*

От тях произтичат петте приоритетни направления на плана, както следва:

- *Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури;*
- *Приоритетно направление 2: Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината;*
- *Приоритетно направление 3: Развитие на туристическия потенциал на общината;*
- *Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности;*
- *Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление.*

В следващите таблици е представено развитието на заложените в ПИРО индикатори, посочени са техните базови стойности; стойностите, отчетени в годишния доклад и целевите стойности за 2027 г., като по този начин се проследява постигнатият напредък по тях.

По отношение на **индикаторите за резултат** следва да се подчертае, че за три от тях (в сферата на икономиката) е невъзможно да бъде отчетено развитие, защото данните от НСИ са конфиденциални. В този смисъл 3 от 12-те индикатора за резултат не могат да бъдат отчетени. Поради тази причина за тях е записано „данните са конфиденциални“. Възможно е през следващата година данните да бъдат налични и да позволят отчитането на съответните индикатори.

Наблюдава се увеличение на броя на финансовите предприятия на 1000 души от населението спрямо базовата стойност, което се дължи на увеличението на стопанските субекти в общината. Отчетената стойност за индикатора през 2024 г. е малко по-ниска от тази през 2023 г.

Отчита се намаление при индикатора „Пренощували лица“, като броят на лицата намалява с 574 души спрямо базовата стойност (2019 г.).

През 2024 г. се отчита увеличаване на загубите на вода при пренос по водопроводната мрежа, като стойността на индикатора достига до 35,54%.

По два от индикаторите не се отчита напредък и това са „Общо образувани битови отпадъци“ и „Брой реализирани маркетингови проекти, с цел популяризиране на местния туристически потенциал“. За индикаторът „Общо образувани битови отпадъци“ липсва актуална информация, с която да бъде отчетен напредъкът.

В следващата таблица е представен напредъкът по всички индикатори за резултат, като годината в скоби показва към кой момент са налични последните актуални данни.

Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО към 2024 година

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Стойност ГД (2024)	Целева стойност (2027 г.)
Стратегическа цел 1: Промяна на икономическия профил – засилена роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите						
1.	Произведена продукция в индустриалния сектор	Хил. лв.	НСИ	22 724 (2018 г.)	Данните са конфиденциални	33 000
2.	Дял на произведената продукция в индустриалния сектор	Процент	НСИ	57,35 (2018 г.)	Данните са конфиденциални	63
3.	Брой нефинансови предприятия на 1000 души от населението	Брой	НСИ	24,24 (2018 г.)	49,53 (2023 г.)	29
4.	Произведена продукция от нефинансовите предприятия на 1000 души от населението	Хил. лв.	НСИ	2 320 (2018 г.)	Данните са конфиденциални	3 500
Стратегическа цел 2: Добре уредени и привлекателни населени места						
1.	Коефициент на механичен прираст на населението	Промил	НСИ	42,75 (2019 г.)	34,37 (2023 г.)	25
2.	Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа	Процент	ВиК оператор	31,33 (2019 г.)	35,54 (2024 г.)	26
3.	Общо образувани битови отпадъци	Хил. тона	НСИ	2 860 (2018 г.)	Липсва актуална информация	2 250
4.	Ниво на безработица	Процент	ДБТ	10,5 (2019 г.)	13,27 (2024 г.)	8,7
Стратегическа цел 3: Развити туристически атракции						
1.	Туристически атракции, включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)	Брой	Община Крумовград, ЕСТИ „Регистър на туристическите атракции“ - http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx	52 (2020 г.)	52	70

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Стойност ГД (2024)	Целева стойност (2027 г.)
2.	Брой реализирани маркетингови проекти, с цел популяризиране на местния туристически потенциал	Брой	Община Крумовград	Неприложимо	0 (2024 г.)	5
3.	Пренощували лица	Брой	НСИ	2 411 (2019 г.)	1 837 (2023 г.)	3 000
4	Приходи от нощувки	Лв.	НСИ	90 184 (2019 г.)	118 860 (2023 г.)	120 000

Източник: по данни на НСИ, Община Крумовград, ДБТ - Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Отчетените стойности при индикаторите за продукт, отнасящи се до наблюдението и оценката на определените приоритети за развитие на общината и измерващи непосредствения напредък по реализацията на проекти и дейности, за 2024 година са представени в следващата таблица.

Индикаторите за продукт бележат добър прогрес в рамките на отчетния период. От 20 индикатора **за 9 от тях се отчита напредък**. При някои от останалите индикатори се очаква да бъде отчетен напредък в следващите години, тъй като през настоящата година се реализират или се очаква да се реализират проекти, които ще допринесат за изпълнението.

Таблица 9. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО към 2024 година

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Стойност ГД (2024)	Целева стойност (2027 г.)
Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури					
1.	Жилищни сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	25 (22)
2.	Публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Крумовград, ИСУН	4 (3)	5 (4)
3.	Новоразкрити социални услуги	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	3
4.	Обновени или реконструирани обекти на образованието	Брой	Община Крумовград, ИСУН	4	4
Приоритетно направление 2: Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината					
1.	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в населените места	Брой	Община Крумовград, ИСУН	4 (0)	3 (1)
2.	Реализирани проекти за подобряване водоподаването в населените места	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	2

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Стойност ГД (2024)	Целева стойност (2027 г.)
3.	Реализирани проекти, свързани с борбата с климатичните промени – залесяване, корекции на речни корита, системи за ранни предупреждения за природни явления	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	3
4.	Дължина на велоалейната мрежа в общината	Метър	Община Крумовград	0	2 500 (2 500)
Приоритетно направление 3: Развитие на туристическия потенциал на общината					
1.	Изградени еко или туристически пътеки в общината	Брой	Община Крумовград	0	8
2.	Ремонтирани обекти на културната инфраструктура	Брой	Община Крумовград, ИСУН	1	6
3.	Организираны фестивали годишно	Брой	Община Крумовград	1	7
4.	Среден престой на 1 пренощувал в общината	Дни	НСИ	1,56 (2023 г.)	2,2
Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности					
1.	Изградена индустриална зона	Брой	Община Крумовград	0	1 (1)
2.	Изграден пазар за селскостопанска продукция и животни	Брой	Община Крумовград	0	1 (1)
3.	Изградени/възстановени поливни (хидромелиоративни) съоръжения	Метър	Община Крумовград, ВиК	0	5 000
4	Брой лица преминали през курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на езикови и/или компютърни умения	Брой	Община Крумовград, ИСУН	136	80
Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление					
1.	Общински служители, преминали курсове за повишаване на квалификацията (с натрупване)	Брой	Община Крумовград	0	150
2.	Нови електронни услуги, предоставяни от Общината	Брой	Община Крумовград	0	5
3.	Разработени съвместни проекти с международни партньори или съседни общини	Брой	Община Крумовград	2	3
4.	Закупено компютърно оборудване за служителите на администрацията – компютри, скенери, принтери и др.	Брой	Община Крумовград	20 компютъра 3 принтера	200

Източник: по данни на НСИ, Община Крумовград, ДБТ - Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

4. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

Съгласно чл. 72 от ППЗРР годишните доклади включват в себе си информация за действията, предприети от компетентните органи за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана. Те включват следните компоненти:

- мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през годината, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана;
- мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
- мерки за прилагане принципа на партньорство;
- резултати от извършени оценки към края на съответната година.

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Основната мярка за наблюдение изпълнението на ПИРО е чрез предвидените в ЗРР инструменти за това – годишни доклади, междинна и последваща оценки.

Действащите механизми за събиране, обработване и анализ на данните са предопределени от източниците на официална информация у нас, както и механизмите за нейното получаване. В този смисъл формалният механизъм може да се обобщи в следните четири стъпки (дейности):

- Изготвяне на списък с необходимата информация за изготвяне на годишния доклад и/или междинна/последваща оценка.
- Подготовка и изпращане на официални писма до съответните институции с искане за информация и данни.
- След получаване на информацията – систематизиране в единна база данни за целите на доклада/оценката.
- Обработка на систематизираните данни и оформяне на резултатите от извършените анализи с тях.

Проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО и мерки за преодоляването им

През 2024 г. при изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. не са констатирани проблеми.

Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана

Още с изготвянето на ПИРО е разработена и комуникационна стратегия към него. В нея са описани методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни, както в хода на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация.

В допълнение, ПИРО е публикуван на сайта на Общината, за да може всеки заинтересован да се запознае с него. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Крумовград за 2021 г., 2022 г. и 2023 г., както и докладът от извършената междинна оценка, са публикувани на интернет страницата на Община Крумовград. Предвижда се настоящият годишен доклад също да бъде публикуван на сайта на Община Крумовград.

Други методи за осигуряване на публичност по изпълнението на плана са публикации в медии (онлайн и традиционни) за развитието на проекти, заложи в ПИРО. Доколкото настоящият доклад се фокусира върху четвъртата година на изпълнението на ПИРО, то се очаква мерките за публичност да продължат да се разгръщат в пълнота през следващите години.

Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени

Съответствието на ПИРО Крумовград със секторните планове и програми се постига чрез периодичен мониторинг на измененията или приемането на нови стратегически документи, отнасящи се до развитието на територията. За програмния период 2021-2027 година ПИРО е един от първите документи, който задава рамка за разработване на по-детайлни секторни стратегии и програми. В този смисъл може да се заключи, че ПИРО е в пълен синхрон с останалите стратегически документи на местно ниво, включително тези, отнасящи се до климатичните изменения и мерките за борба с тях.

Допълнително, значителна част от средствата, предвидени за реализация на дейности и проекти в ПИРО, се очаква да бъдат привлечени от „европейските програми“. Последните се изготвят в пълен синхрон с националното законодателство и стратегическа рамка. Това гарантира съответствие на ПИРО с останалите стратегически документи на регионално и национално ниво.

Мерки за прилагане принципа на партньорство

Прилагането на принципа на партньорство е гарантиран от изготвената комуникационна стратегия, приложение към ПИРО Крумовград. В нея са идентифицирани и систематизирани заинтересованите страни и са определени приложимите комуникационни дейности и канали за комуникиране на ПИРО Крумовград.

Резултати от извършени оценки

Към 31.12.2024 година е извършена междинна оценка във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград. Също така са изготвени и приети годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО Крумовград за 2021, 2022 и 2023 година.

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

В следващите редове е представена и систематизирана информацията, свързана с изпълнените или в процес на изпълнение/оценка проекти през 2024 година.

Напредъкът в изпълнението на ПИРО през 2024 година има количествено измерение от общо **132** отчетени проекта и инициативи на обща стойност от **37 004 405,02 лв.** Реално привлечените средства (местните инвестиции, трансферите от републиканския бюджет и от програмите на ЕС, както и от други източници) са в размер на **13 746 586,86 лв.**

За сравнение през предходната година общият брой проекти е 247 на обща стойност от 41 390 640,89 лв., а реално привлечените средства са били – 24 197 887,90 лв.


Пълният набор от проекти, реализирани през 2024 година, са посочени с техните параметри, съгласно ППЗРР (включително източник на финансиране и усвоени средства за 2024 г.) в **приложението към годишния доклад** и обхващат:

- проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на 2024 г.;
- проекти, които са в процес на изпълнение през 2024. Тук се включват проекти и инициативи, които са започнати преди 2024 г. или продължават и през 2025 г. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за 2024 г.

Изпълнението на ПИРО може да се разглежда в 2 направления. Първото е стойността на сключените договори по проектите и инициативите през 2024 г. Второто е реално изплатените средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото в края на 2024 г. са сключени договори по отделни програми, но в същото време все още не са направени плащания по тях. Поради тази причина се отчита разминаване от около над два и половина пъти между реалното финансово изпълнение, което е в размер на 15,25% и индикативното такова (на база само сключени договори, без плащания по тях), което достига до 41,09%. **В сравнение с 2023 г., през 2024 г. се забелязва намаление с 4,82% при стойностите на индикативното финансово изпълнение, докато реалното финансово такова е с 11,59% по-ниско.**

На следващата фигура са представени реално изплатените средства по отделните приоритети за 2024 г., като е посочена и индикативната стойност на проектите и дейностите в обхвата на съответния приоритет. С най-голяма индикативна стойност (21 173 хил. лв.) се отличава Приоритет 1 „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури“, както и с най-много реално изплатени средства (6 718 хил. лв.). На второ място по индикативна стойност (11 877 хил. лв.) и реално изплатени средства (5 512 хил. лв.) е Приоритет 2 „Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината“. С най-ниска индикативна стойност (227 хил. лв.), както и с най-малко реално изплатени средства (223 хил. лв.) се отличава Приоритет 3 „Развитие на туристическия потенциал на общината“.

Фигура 2. Индикативна стойност и реално изплатени средства по проекти в община Крумовград, по приоритети за 2024 г.

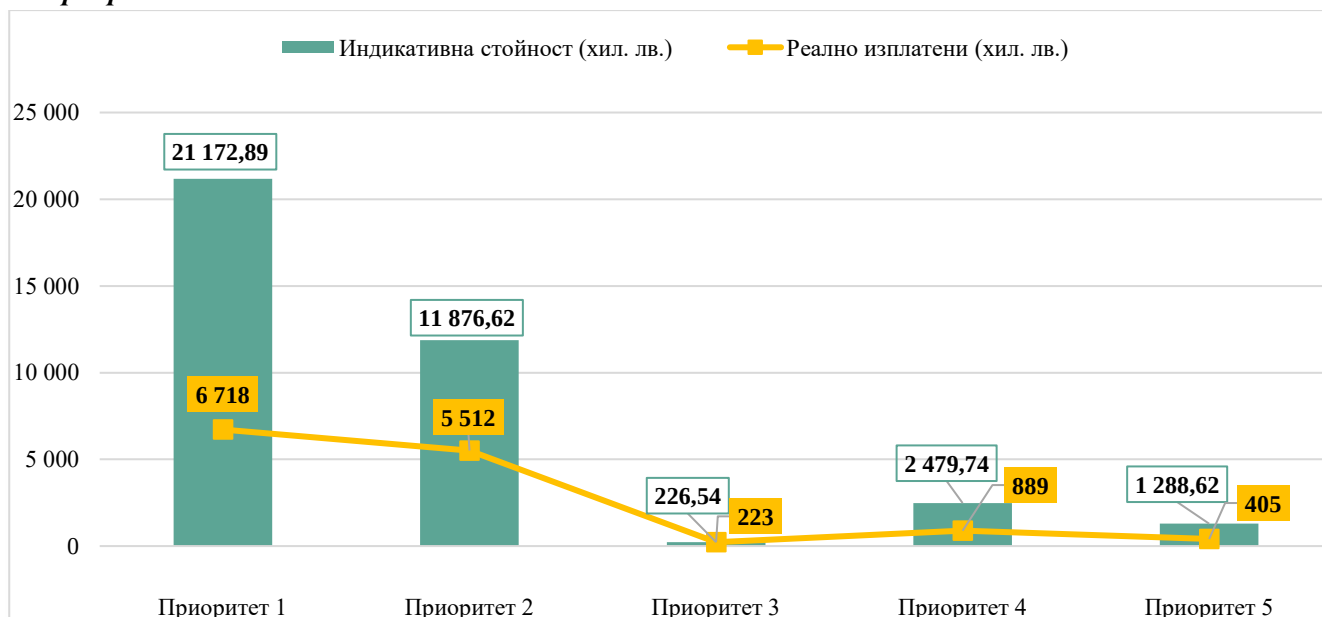

Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Изпълнението на отделните приоритети е обобщено в следващите редове и се наблюдава известен дисбаланс в изпълнението им през годината.

По **Приоритет 1. „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури“** през 2024 година се изпълняват 64 проекта/дейности на стойност 6 718 хил. лв. По приоритета се изпълняват проекти със социално значение за общността, финансирани по линия на ЕС – „Топъл обяд в община Крумовград“, „Бъдеще за децата в община Крумовград“, „Грижа в дома в община Крумовград“ и „Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, гр. Крумовград“. В етап на изпълнение са и 9 проекта за изграждане на STEM среда и ВОКС кабинети в училища от община Крумовград, финансирани по НПВУ. Средната стойност на проектно предложение е в размер на 330,83 хил. лв.

В Годишния отчет за 2024 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е посочено подаването на 3 проекта за саниране на МЖС, които попадат в списъка за финансиране. Очаква се да бъдат сключени договори за финансиране, с което реализирането на проектите да допринесе за изпълнението на Приоритет 1 в следващите години.

Приоритет 2. „Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината“ обхваща 39 проекта/дейности със средна стойност на проектно предложение 304,53 хил. лв. Изпълнените/изпълняващите се проекти и дейности са свързани с рехабилитация на участъци от общински пътища, изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитиране на общински пътища и улици, текуща поддръжка на пътната и уличната мрежи и др. Финансират се от общинския бюджет, централния бюджет и други източници, с което се отразяват усилията на Община Крумовград за поддържане на техническата и транспортната инфраструктури в оптимално състояние.

През 2024 година в обхвата на **Приоритет 3. „Развитие на туристическия потенциал на общината“** попадат 4 проекта/дейности. Средната стойност на проектно предложение е 56,63


хил. лв. Проектите „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войвода в гр. Крумовград“, „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград“ и „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград“ са разработени и се изпълняват с ефективното участие на МИГ „Крумовград-Момчилград“ по ПРСР 2014-2020.

В обхвата на **Приоритет 4. „Насърчаване на развитието на икономически дейности“** през 2024 г. са отчетени 11 проекта/дейности. Средната стойност на проектно предложение е 225,43 хил. лв. Проектите са финансирани основно по ПРСР 2021-2027 г.

По **Приоритет 5. „Прозрачно и диалогично управление“** през 2024 г. са реализирани 14 проекта/инициативи на обща стойност 1 289 хил. лв. В процес на изпълнение е проект, финансиран по линия на ЕС – „Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“ (НПВУ). Средната стойност на проектно предложение е в размер на 92,04 хил. лв.

Общото изпълнение за периода 01.01.2024-31.12.2024 г. е **132 изпълнени или текущи проекти със средна стойност от 280,64 хил. лв.** на проектно предложение.


Фигура 3. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2024 година проекти (по индикативни стойности) по приоритетни области

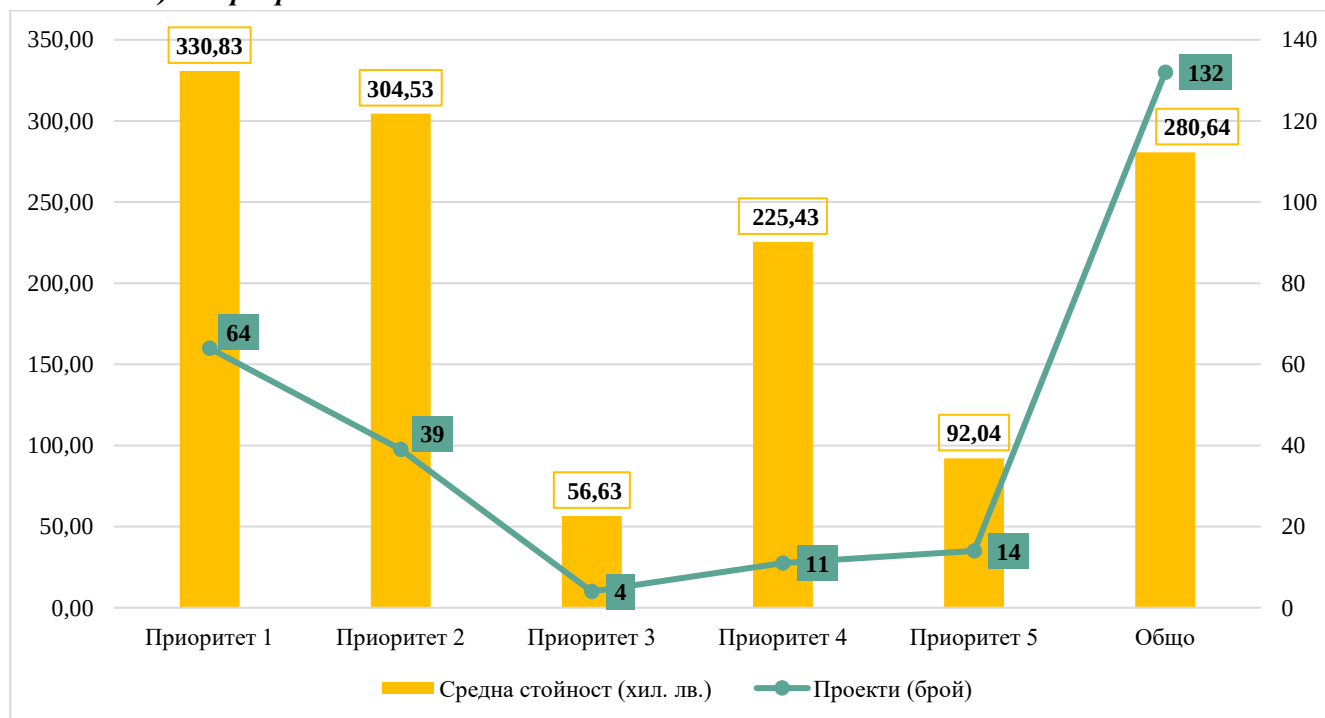

Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Ключова характеристика за изпълнение на ПИРО през 2024 година е, че Общината успява да привлича средства от различни източници – публични и частни. С най-голям дял от изплатените (вложени) средства са тези от централния бюджет (40,52%), следвани от средствата от Европейските фондове за споделено управление (37,67%). На следващо място по дял на средствата са привлечените от „други източници“ (11,39%). С малко по-нисък дял от тях са средствата, постъпили от общинския бюджет (9,99%). С най-малък дял са получените средства от частни инвестиции.

Фигура 4. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за 2024

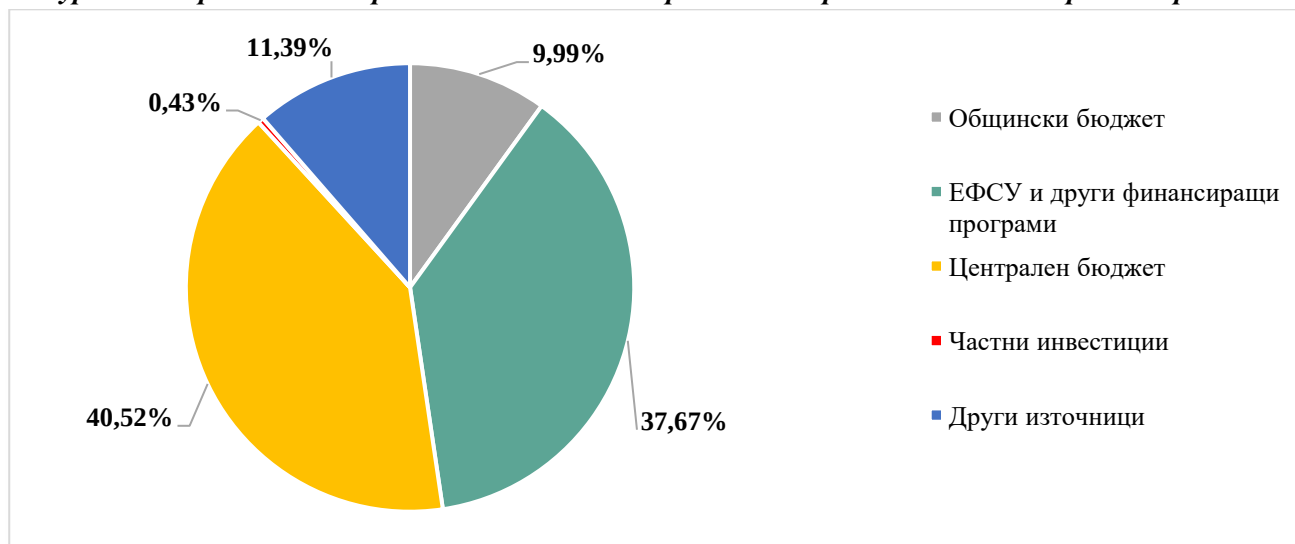

Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

С най-добро изпълнение през 2024 г. спрямо заложения индикативен бюджет по приоритети в ПИРО Крумовград е Приоритет 1 – 19,35%. На второ място е Приоритет 4 с финансово изпълнение от 16,31% спрямо индикативния финансов разчет в ПИРО Крумовград. През 2024 г. изпълнението на Приоритет 2 е 13% спрямо заложения индикативен бюджет по приоритета, а на Приоритет 5 – 10,25%. С по-ниско изпълнение е Приоритет 3 – 6,18%. През 2024 г. изпълнението на ПИРО Крумовград достига до 15,25% спрямо заложения индикативен бюджет в плана.

Таблица 10. Реално финансово изпълнение по приоритети за 2024 г. спрямо заложеното в ПИРО


Цел/приоритет	Индикативна стойност (хил. лв.)	Проекти (брой)	Средна стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (хил. лв.)	Заложени в ПИРО (хил. лв.)	Изпълнение (%)
Приоритет 1. Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури	21 172,89	64	330,83	6 717,58	34 718	19,35%
Приоритет 2. Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината	11 876,62	39	304,53	5 512,25	42 415	13,00%
Приоритет 3. Развитие на туристическия потенциал на общината	226,54	4	56,63	223,34	3 615	6,18%

Цел/приоритет	Индикативна стойност (хил. лв.)	Проекти (брой)	Средна стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (хил. лв.)	Заложени в ПИРО (хил. лв.)	Изпълнение (%)
Приоритет 4. Насърчаване на развитието на икономически дейности	2 479,74	11	225,43	888,84	5 450	16,31%
Приоритет 5. Прозрачно и диалогично управление	1 288,62	14	92,04	404,58	3 949	10,25%
ОБЩО ЗА ПИРО 2021-2027	37 044,41	132	280,64	13 746,59	90 147,00	15,25%

Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

През 2024 година приносът на отделните приоритети е различен, като с най-голям процент от всички привлечени ресурси през годината е Приоритет 1 (49%). На следващо място е Приоритет 2 (40%). С по-малък принос са средствата по Приоритет 3, Приоритет 4 и Приоритет 5 – съответно 2%, 6% и 3%.

Фигура 5. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за 2024 г.

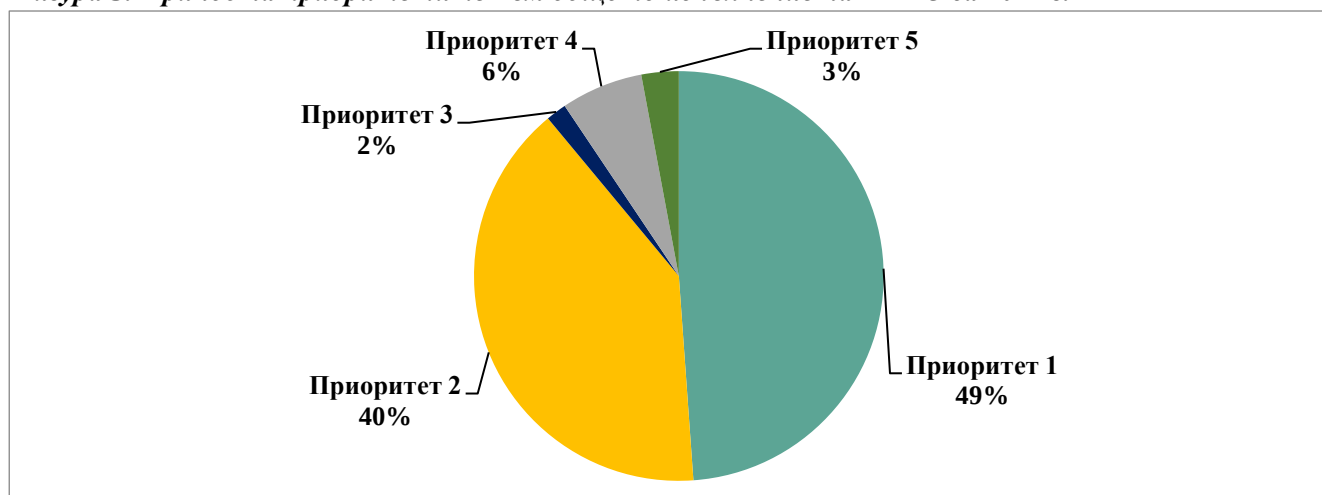

Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Изпълнение на конкретни проекти или дейности, заложиени в Програмата за реализация на ПИРО Крумовград.

В Програмата на реализация, както и в стратегическата част – към всяка мярка са заложиени отделни конкретни проекти или дейности, които се очаква да се реализират в периода до 2027 година.

Поради тази причина в следващата таблица е направен паралел между заложеното в ПИРО и постигнато през 2024 година. **От общо 169 проектни инициативи, заложиени в ПИРО, през 2024 г. по 46 от тях има развитие, т.е. отчетени са конкретни дейности.** Следва да се отбележи, че част от дейностите са продължение на миналогодишните, а други напълно нови проекти. Също така, ако проектът е бил окончателно изпълнен през предходен период, то същият не е включен в настоящ доклад. Информацията показва, че Община Крумовград доста стриктно се придържа към предварително заложените дейности и проекти, което демонстрира отличен капацитет за планиране и последващо осъществяване и реализиране на зададените общински политики за развитие.

Таблица 11. Сравнение между заложените в ПИРО проектни идеи и конкретните резултати през 2024 година

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2024
<i>Мярка 1.1. Внедряване на мерки за ЕЕ в жилищни сгради</i>		
1	По информация от Годишния отчет за 2024 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: По НПВУ са подготвени, внесени и одобрени 3 проекта за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Предстои сключване на договори за финансиране и изпълнение на проектите през следващите години от изпълнението на ПИРО.	
<i>Мярка 1.2. Реконструкция на обектите на образователната инфраструктура и прилежащите им пространства</i>		
2	Ремонт на съществуващ басейн в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград	„Проект за реновиране на басейна в СУ „Васил Левски“, град Крумовград“ (ППР)
3	Изграждане на детска градина в село Подрумче, община Крумовград	„Изграждане на детска градина в с. Подрумче, общ. Крумовград, вкл. ИП, АН и СН“
4	Ремонт и обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“ с. Горна кула и благоустрояване на прилежащи пространства	„Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“
5	Благоустрояване на прилежащите пространства на сграда на ОУ „П. К. Яворов“, с. Токачка	„Изграждане на STEM среда.“
6	Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда ДГ „Слънце“, с. Токачка	„Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“, с. Токачка, общ. Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“
<i>Мярка 1.3. Подобряване на социалните услуги, предостави в община Крумовград</i>		
7	Ремонт и оборудване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Крумовград	„Закупуване на кухненско оборудване за Крумовград.“
8		„Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж - Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка“
9	Реформиране на дома за стари хора	„Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, гр. Крумовград“
10	Функциониране на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в общността	Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград по проект „Бъдеще за децата в община Крумовград“
<i>Мярка 1.4. Подобряване на средата за отдих в община Крумовград</i>		
11	Довършване на обект: „Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк, зона А в гр. Крумовград“	„Благоустрояване на част от градски парк“, с местонахождение: УПИ I-956, кв. 73, представляващ ПИ с ид. № 39970.501.956 по КК и КР на град Крумовград, община Крумовград, област Кърджали - ОДК
<i>Мярка 1.5. Стимулиране на спортните активности в общината</i>		
12	Изграждане на общински басейн в гр. Крумовград	Обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв.103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград, Крумовград

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2024
13	Ремонт на спортни съоръжения	Изготвени са инвестиционни проекти (ИП) за следните обекти: „Надстрояване на обслужваща сграда на спортен център за многофункционална зала, Крумовград“
14		„Изграждане на спортна площадка в УПИ 1, кв.5а по ПУП на с. Токачка“
15		„Спортно игрище“ с местонахождение: УПИ I-22, кв.4 по план на с. Сливарка (ПРР)
16		„Спортно игрище“ с местонахождение: ПИ с ид. № 55751.12.100 по КККР на село Пелин (ПРР)
	Мярка 1.6. Борба с безстопанствените животни	
17	Изграждане на общински/регионален приют за безстопанствени кучета	Сключен договор с ветеринарен лекар за кастриране, обезпаразитяване и чипиране на безстопанствени кучета
	Мярка 1.7. Подобряване качеството на здравното обслужване	
18	Привличане на здравни специалисти в населените места на община Крумовград	По информация от Годишния отчет за 2024 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: За привличане на медицински специалисти от бюджета на общината с решение на Общински съвет Крумовград са отпуснати допълнителни възнаграждения в размер на 2 000 лв. за всеки специалист. През месец декември 2024 г. е привлечен 1 лекар акушер-гинеколог в МБАЛ „Живот+“ ЕООД.
19	Извършване на профилактични прегледи сред рисковите обществени групи	Прегледи на възрастни хора над 65 години по програмата „Забавно лято, грижовна есен“. По проект „Грижа в дома“ беше изпълнена дейност по превенция на значими заболявания на 102 потребители, лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
	Мярка 2.1. Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги на територията на общината	
20	Изграждане на обществени паркинги в гр. Крумовград	Изготвен е инвестиционен проект (ИП) за следния обект: „Изграждане на паркинг и ремонт на част от тротоарни настилки в УПИ I, кв.83, представляващ ПИ с ид. № 39970.505.1097, по КК и КР на град Крумовград“
	Мярка 2.2. Създаване на условия за алтернативно придвижване	
	Няма данни за осъществени проекти, заложиени в ПИРО	
	Мярка 2.3. Изграждане, рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа	
21	Рехабилитация и реконструкция на път KRZ2225 /III-509, Кандилка – Крумовград/ - Луличка – граница общ. (Крумовград – Момчилград) – KRZ 1391/	„Рехабилитация на общ. път KRZ 2225-Крумовград-Луличка - граница KRZ 1391 II етап от км 4+563,74 до км 6+425,46, вкл. АН и СН, Луличка“
22	Рехабилитация и реконструкция на път KRZ1215 /II-59, Звездел - Крумовград / - Горна кула – Долна кула	„Основен ремонт (Рехабилитация) на общински път KRZ1215 Горна Кула – Долна Кула от км 0+000 до км. 5+000

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2024
23	През 2024 г. са рехабилитирани асфалтови и бетонови настилки по общинска пътна мрежа по населени места извън общинския център в размер на приблизително 5,5 км.	
	<i>Мярка 2.4. Подобряване състоянието на уличното осветление</i>	
24	Подмяна на осветителни тела на уличната осветителна мрежа в населените места	Изготвен е следният инвестиционен проект (ИП): „Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград“
25		„Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград“
	<i>Мярка 2.5. Рехабилитация, разширяване и изграждане на водоснабдителната и канализационната мрежи в общината</i>	
26	Рехабилитация, разширяване и изграждане на местни водоизточници (кладенци, каптиране) за нуждите на неводоснабдените места	Изготвен е следният инвестиционен проект: ИП „Допълнително водоснабдяване, с. Подрумче“
	<i>Мярка 2.6. Подобряване екологичното състояние в общината</i>	
27	Разширяване обхвата на системата за сметосъбиране в общината	Изработва се работен проект за следния обект: „Изграждане на претоварна станция в землището на с. Бараци“ (ППР)
	<i>Мярка 2.7. Борба с климатични промени</i>	
28	Корекция на бреговата ивица на река Крумовица в границите на населените места	Изготвен е следният проект: „Проект за почистване на коритото на река Крумовица с обхват 400 м преди и 400 м след моста на републикански път Крумовград – Токачка - Кукуряк от отложени наноси, Крумовград“ (ППР)
	<i>Мярка 3.1. Подобряване на достъпа и състоянието на културните ценности и обектите на културната инфраструктура</i>	
29	„Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство - паметник на Капитан Петко Войвода в гр. Крумовград“	„Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войвода в гр. Крумовград“
30	Ремонт и оборудване на сграда за култура и изкуство – Общински музей, гр. Крумовград	Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура, изкуство - паметник на културата", вкл. АН и СН, гр. Крумовград
	<i>Мярка 3.2. Представяне на традициите и обичаите на района, както и другите туристически атракции</i>	
31	Поддържане и обогатяване на културния календар	Общината регулярно се грижи за културния календар и е организатор и съ-организатор на множество събития през 2024 г. През 2024 г. е изпълнен проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград“ чрез МИГ „Момчилград – Крумовград“

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2024
	Мярка 3.3. Изграждане на туристическа инфраструктура и съоръжения за достъп в защитените територии – туристически пътеки, еко пътеки и др.	
32	Маршрут: с. Ковил – с. Студен кладенец	„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград“ (зона за отдих с. Студен кладенец)
33	Маршрут: гр. Крумовград – с. Долна кула	„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград“ (зона за отдих с. Долна кула)
	Мярка 4.1. Привличане на инвестиции в общината	
	Няма данни за осъществени проекти, заложи в ПИРО	
	Мярка 4.2. Равен шанс за работа на всички	
34	Организиране на курсове и обучителни програми за квалификация и преквалификация	През 2024 година за реализирани обучения по проекти, предимно по ПРЧР.
35	Организиране на стажове за безработни младежи	През 2024 е назначен безработен младеж - висшист по Национална програма „Старт на кариерата“.
	Мярка 4.3. Подкрепа за развитие на земеделието и животновъдството в общината	
36	Отдаване на земя под аренда за селскостопански дейности за по-дългосрочен период от време	Общината регулярно сключва договори за аренда по целесъобразност.
37	Стимулиране развитието на биологично земеделие и създаване на базар на производителя	Реализирани са редица проекти по ПРСР, описани в Приложение №1.
	Мярка 5.1. Внедряване на мерки за ЕЕ в публичните сгради в общината	
38	Изграждане на фотоволтаични инсталации на публични сгради за производство на електроенергия за собствени нужди	„Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“
39		„Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“ – 2 броя сгради
40		„Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“ с. Токачка, общ. Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“
	Мярка 5.2. По-добро управление на общинската собственост	
41	Изготвяне и актуализация на ПУП и устройствени схеми на община Крумовград	Изготвяне на ПУП-ове - 4 дейности
	Мярка 5.3. Повишаване качеството на предоставяните административни услуги	
42	Внедряване на електронни административни услуги	Предоставят се електронни административни услуги, внедрени през предходни периоди
43	Обновяване на оборудването на Общинска администрация Крумовград	Закупени са: 20 бр. компютъра и 3 бр. принтера
44	Изграждане, ремонт и оборудване на сградите на кметствата по населените места в община Крумовград	„Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2024
45	Организиране на обучения за повишаване на капацитета и компетенциите на служители на Община Крумовград, вкл. за подготовка и изпълнение на проекти с европейско финансиране	87 общински служители, кметове на населени места и общински съветници са преминали обучение по ключова компетентност за повишаване на компетенциите
	<i>Мярка 5.4. Прозрачно управление и съвместни инициативи</i>	
46	Подкрепа за функционирането на МИГ „Момчилград – Крумовград“	Общината регулярно подкрепя дейността на МИГ като част от Общото събрание.

Източник: ПИРО Крумовград 2021-2027, Капиталова програма за 2024, Годишен отчет за 2024 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г., ИСУН, ДФЗ, Общинска администрация

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

Общите заключения по отношение изпълнението на ПИРО са, както следва:

- През 2024 година годишната инфлация в страната намалява до 2,2%. Политическата нестабилност на национално ниво продължава.
- Не се отчитат сериозни демографски промени за периода 2022-2023 година. Стойностите на показателите се запазват сравнително еднакви, с изключение на коефициента на механичен прираст, който достига до 34,37%.
- Намалява броят на предприятията в община Крумовград, както и броят на заетите лица в тях. Статистическата информация от НСИ по отношение на икономиката в община Крумовград е конфиденциална в по-голямата си част, което не позволява да бъдат изследвани настъпилите промени.
- През 2024 година ограниченията за изпълнението на ПИРО Крумовград са външни. Въпреки това общото изпълнение на ПИРО Крумовград за 2024 година е много добро – 15,25% реално изплатени средства и 41,09% по обща индикативна стойност.
- През 2024 година са стартирани проекти, чието изпълнение ще продължи и през следващите няколко години.
- Приносът за доброто изпълнение на ПИРО през 2024 г. се дължи най-вече на Приоритет 1 „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури“ – 6 717,58 хил. лв. реално изплатени средства.
- С по-нисък процент на изпълнение се характеризира Приоритет 3 „Развитие на туристическия потенциал на общината“.
- И през 2024 г. информацията от НСИ е със значителна степен на конфиденциалност, което не позволява отчитане на част от индикаторите. За индикаторът „Общо образувани битови отпадъци“ също няма налична актуална информация, с която да бъде отчетен напредъкът по индикатора.
- Системата за наблюдение и контрол е добре изготвена и дава възможност за обективно проследяване на заложените индикатори за резултат и продукт. Проблем се явява степента на конфиденциалност на информацията, предоставяна от НСИ. Като същата няма как да бъде заместена от други източници.
- По отношение на източниците на финансиране се наблюдава превес на средствата, получени от централния бюджет (40,52%), следвани от тези на европейските фондове за споделено управление (37,67). Приносът на средствата от общинския бюджет достига до 9,99%. Средствата, постъпили от „други източници“ през 2024 г. достигат до 11,39%.
- За някои от изготвените инвестиционни проекти предстои осигуряване на необходимите средства за реализирането им с бюджета на Общината за 2025 г. При инвестиционните проекти, за които вече е осигурено финансиране предстои стартиране на изпълнението на СМР.

Обобщено, през 2024 г. изпълнението на ПИРО Крумовград не е толкова добро, колкото в предходните години. Въпреки това в следващата година се очаква изпълнението на плана да бъде по-добро с оглед на започналите нови проекти в общината. Разработени са проектни предложения за кандидатстване по национални и европейски програми, което показва

готовността на Община Крумовград за кандидатстване по предстоящи процедури и привличане на европейски средства, с принос към изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027 г.

Препоръчва се настоящата структура на доклада да бъде продължена и в следващите години, за да може по-лесно да се проследява напредъка на ПИРО. В същото време единната структура ще подпомогне по-качествено, лесно и пълно разработване на предстоящата последваща оценка на ПИРО.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 г.

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури		21 172 886,98	6 717 578,89		614 330,87	4 890 463,32	1 165 268,70	0,00	47 516,00								
1	„Топъл обяд в община Крумовград“	2 366 701,10	658 542,80	ПХОМП		658 542,80											
2	„Бъдеще за децата в община Крумовград“	391 162,98	117 841,26	ПРЧР		117 841,26											
3	„Грижа в дома в община Крумовград“	1 451 639,85	976 019,35	ПРЧР		976 019,35											
4	Проект „Укрепване капацитета на Община Крумовград“, включително закупуване на мултифункционални устройства	84 412,00	44 393,89	ПРЧР		44 393,89											
5	„Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).“ (Държавно ОУ „Васил Левски“, с. Егрек)	60 561,50	0,00	НПВУ		0,00											
6	„Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“ (НУ „Васил Левски“, с. Звънарка)	60 599,68	0,00	НПВУ		0,00											
7	„Изграждане на STEM среда.“ (ОБУ „Пейо Крачолов Яворов“, с. Токачка)	181 768,93	0,00	НПВУ		0,00											
8	„Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“, с. Токачка, общ. Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“	514 476,92	257 229,36	ПРСР, Общински бюджет	6 585,07	250 644,29											
9	„Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, гр. Крумовград“	3 182 735,61	638 145,75	НПВУ		638 145,75											
10	„Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Никола Йонков Вапцаров““ (с. Подрумче)	176 557,76	0,00	НПВУ		0,00											
11	„Създаване на STEM център“ (ОУ „Васил Левски, с. Луличка)	181 798,79	86 354,49	НПВУ		86 354,49											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	„Изграждане на СТЕМ Център“ (ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Горна кула)	60 579,98	12 623,02	НПВУ		12 623,02											
13	„Изграждане на училищна СТЕМ среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в ОУ „Христо Ботев“, с. Гулийка“	181 799,55	0,00	НПВУ		0,00											
14	„Създаване на СТЕМ център“ (ПТТ „Христо Смирненски“, гр. Крумовград)	252 417,18	104 431,47	НПВУ		104 431,47											
15	„Изграждане на училищна СТЕМ среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище „Васил Левски“ - гр. Крумовград, област Кърджали“	361 723,15	0,00	НПВУ		0,00											
16	„Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на ДГ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“	1 772 587,00	1 632 366,00	НПВУ		1 632 366,00											
17	ИП за „Благоустройство на дворно пространство в поз. имот № 39970.501.159, гр. Крумовград“ (ППР)	18 000,00	18 000,00	Общински бюджет	18 000,00												
18	Проект за реновиране на басейна в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград (ППР)	18 000,00	6 300,00	Общински бюджет	6 300,00												
19	Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на ограда в УПИ I, кв. 14, по ПУП на гр. Крумовград“ (ППР)	20 000,00	0,00	Общински бюджет	0,00												
20	Придобиване на компютри и хардуер за ДГ с. Подрумче	6 525,00	6 525,00	Общински бюджет	6 525,00												
21	Доставка на компютри в училища, Крумовград	34 546,00	29 721,00	Централен бюджет			29 721,00										
22	Закупуване на компютри в ЦПЛР, гр. Крумовград	2 600,00	2 600,00	Централен бюджет			2 600,00										
23	Изграждане на детска градина в с. Подрумче, общ. Крумовград, вкл. ИП, АН и СН	2 090 411,00	719 494,00	Общински бюджет, Централен бюджет	62 979,00		656 515,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24	Закупуване на климатици за ОДК - ЦПЛР, Крумовград	24 000,00	18 000,00	Други източници					18 000,00								
25	Доставка на климатици в училище СУ „В. Левски“, Крумовград	3 785,00	0,00	Централен бюджет			0,00										
26	Доставка на проектори в СУ „В. Левски“, Крумовград	5 000,00	2 500,00	Централен бюджет			2 500,00										
27	Доставка и монтаж на 2 броя климатик за нуждите на ДГ „Юри Гагарин“, гр. Крумовград	7 000,00	6 870,00	Централен бюджет			6 870,00										
28	Опазване на околната среда чрез интерактивни технологии, Подрумче	7 500,00	7 500,00	Централен бюджет, Други източници			3 750,00		3 750,00								
29	Придобиване на друго оборудване за ДГ с. Подрумче	291 077,00	291 077,00	Общински бюджет	291 077,00												
30	Доставка на озвучителна техника, Крумовград	3 790,00	3 790,00	Централен бюджет			3 790,00										
31	Доставка на фитнес уреди, Крумовград	2 425,00	2 425,00	Централен бюджет			2 425,00										
32	Придобиване на кухненско оборудване за ДГ с. Подрумче	40 983,00	40 983,00	Общински бюджет	40 983,00												
33	Закупуване на електрическа професионална скара за ученически стол при СУ „Васил Левски“, Крумовград	2 000,00	1 524,00	Общински бюджет	1 524,00												
34	Закупуване на зеленчукорезачка за ученически стол при СУ „Васил Левски“, Крумовград	2 000,00	1 920,00	Общински бюджет	1 920,00												
35	Доставка на стопански инвентар - професионална ел. печка, професионална ел. фурна и зеленчукорезачка, Крумовград	12 600,00	10 950,00	Общински бюджет	10 950,00												
36	Закупуване на климатик за ЦНСТ, Крумовград	1 600,00	1 500,00	Централен бюджет			1 500,00										
37	Закупуване на секции за ЦНСТ, Крумовград	18 000,00	18 000,00	Централен бюджет			18 000,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
38	Закупуване на кухненско оборудване за ДСП, Крумовград	57 948,00	43 860,00	Общински бюджет, Централен бюджет	10 088,00		33 772,00										
39	Обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв.103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград	4 275 616,00	0,00	Общински бюджет	0,00												
40	Доставка и монтаж на 6 броя беседки, Крумовград	35 196,00	33 612,00	Общински бюджет, Други източници	22 512,00				11 100,00								
41	Зона за отдих с. Кандилка	14 900,00	8 766,00	Други източници					8 766,00								
42	ИП „Изграждане на детска площадка“ с местонахождение: УПИ II-23, кв.4 по план на с. Сливарка (ПРР)	12 000,00	12 000,00	Общински бюджет	12 000,00												
43	ИП „Вертикална планировка и благоустрояване към жил. блок „Пролет““ в ПИ 39970.501.34, представляващ част от УПИ VIII , кв. 4 от КК и КР на общ. Крумовград (ПРР)	13 920,00	13 920,00	Общински бюджет	13 920,00												
44	ИП „Вертикална планировка и благоустрояване към жил. блокове“ в ПИ с идентификатор 39970.504.1371 по КККР на гр. Крумовград, представляващ УПИ I , кв. 44 по ПУП гр. Крумовград (ПРР)	15 960,00	15 960,00	Общински бюджет	15 960,00												
45	Инвестиционен проект за обект „Надстрояване на обслужваща сграда на спортен център за многофункционална зала“, Крумовград	891 637,00	0,00	Централен бюджет			0,00										
46	Закупуване на фитнес уреди, Крумовград	7 200,00	7 200,00	Общински бюджет	7 200,00												
47	Светеща рамка за снимки, Крумовград	6 804,00	6 804,00	Общински бюджет	6 804,00												
48	Светеща подаръчна кутия, Крумовград	1 188,00	1 188,00	Общински бюджет	1 188,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация								
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
49	Светеци елементи по улични стълбове, Крумовград	25 680,00	25 680,00	Общински бюджет	25 680,00													
50	Закупуване на музикални инструменти - 4 броя, Крумовград	6 536,00	3 267,00	ЕФСУ (МИГ)		3 267,00												
51	Изграждане на сцена с места за настаняване в градски парк, Крумовград	837 539,00	277 056,00	Централен бюджет			277 056,00											
52	ИП „Изграждане на спортна площадка в УПИ 1, кв. 5а по ПУП на с. Токачка“	24 000,00	24 000,00	Общински бюджет	24 000,00													
53	ИП „Спортно игрище“ с местонахождение: УПИ I-22, кв. 4 по план на с. Сливарка (ПРР)	16 200,00	16 200,00	Общински бюджет, Централен бюджет	5 670,00		10 530,00											
54	ИП„Спортно игрище“ с местонахождение: ПИ с ид. № 55751.12.100 по КККР на село Пелин (ПРР)	16 200,00	16 200,00	Общински бюджет, Централен бюджет	5 670,00		10 530,00											
55	Закупуване на скенер за МБАЛ „Живот +“ Крумовград	420 000,00	0,00	Други източници					0,00									
56	Закупуване на центрофуга за клинична лаборатория на МБАЛ „Живот +“ Крумовград	2 000,00	2 000,00	Други източници					2 000,00									
57	Закупуване на дестилатор на клинична лаборатория на МБАЛ „Живот +“ Крумовград	4 000,00	3 900,00	Други източници					3 900,00									
58	Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж - Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка	43 860,00	43 860,00	Общински бюджет, Централен бюджет	10 087,80		33 772,20											
59	„Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“	80 064,00	50 040,00	ПРЧР		50 040,00												
60	Програма „Старт на кариерата“	15 735,00	2 625,50	Централен бюджет			2 625,50											
61	„Регионална програма за заетост – 2024 г.“ □	51 552,00	51 552,00	Централен бюджет			51 552,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
62	ИП „Благоустройство на част от градски парк с местонахождение: УПИ I, кв.73, представляващ ПИ с ид. № 39970.501.956 по КК и КР на град Крумовград“	10 320,00	6 708,00	Общински бюджет	6 708,00												
63	Изграждане на общински парк в град Крумовград, АН и СН	375 708,00	315 794,00	ПРСР (МИГ)		315 794,00											
64	ИП „Изграждане на парк в ПИ 39970.502.1436 по КККР на гр. Крумовград, УПИ I, кв. 116 по ПУП на гр. Крумовград“	17 760,00	17 760,00	Централен бюджет			17 760,00										
Приоритетно направление 2: Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктура и подобряване екологичното състояние в общината		11 876 624,70	5 512 248,00		632 107,00	0,00	3 361 283,00	0,00	1 518 858,00								
1	„Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград“	1 648 347,70	0,00	НПВУ		0,00											
2	Изготвяне на проект за почистване на коритото на река Крумовица с обхват 400 м. преди и 400 м след моста на републикански път Крумовград – Токачка - Кукурък от отложени наноси, Крумовград (ППР)	17 640,00	17 640,00	Други източници					17 640,00								
3	Основен ремонт на авторемонтна работилница с гаражи, вкл. АН и СН, Крумовград	885 800,00	867 135,00	Общински бюджет, Централен бюджет	310 154,00		556 981,00										
4	Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Укрепване на улица с подпорна стена в участък между О.Т 12 и О.Т. 13 по ПУП на с. Полковник Желязово, община Крумовград (ППР)	7 560,00	0,00	Общински бюджет	0,00												
5	Рехабилитация на общински път KRZ 1215 Горна Кула-Долна Кула от км 0+000 до км 5+000 първи етап, Долна Кула	1 972 154,00	0,00	Централен бюджет			0,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 > 2027
6	Реконструкция на път „НКV2101/ НКV2109/Маджарово – Границата общ. /Маджарово – Крумовград/ - Бряговец“, Бряговец	617 975,00	25 200,00	Общински бюджет	25 200,00												
7	Рехабилитация на общ.път KRZ 2225- Крумовград-Луличка- граница KRZ 1391 II етап от км 4+563,74 до км 6+425,46, вкл. АН и СН, Луличка	1 715 286,00	1 684 385,00	Централен бюджет			1 684 385,00										
8	ИП „KRZ2219- /III-5906, Казак-Голямо Каменяне/Черничево-III-5904/-от км 0+000 до км 8+028,47“, Аврен	59 760,00	59 760,00	Централен бюджет			59 760,00										
9	ИП за обект „Път „KRZ 1213 /III-509, Кукуряк – Токачка/ - Пашинци – Бук – Лъжичник“ от км 0+000 до км 5+560“, Бук (ППР)	57 562,00	57 562,00	Общински бюджет	57 562,00												
10	ИП „Рехабилитация на път „KRZ 1214 / III - 592, Кукуряк - Токачка / Пашинци - Граница общ. (Крумовград - Кирково) - Делвино - Чорбаджийско /I - 5/“ от км 0+000 до км 1+400“, Токачка (ППР)	17 580,00	6 153,00	Общински бюджет	6 153,00												
11	Укрепване на път в м. Тайник, с. Овчари, общ. Крумовград - инженеринг, вкл. СН, Овчари	86 280,00	86 280,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1 680,00		84 600,00										
12	Укрепване на път с подпорна стена в м. Козино, с. Звънарка - инженеринг, вкл. АН и СН	89 610,00	2 000,00	Общински бюджет	2 000,00												
13	Доставка и монтаж на потопяема помпа за с. Подрумче	1 509,00	1 509,00	Общински бюджет	1 509,00												
14	Закупуване на водна помпа за с. Кандилка	4 200,00	4 200,00	Общински бюджет	4 200,00												
15	Закупуване на помпа за с.Токачка	5 526,00	5 526,00	Общински бюджет	5 526,00												
16	Закупуване на инвенторен бензинов генератор, с. Аврен	1 500,00	1 469,00	Общински бюджет	1 469,00												
17	Закупуване на електрически къртач, с. Аврен	1 100,00	1 049,00	Общински бюджет	1 049,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация								
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
18	Изграждане и благоустрояване на улица от о.т. 443 през о.т. 552, 554, 556, 557, 558, 559 до о.т.560 и от о.т.558 до о.т. 562, гр. Крумовград	1 817 271,00	0,00	Централен бюджет			0,00											
19	Изграждане на улица от о.т. 515 до о.т.518, гр. Крумовград, вкл. АН и СН	376 588,00	244 776,00	Общински бюджет, Централен бюджет	77 239,00		167 537,00											
20	ИП „Изграждане на улици в с. Странджево от о.т. 85-95 до о.т. 106: от о.т. 95-96 до о.т. 100: от о.т. 13-7 до о.т. 6: от о.т. 77-72 до о.т. 55: от о.т. 70-78 до о.т. 79: от о.т. 76-67 до о.т. 55, с. Странджево	13 652,00	13 652,00	Общински бюджет	13 652,00													
21	ИП „Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград“	43 500,00	43 500,00	Общински бюджет	43 500,00													
22	Изготвяне на работен проект за „Изграждане на претоварна станция в землището на с. Бараци“ (ППР)	40 800,00	12 240,00	Други източници					12 240,00									
23	ИП „Изграждане на улица от о.т. 504-503-502501-500-411 до о.т.60 с дължина 225 м, кв.107, град Крумовград“ (ППР)	33 072,00	33 072,00	Общински бюджет, Централен бюджет	9 840,00		23 232,00											
24	ИП „Изграждане на улица от о.т. 442-456-457 до о.т. 458 с дължина 170 м, кв.104, град Крумовград“ (ППР)	10 392,00	10 392,00	Общински бюджет	10 392,00													
25	ИП „Изграждане на улица от о.т.419-4-5-6-7-8-9 до о.т. 16 с дължина 290 м, кв. 112, град Крумовград“ (ППР)	9 912,00	9 912,00	Общински бюджет	9 912,00													
26	Изместване на кабел 20 кВ на имотна граница ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград - инженеринг, вкл. СН	27 790,00	27 790,00	Общински бюджет	27 790,00													
27	„Изграждане на улица от О.Т. 101 до О.Т. 102 между кв. 19 и кв. 21 по плана на с. Подрумче, община Крумовград – инженеринг“, вкл. СН	357 000,00	346 788,00	Централен бюджет			346 788,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
28	Закупуване на специализирана техника за снегочистване, Крумовград	445 000,00	438 000,00	Централен бюджет			438 000,00										
29	ИП /заснемане/ Водоснабдяване, с. Чернооки	5 280,00	5 280,00	Общински бюджет	5 280,00												
30	ИП „Изграждане на паркинг и ремонт на част от тротоарни настилки в УПИ I, кв. 83, представляващ ПИ с ид. № 39970.505.1097, по КК и КР на град Крумовград“	8 400,00	8 400,00	Други източници					8 400,00								
31	Текуща поддръжка на път II 59 от км 29+945 до км 55+845	42 416,00	42 416,00	Други източници					42 416,00								
32	Текуща поддръжка на път III 591 от км 0+000 до км 24+900	37 714,00	37 714,00	Други източници					37 714,00								
33	Текуща поддръжка на път III 592 от км 44+623 до км 67+558	124 760,00	124 760,00	Други източници					124 760,00								
34	Текуща поддръжка на път III 593 от км 0+000 до км 18+000	1 735,00	1 735,00	Други източници					1 735,00								
35	Текуща поддръжка на път III 5902 от км 8+900 до км 16+668	31 632,00	31 632,00	Други източници					31 632,00								
36	Текуща поддръжка на път III 5904 от км 0+000 до км 26+174	424 403,00	424 403,00	Други източници					424 403,00								
37	Текуща поддръжка на път III 5906 от км 21+520 до км 49+750	804 918,00	804 918,00	Други източници					804 918,00								
38	Реконструкция на водоснабдителната мрежа в община Крумовград	13 000,00	13 000,00	Други източници					13 000,00								
39	ИП „Допълнително водоснабдяване на с. Подрумче“	18 000,00	18 000,00	Общински бюджет	18 000,00												
Приоритетно направление 3: Развитие на туристическия потенциал на общината		226 538,25	223 335,25		0,00	118 129,25	105 206,00	0,00	0,00								
1	„Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войвода в гр. Крумовград“	21 120,65	21 120,65	ПРСР (МИГ)		21 120,65											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград“	49 724,00	47 091,00	ПРСР (МИГ)		47 091,00											
3	„Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград“	49 917,60	49 917,60	ПРСР (МИГ)		49 917,60											
4	„Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура, изкуство - паметник на културата“, вкл. АН и СН, Крумовград	105 776,00	105 206,00	Централен бюджет			105 206,00										
Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности		2 479 735,90	888 840,89		15 870,00	127 860,42	686 558,00	58 552,47	0,00								
1	Стартова помощ за развитието на малки стопанства	29 337,00	0,00	ПРСР		0,00											
2	Извършване на услуги по земно-изкопни работи с комбиниран багер	99 499,90	99 499,89	ПРСР, Частни инвестиции		74 624,92		24 874,97									
3	Отглеждане на трайни насаждения	29 337,00	9 779,00	ПРСР		9 779,00											
4	Подпомагане развитието на малко земеделско стопанство	29 337,00	9 779,00	ПРСР		9 779,00											
5	Отглеждане на трайни насаждения	29 337,00	0,00	ПРСР		0,00											
6	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения на земеделския стопанин Айсун Сабри Осман	29 337,00	0,00	ПРСР		0,00											
7	Закупуване на многофункционална ултразвукова система за амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ ЕС Кардио мед ЕООД, гр. Крумовград	94 938,00	0,00	ПРСР (МИГ), Частни инвестиции		0,00		0,00									
8	Стартова помощ за създаване и развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения на младия земеделски стопанин Ерол Касим Устов	48 895,00	0,00	ПРСР		0,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация								
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
9	Трансфер на знания и подобряване на уменията на земеделските производители за конкурентноспособно и устойчиво животновъдство	10 800,00	0,00	ПРСР		0,00												
10	Закупуване на трактор с технологично решение за конкурентоспособно и устойчиво земеделие с технологични решения за екологичен преход	80 826,00	67 355,00	НПВУ, Частни инвестиции		33 677,50		33 677,50										
11	ИП и извършване на СМР за обект: „Детски развлекателен център с кафе-сладкарница“, в УПИ III, кв. 73 по ПУП на гр. Крумовград	1 998 092,00	702 428,00	Общински бюджет, Централен бюджет	15 870,00		686 558,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление		1 288 619,19	404 583,83		110 472,50	42 333,33	251 778,00	0,00	0,00								
1	„Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“	668 286,19	45 563,83	Общински бюджет, НПВУ	3 230,50	42 333,33											
2	Основен ремонт на покрив на сграда в ПИ с иден. 31142.16.35 по КККР на с. Златолист – инженеринг,вкл. СН	32 090,00	31 990,00	Централен бюджет			31 990,00										
3	ИП „Вертикална планировка и благоустройство на УПИ I, кв. 28 по ПУП на с. Полковник Желязово, общ. Крумовград“. (ПРР)	17 400,00	6 090,00	Общински бюджет	6 090,00												
4	Придобиване на компютри и хардуер за Общинска администрация, Крумовград	30 000,00	30 000,00	Общински бюджет	30 000,00												
5	Закупуване на скенери, Крумовград	8 000,00	8 000,00	Общински бюджет	8 000,00												
6	Закупуване на цветен ксерокс, Крумовград	7 000,00	7 000,00	Общински бюджет	7 000,00												
7	Обществена сграда с конферентни зали, с. Полковник Желязово, вкл. АН и СН	263 363,00	163 940,00	Централен бюджет			163 940,00										
8	Закупуване на две камери за видеонаблюдение в кметство Пелин	2 980,00	2 980,00	Общински бюджет	2 980,00												
9	Доставка и монтаж на контейнер /фургон/ за кметство с. Тинтява	16 500,00	16 500,00	Общински бюджет	16 500,00												
10	Изготвяне на проект ОУПО, Крумовград	214 800,00	85 920,00	Общински бюджет, Централен бюджет	30 072,00		55 848,00										
11	Изработване на ПУП за водоснабдяване с. Джанка	3 600,00	3 600,00	Общински бюджет	3 600,00												
12	Изработване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в Крумовград, област Кърджали“, Крумовград	3 000,00	3 000,00	Общински бюджет	3 000,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2024 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	ПУП-ИПРЗ на УПИ I, кв.106 по ПУП на гр. Крумовград, представляващ ПИ с ид. №39970.502.1393 по КК и КР на гр. Крумовград и придружаващите го Ел. и ВиК схеми, Крумовград	18 000,00	0,00	Общински бюджет	0,00												
14	ПУП-ПРЗ за обект: „Разширение на гробищен парк на с. Лимец, общ. Крумовград“	3 600,00	0,00	Общински бюджет	0,00												
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ		37 044 405,02	13 746 586,86		1 372 780,37	5 178 786,32	5 570 093,70	58 552,47	1 566 374,00								
