


УТВЪРЖДАВАМ:.....
/СЕБИХАН МЕХМЕД/
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
.....2016 год.
Доклада съм получила на дата 25.10. 2016 г.

**ДОКЛАД за работата на комисията
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП**

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП се изготви настоящия Доклад за работата на Комисията.

1. Комисията е определена със Заповед № КО-643/29.07.2016 г. на кмета на Община Крумовград – Себихан Керим Мехмед.

2. Състава на комисията е както следва:

Председател: инж. Абидин Хаджимехмед -заместник-кмет на община Крумовград;

Членове: Мария Христозова – ст. експерт „НЕПОП“ в общинска администрация Крумовград;

Валерия Пехливанова – старши юрисконсулт в общинска администрация Крумовград;

Външни експерти от списъка на АОП:

Иван Сергеев Дойнов – магистър, правоспособен юрист с № в АОП ВЕ – 759;

инж.Гергана Цанкова Вълкова – магистър, инженер със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ с № в АОП ВЕ – 159.

3. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на Инженеринг по две обособени позиции по реализацията на НПЕЕЖМС на територията на община Крумовград“.

Откритата, по вид, процедура е открита със Заповед № КО-557/22.06.2016 26.02.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2016-0010.

4. Задачите на комисията поставени от Възложителя бяха: Да извърши подбор, разглеждане и оценка на оферти на участниците в рамките на посочената процедура за възлагане на обществена поръчка.

5. Възложителят бе поставил срок за извършване/приключване на работата на комисията до 27.10.2016 г.

6. Работния процес на комисията протече при стриктно спазване на законоустановените процесуални и материални разпоредби на ЗОП и ППЗОП, както и изпълнение на утвърдения от Председателя график за нейната работа. Офертите в настоящата поръчка бяха предадени на председателя на комисията по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. *От участниците бяха изискани допълнителни документи съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, като същите бяха получени в законоустановения срок и разгледани от комисията на основание 54, ал. 12 от ППЗОП.* Комисията разгледа получените допълнителни документи и извърши преценка, че участниците съответстват на изискванията на възложителя, поради което всички участници бяха допуснати до следващия етап на процедурата. Комисията състави и обективира/мотивира своята работа в Протокол №1, Протокол № 1.1., Протокол №2, Протокол №3 и настоящият доклад.

7. Всички действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите са обективирани и посочени в Протоколи №1, 1.1., 2 и 3 от работата на комисията.

8. Класирането на участниците е подробно описано и мотивирано в Протоколи № 1, 1.1., 2 и 3 от работата на комисията.

8.1. Крайно класиране на участниците в процедурата е:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „МЛАДОСТ“, НАХОДЯЩА СЕ В: ГР. КРУМОВГРАД, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №1“

I-во място Участник № 6 „МЕАЦА“ ЕООД, ЕИК 108568283

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“, НАХОДЯЩА СЕ В: ГР. КРУМОВГРАД, КВ. „ЗАПАД“ БЛОК 1“:

I-во място Участник №9 „СИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 108023144

9. Комисията е предложила за отстраняване участници, като подробно изложени мотиви са обективирани в Протокол №2 за работата на комисията:

УЧАСТНИК № 1: КОНСОРЦИУМ „ЕКО-ПАНОВ“, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №1 КОНСОРЦИУМ "ЕКО ПАНОВ", представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- *Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометиран циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал;*
- *Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова;*
- *Да се подменят воронките;*
- *Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;*
- *Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.*
- *Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.*
- *Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.*
- *Измазване на обрушени крайща на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.*

- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.

- Всички констатиранни пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.

- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.

Освен тези дейности, в графика не е включена дейността по осъществяване на авторски надзор.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, освен поради горните констатации и тъй като в графика не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 2: КОНСОРЦИУМ „ВИ-АТМ“ на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно: Комисията е установила, че участник №2 КОНСОРЦИУМ "ВИ АТМ", представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
- Измазване на неизмазани комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.
- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки

около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.

- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост EI 90.

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като между позиция III.1. „Доставка и редене на топлоизолационна система XPS, с дебелина 10 см, по покривната плоча на основен покрив, вкл. армирана циментова замазка и полиетиленово фолио“ (изпълняваща се от 50-ти до 59-ти ден) и позиция III.2 „Демонтаж на стара хидроизолация, доставка и полагане на хидроизолация с паста Изомакс еласта, двупластова, с един пласт армировка на 100% от площта на покрива на сграда“ (изпълняваща се от 45-ти до 49-ти ден), е налице технологично неправилна последователност на изпълнение, тъй като е технологично невъзможно и недопустимо хидроизолацията да се полага, преди основата под нея. Тези несъответствия са в разрез с изискванията на техническата спецификация и не само ще допринесат за некачествено изпълнение на дейностите, но биха могли да доведат до компрометиране цялостно изпълнение на поръчката. Съгласно техническата спецификация, техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Същевременно в Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 3: „ХИДРОИЗОМАТ“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №3 "ХИДРОИЗОМАТ" АД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометирани циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал;
- Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова;
- Да се подменят воронките;
- Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета;
- Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;
- Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.

- Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.
- Всички констатиранни пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.
- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.
- Да се възстанови мълниезащитната инсталация.
- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите помещения.
- Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.
- Да се отдели кафето от мазетата чрез врата осигуряваща огнеустойчивост EI90;
- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост EI 90

Същевременно в Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 4: „СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно: Комисията е установила, че участник №4 "СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ" ООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като в предложението от участника график е застъпен срок за изпълнение на СМР от 116 календарни дни, което се разминава с посоченото на 67 стр. и 114 стр. от обяснителната записка, описание на продължителност и последователност на извършване на СМР, където е предвидено срока за изпълнение на строителството да е 114 календарни дни. Още повече, че в табличната част на линейния график на участника погрешно е посочено, че строителството започва на 12.09. и завършва на 07.01. с предаване на обекта, което са общо 119 календарни дни.

Тези несъответствия са в разрез със следното изискване на техническата спецификация „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и предложените организация и подход на изпълнение на поръчката следва да налице е пълно съответствие.

УЧАСТНИК № 5: „НСК СОФИЯ“ ЕООД

на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №5 "НСК София" ЕООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като:

- между позиция IV.1. „Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS 8 см върху външни стени на неотопляем сутерен (цокъл на сградата)“ (изпълняваща се от 35-ти до 46-ти ден) и позиция IV.2 „Полагане на мозаечна минерална мазилка по външни стени на неотопляем сутерен (цокъл на сградата), включително грундиране“ (изпълняваща се от 35-ти до 46-ти ден) е налице технологично неправилна последователност на изпълнение, тъй като е технологично недопустимо в един и същи ден да се полага топлоизолация и финишната мазилка върху нея, без да се отчете необходимото време за технологичен престой между отделните операции. Това технологично разминаване е се потвърждава и от обяснителната записка на техническото предложение на участника, при обясняване технологията на полагане на топлоизолация, където правилно е констатирано по повод операцията, предхождаща шпакловката с мрежа и изпълнението на външна мазилка, че: „Монтажът на дюбела ще се извършва през лепилен слой след достатъчно втвърдяване на лепилото (най-малко 24 часа)“.

- между позиция IV.3. „Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS 6 см по еркери“ (изпълняваща се от 72-ри до 78-ми ден) и позиция IV.2 „Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по еркери“, включително грундиране“ (изпълняваща се от 69-ти до 71-ви ден), е налице технологично неправилна последователност на изпълнение, тъй като е технологично невъзможно и недопустимо да се полага финишната мазилка, преди основата под нея. Тези несъответствия са в разрез с изискванията на техническата спецификация и не само ще допринесат за некачествено изпълнение на дейностите, но биха могли да доведат до компрометиране цялостно изпълнение на поръчката. Съгласно техническата спецификация, техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

УЧАСТНИК № 7: „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №7 "ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ" АД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като между позиция 28. „Доставка и редене на топлоизолационна система XPS, с дебелина 10 см, по покривната плоча на основен покрив, вкл. армирана циментова замазка и полиетиленово фолио“ (изпълняваща се от

4-ти до 23-ти ден) и позиция 27...„Демонтаж на стара хидроизолация, доставка и полагане на хидроизолация с паста Изомакс еласта, двупластова, с един пласт армировка на 100% от площта на покрива на сграда“ (изпълняваща се от се от 4-ти до 23-ти ден), тъй като е технологично недопустимо в един и същи ден да се полага армирана циментова замазка и хидроизолация с паста Изомакс еласта, двупластова върху нея, без да се отчете необходимото време за технологичен престой между отделните операции. Тези несъответствия са в разрез с изискванията на техническата спецификация и не само ще допринесат за некачествено изпълнение на дейностите, но биха могли да доведат до компрометиране цялостно изпълнение на поръчката. Съгласно техническата спецификация, техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

УЧАСТНИК № 8: „ПИ ЕС АЙ“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №8 "ПИ ЕС АЙ" АД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се подменят воронките;
- Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
- Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.

Същевременно, участникът е включил в линейния график, дейности, които не са въобще предмет на настоящата поръчка, като: поз.93. „Доставка и монтаж на домофонна система, вкл. пощенски кутии“ и „Подмяна на главни ел. табла, дефектнотокова апаратура, кабел ПВВМ“.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочен броя на работниците, ангажирани с изпълнението на отделните дейности. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация, „Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвиден брой работници, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 10: „СТРОЙЕКСПРЕС-НН“ ООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №10 "СТРОЙЕКСПРЕС НН" ООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се подменят воронките и водосточните тръби;
- Измазване на неизмазани комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост EI 90;
- Дейности от ЕСМ 3: Топлинно изолиране на покрив.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като в графика не са отразени планираните начални и крайни дати на отделните дейности. В представеното календарно планиране са отразени само планираните продължителности на работите, но за някои дейности не може да бъдат констатирани кога точно започват или кога точно завършват, съответно, няма как да се установи последователността на тяхното изпълнение. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация, „Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвиден брой работници, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 11: „ДУРАЛ“ ООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно: Комисията е установила, че участник №11 "ДУРАЛ"ООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се подменят воронките;
- Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета;
- Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;
- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.
- Да се възстанови мълниезащитната инсталация.
- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите помещения.
- Да се отдели кафето от мазетата чрез врата осигуряваща огнеустойчивост

ЕІ90;

- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост ЕІ 90.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, освен поради горните констатации и тъй като в графика не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

10. Поради спецификата на процедурата, не са изисквани и съответно не са и представени мостри и/или снимки.

11. На 29.10.2016 г. от 13:00 часа комисията, в основния си състав, отвори ценовите оферти на допуснатите участници „МЕАЦА“ ЕООД (за Обособена позиция 1) „СИМЕКС“ ЕООД (за Обособена позиция 2) и констатира, че същите са:

„МЕАЦА“ ЕООД:

1. Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка – 585 028,31 лв. без ДДС /петстотин осемдесет и пет хиляди и двадесет и осем лева и тридесет и една стотинки, без ДДС/.

„СИМЕКС“ ЕООД:

1. Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка – 735 500,00 лв. без ДДС /седемстотин тридесет и пет хиляди и петстотин лева, без ДДС/.

Комисията провери представените ценови оферти и установи, че в същите няма грешки предлаганата цена, общо и по отделни бюджетни пера, съответства на прогнозната стойност на възложителя, посочена в документацията.

12. Комисията извърши класиране, съобразно методиката за оценка на офертите и класира на I-во място за отделните обособени позиции участници, както следва:

За Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в: гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски” №1“ с комплексна оценка от 85 точки участник „МЕАЦА“ ЕООД, ЕИК 108568283.

Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в: гр. Крумовград, кв. „Запад” блок 1“, с Комплексна оценка от 100 точки участник „СИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 108023144.

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията класиране, единодушно предлагаме на Възложителя да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг по две обособени позиции по реализацията на НПЕЕЖМС на територията на община Крумовград“, открита със Заповед № КО-557/22.06.2016 26.02.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2016-0010:

За Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в: гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски” №1“:

с класирания на I-во място участник „МЕАЦА“ ЕООД, ЕИК 108568283.

за Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в: гр. Крумовград, кв. „Запад“ блок 1“

с класираният на I-во място участник „СИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 108023144

13. Неразделна част от настоящия Доклад са Протоколи от работата на комисията №1, 1.1., 2 и 3, както и графикът за дейността на комисията.

14. На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП Председателят на Комисията следва да предаде Доклада и Протоколите от работата на комисията на Възложителя за утвърждаване в срок не по-дълъг от посоченият в т.5 от настоящия Доклад.

Докладът се изготви съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и се подписа на 05.10.2016 г. от председателя и членовете на комисията.

Председател:

.....

(инж. Абидин Хаджимехмед)

Членове:

1.

(Мария Христозова)

2.

(Валерия Пехливанова)

3.


(Иван Дойнов)

4.

(инж.Гергана Вълкова)

ГРАФИК

за работата на комисията определен от Председателя на комисията
съгласно чл. 51, ал. 4, т.1. от ППЗОП.

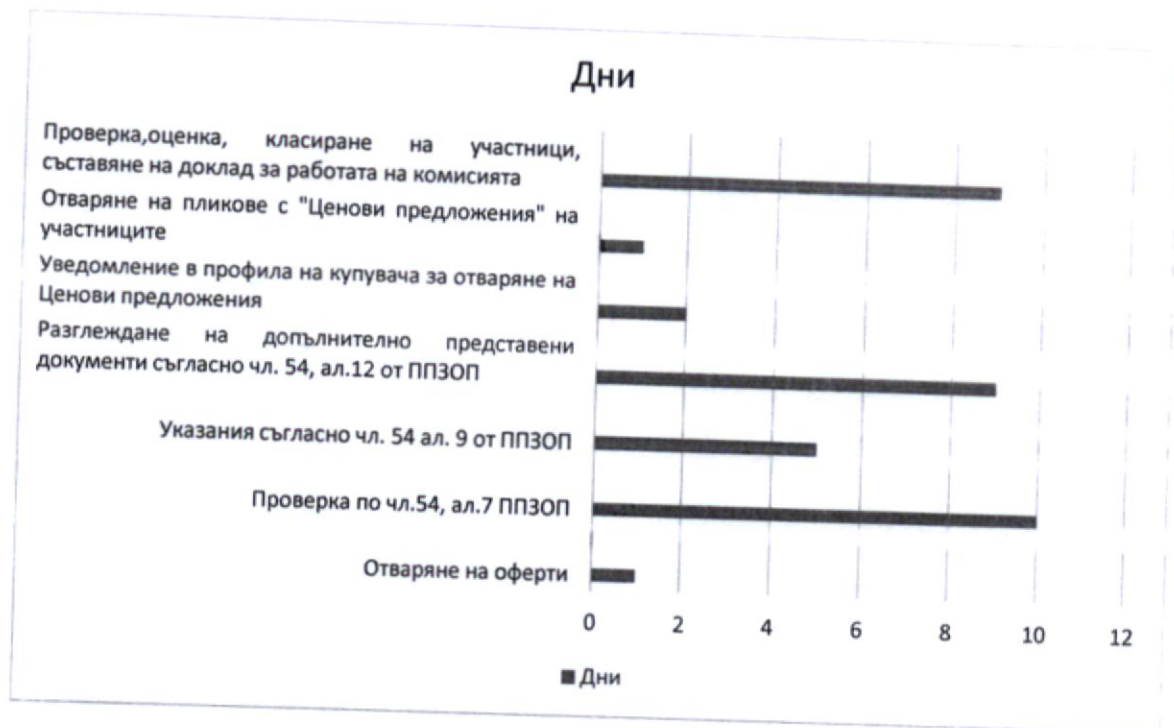

*Графика е индикативен. При липса на законово ограничение, някои дейности могат да се застъпят а съответните срокове съкратят или удължат.

Председател:

.....*10/*.....

(инж. Абидин Хаджимехмед)

Членове:

1.*10/*.....

(Мария Христозова)

2.*10/*.....

(Валерия Пехливанова)

3.*10/*.....

(Иван Дойнов)

4.*10/*.....

(инж.Гергана Вълкова)
