

**ДОГОВОР**  
№ 235 от 12.06 2020 г.

Днес ..... 2020 год., в гр. Крумовград, на основание заповед № КО – 413 от 19.05.2020 г. на кмета на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

**ОБЩИНА КРУМОВГРАД** гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – Кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна  
и от друга

**„ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД** гр. Велико Търново с ЕИК 204278312 със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, представлявано от Тунджай Тахир с ЕГН: \_\_\_\_\_, в качеството му на управител на „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект по **обособена позиция № 4 „Бетонени настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка, Токачка и Горна Кула“** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14**, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: **микрорайони Голяма Чинка, Токачка и Горна Кула, общ. Крумовград.**

### II. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на пълното изпълнение на правата и задълженията на страните по договора, в това число изпълнение на задълженията по време на гаранционния период.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е **51** /петдесет и един/ календарни дни, съгласно техническото предложение на Изпълнителя и включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането.

### III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на **61 446.22** (шестдесет и една Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, 1  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и двадесет и две стотинки) лева без ДДС или **73 735.46** (седемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки) лева с ДДС,

и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка: 4.20 лв.
- Допълнителни разходи върху труд: 70 %.
- Допълнителни разходи върху механизация: 10 %.
- Доставно-складови разходи: 10 %.
- Печалба: 10 %.

(2) Посочената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(3) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Крумовград по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банкови реквизити:

Банка

Банков код:

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(2) Авансовото плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора.

(3) Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи съгласно съставения и подписан акт образец 19. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на действително изпълнените и приети строително-монтажни работи и общата сума от авансовото плащане. Окончателно плащане по настоящия договор ще се извърши по банков път от Община Крумовград в 30-дневен срок след съставяне и подписване на акт образец 19 и представена от Изпълнителя оригинална фактура.

Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след приемане на извършената работа с двустранен протокол.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора, както и да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

## **VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА**

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

## **VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

### **VIII. КОНТРОЛ**

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

### **IX . НОСЕНЕ НА РИСКА**

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

### **X . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Чл. 25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г.и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове по ал. 1 започват да текат съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

### **XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## **XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, ал. 1;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
  - 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
  - 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
  - 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
  - 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, извън случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.
  - 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

## **XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.


Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат ценовото и техническото предложение към оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на **обект по обособена позиция № 4: „Бетонени настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка, Токачка и Горна Кула“.**

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Кмет на Община Крумовград  
(Себихан Мехмед)  


**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**.....  
Управител на „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД  
(Тунджай Тахир)  


Главен Счетоводител .....  
на Община Крумовград  
(Нури Нури)

Съгласувано с  
Директор на инспекция „НОП“:  
....  
(В. Илханова)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Образец № 3 –Приложим за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 14

ДО  
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА  
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за обществена поръчка с предмет:

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 4

От: „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ЕООД [наименование на участника], представлявано от ТУНДЖАЙ ТАХИР [трите имена] в качеството на УПРАВИТЕЛ [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК 204 278 312, със седалище и адрес на управление ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №5, адрес за кореспонденция: ГР.КРУМОВГРАД,УЛ.ИГЛИКА № 6 , телефон за контакт 0879 009 555, факс ....., електронна поща .....,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка, заявяваме, че:

1. Желаяме да участваме в обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 4

2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към строителството.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок **до 51 (петдесет и един) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

**ВАЖНО!!!!**

**При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!**

Към Техническото предложение прилагаме линеен календарен график, съобразен с горното условие, и диаграма на работната ръка, изготвени в съответствие с поставените изисквания, които са неразделна част към настоящото техническо предложение.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

***Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.***

Дата: 23.03.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

[ТУНДЖАЙ ТАХИР]  
[УПРАВИТЕЛ]

**Важно!!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.**

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

**Образец № 4 - Приложим за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 13  
ДО  
ОБЩИНА КРУМОВГРАД**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ЕООД [наименование на участника], представлявано от ТУНДЖАЙ ТАХИР [трите имена] в качеството на УПРАВИТЕЛ [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК 204 278 312, със седалище и адрес на управление ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №5, адрес за кореспонденция: ГР.КРУМОВГРАД,УЛ.ИГЛИКА № 6 , телефон за контакт 0879 009 555, факс ....., електронна поща .....

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 4

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 4 , предлагаме **Обща цена: 61446,22 (ШЕСТДЕСЕТ И ЕДИН ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И 22 СТ.) лева без ДДС** или 73735,46 (СЕДЕМДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И 46 СТ.) лева с включен ДДС.

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1/Образец № 4.2/Образец № 4.3/**Образец 4.4**/Образец № 4.5/Образец № 4.6, Образец № 4.7/Образец № 4.8/Образец № 4.9/Образец № 4.12 или Образец № 4.13/), изготвена съгласно изискванията на възложителя/инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

**Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:**

- **Часова ставка: 4,20 лв.**
- **Допълнителни разходи върху труд: 70 %.**
- **Допълнителни разходи върху механизация: 10 %.**
- **Доставно-складови разходи: 10 %.**
- **Печалба: 10 %.**

**Цената за изпълнение на договора:**

- включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
- е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и инвестиционния проект по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

**Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.**

**До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

Дата: 23.03.2020г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

[ТУНДЖАЙ ТАХИР]  
[УПРАВИТЕЛ]

**Важно!!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликкове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.**

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

## Образец № 4.4

"СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14"

Обособена позиция №4 "Бетонени настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка, Токачка и Г.Кула"

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонена настилка на път за с. Раличево

## КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,04	312,00
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	11,81	354,30
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	1,84	552,00
4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	22,00	14,41	317,02
5	Доставка и полагане на бетон	м3	30,00	135,00	4050,00
			ОБЩО:		5585,32
			10 % печалба		558,53
					6143,85
			20% ДДС		1228,77
			Всичко:		7372,62

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонена настилка на път за с. Тополка

## КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,04	312,00
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	11,81	354,30
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	1,84	552,00
4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	22,00	14,41	317,02
5	Доставка и полагане на бетон	м3	30,00	135,00	4050,00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОЦ  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

		ОБЩО:	5585,32
		10 % печалба	558,53
			6143,85
		20% ДДС	1228,77
		Всичко:	7372,62

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонена настилка на път за м. Сестримо с. Бук

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	600,00	1,04	624,00
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	60,00	11,81	708,60
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	600,00	1,84	1104,00
4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	44,00	14,41	634,04
5	Доставка и полагане на бетон	м3	60,00	135,00	8100,00
			ОБЩО:		11170,64
			10 % печалба		1117,06
					12287,70
			20% ДДС		2457,54
			Всичко:		14745,24

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонена настилка на път за м. Дружинци с. Г. Чинка

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	600,00	1,04	624,00
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	60,00	11,81	708,60
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	600,00	1,84	1104,00
4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	44,00	14,41	634,04
5	Доставка и полагане на бетон	м3	60,00	135,00	8100,00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



		ОБЩО:	<b>11170,64</b>
		10 % печалба	1117,06
			12287,70
		20% ДДС	2457,54
		Всичко:	<b>14745,24</b>

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонена настилка на път зам. Тополица с. Метлика

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,04	312,00
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	11,81	354,30
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	1,84	552,00
4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	22,00	14,41	317,02
5	Доставка и полагане на бетон	м3	30,00	135,00	4050,00
			ОБЩО:		<b>5585,32</b>
			10 % печалба		558,53
					6143,85
			20% ДДС		1228,77
			Всичко:		<b>7372,62</b>


ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонена настилка на път за м. Песъчарка, с. Долна Кула

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,04	312,00
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	11,81	354,30
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	1,84	552,00
4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	22,00	14,41	317,02

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



5	Доставка и полагане на бетон	м3	30,00	135,00	4050,00
			ОБЩО:		5585,32
			10 % печалба		558,53
					6143,85
			20% ДДС		1228,77
			Всичко:		7372,62

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонова настилка на път за м. Нова махала, с. Бараци

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	210,00	1,04	218,40
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	21,00	11,86	249,06
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	210,00	1,84	386,40
4	Направа и развяляне кофраж за бетонова настилка	м2	22,00	14,48	318,56
5	Доставка и полагане на бетон	м3	20,16	135,48	2731,28
			ОБЩО:		3903,70
			10 % печалба		390,37
					4294,07
			20% ДДС		858,81
			Всичко:		5152,88

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонова настилка на път за м. Метличена, с. Бараци

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	300,00	1,04	312,00
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	11,81	354,30
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	1,84	552,00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	22,00	14,41	317,02
5	Доставка и полагане на бетон	м3	30,00	135,00	4050,00
			ОБЩО:		<b>5585,32</b>
			10 % печалба		558,53
					6143,85
			20% ДДС		1228,77
			Всичко:		<b>7372,62</b>

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Обект: Бетонова настилка на път за с. Джанка

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Ръчно подравняване в земни почви	м2	92,00	1,04	95,68
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	9,00	11,81	106,29
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	76,00	1,85	140,60
4	Направа и разваляне кофраж за бетонова настилка	м2	10,00	14,34	143,40
5	Доставка и полагане на бетон	м3	9,00	133,63	1202,67
			ОБЩО:		<b>1688,64</b>
			10 % печалба		168,86
					1857,50
			20% ДДС		371,50
			Всичко:		<b>2229,00</b>

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Номер	Наименование	Мерка	К-во	Нормативна време ч.л.	Времетрае ч.л.	Времетрае ч. дм	Брой работници	Квалификация на работника	Ден	Начало	Край	Първи месец																														Втори месец																													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Обособена повърхност "Бетонени настипи на участъци от СМР" в землища в микрорайон Големия Чинак, Тополка и Г.Куча																																																																							
Съставни и подписване на двустранен протокол между представителни на изпълнителя и изпълнителя																																																																							
Бетонена настипа на път за с. Раличево																																																																							
1	Ръчно подравняване и земни работи	м2	300,00	0,145	43,50	5,44	6	Пътен работник	1	Ден 46	Ден 46																																																												
2	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	0,175	5,25	0,66	1	Пътен работник	1	Ден 47	Ден 47																																																												
3	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	0,055	16,50	2,06	3	Пътен работник	1	Ден 47	Ден 47																																																												
4	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	22,00	1,703	37,47	4,68	2	Пътен работник	3	Ден 48	Ден 50																																																												
5	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	2,619	78,57	9,82	5	Пътен работник	2	Ден 48	Ден 49																																																												
Бетонена настипа на път за с. Тополка																																																																							
6	Ръчно подравняване и земни работи	м2	300,00	0,145	43,50	5,44	6	Пътен работник	1	Ден 33	Ден 33																																																												
7	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	0,175	5,25	0,66	1	Пътен работник	1	Ден 34	Ден 34																																																												
8	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	0,055	16,50	2,06	3	Пътен работник	1	Ден 34	Ден 34																																																												
9	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	22,00	1,703	37,47	4,68	2	Пътен работник	3	Ден 35	Ден 37																																																												
10	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	2,619	78,57	9,82	5	Пътен работник	2	Ден 35	Ден 36																																																												
Бетонена настипа на път за м. Сестримо с. Бук																																																																							
11	Ръчно подравняване и земни работи	м2	600,00	0,145	87,00	10,88	6	Пътен работник	2	Ден 38	Ден 39																																																												
12	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	60,00	0,175	10,50	1,31	2	Пътен работник	1	Ден 40	Ден 40																																																												
13	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	600,00	0,055	33,00	4,13	5	Пътен работник	1	Ден 40	Ден 40																																																												
14	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	44,00	1,703	74,94	9,37	2	Пътен работник	5	Ден 41	Ден 45																																																												
15	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	60,00	2,619	157,14	19,64	3	Пътен работник	4	Ден 41	Ден 44																																																												
Бетонена настипа на път за м. Друмичи с. Г. Чинак																																																																							
16	Ръчно подравняване и земни работи	м2	600,00	0,145	87,00	10,88	6	Пътен работник	2	Ден 20	Ден 21																																																												
17	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	60,00	0,175	10,50	1,31	2	Пътен работник	1	Ден 22	Ден 22																																																												
18	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	600,00	0,055	33,00	4,13	5	Пътен работник	1	Ден 22	Ден 22																																																												
19	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	44,00	1,703	74,94	9,37	2	Пътен работник	5	Ден 23	Ден 27																																																												
20	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	60,00	2,619	157,14	19,64	3	Пътен работник	4	Ден 23	Ден 26																																																												
Бетонена настипа на път за м. Тополка с. Мелника																																																																							
21	Ръчно подравняване и земни работи	м2	300,00	0,145	43,50	5,44	6	Пътен работник	1	Ден 28	Ден 28																																																												
22	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	0,175	5,25	0,66	1	Пътен работник	1	Ден 29	Ден 29																																																												
23	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	0,055	16,50	2,06	3	Пътен работник	1	Ден 29	Ден 29																																																												
24	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	22,00	1,703	37,47	4,68	2	Пътен работник	3	Ден 30	Ден 32																																																												
25	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	2,619	78,57	9,82	5	Пътен работник	2	Ден 30	Ден 31																																																												
Бетонена настипа на път за м. Пасмурал, с. Долна Кула																																																																							
26	Ръчно подравняване и земни работи	м2	300,00	0,145	43,50	5,44	6	Пътен работник	1	Ден 2	Ден 2																																																												
27	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	0,175	5,25	0,66	1	Пътен работник	1	Ден 3	Ден 3																																																												
28	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	0,055	16,50	2,06	3	Пътен работник	1	Ден 3	Ден 3																																																												
29	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	22,00	1,703	37,47	4,68	2	Пътен работник	3	Ден 4	Ден 6																																																												
30	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	2,619	78,57	9,82	5	Пътен работник	2	Ден 4	Ден 5																																																												
Бетонена настипа на път за м. Нова махала, с. Бараце																																																																							
31	Ръчно подравняване и земни работи	м2	210,00	0,145	30,45	3,83	4	Пътен работник	1	Ден 7	Ден 7																																																												
32	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	21,00	0,175	3,68	0,46	1	Пътен работник	1	Ден 8	Ден 8																																																												
33	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	210,00	0,055	11,55	1,44	2	Пътен работник	1	Ден 8	Ден 8																																																												
34	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	22,00	1,703	37,47	4,68	2	Пътен работник	3	Ден 9	Ден 11																																																												
35	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	20,16	2,619	52,80	6,60	4	Пътен работник	2	Ден 9	Ден 10																																																												
Бетонена настипа на път за м. Мелничево, с. Бараце																																																																							
36	Ръчно подравняване и земни работи	м2	300,00	0,145	43,50	5,44	6	Пътен работник	1	Ден 12	Ден 12																																																												
37	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	30,00	0,175	5,25	0,66	1	Пътен работник	1	Ден 13	Ден 13																																																												
38	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	0,055	16,50	2,06	3	Пътен работник	1	Ден 13	Ден 13																																																												
39	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	22,00	1,703	37,47	4,68	2	Пътен работник	3	Ден 14	Ден 16																																																												
40	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	2,619	78,57	9,82	5	Пътен работник	2	Ден 14	Ден 15																																																												
Бетонена настипа на път за с. Дивеня																																																																							
41	Ръчно подравняване и земни работи	м2	92,00	0,145	13,34	1,67	2	Пътен работник	1	Ден 17	Ден 17																																																												
42	Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см	м3	9,00	0,175	1,58	0,20	1	Пътен работник	1	Ден 17	Ден 17																																																												
43	Доставка и монтаж на арматурна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	76,00	0,055	4,18	0,52	1	Пътен работник	1	Ден 17	Ден 17																																																												
44	Награване и разваляне кофраж за бетонна настипа	м2	10,00	1,703	17,03	2,13	2	Пътен работник	2	Ден 18	Ден 19																																																												
45	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	9,00	2,619	23,57	2,95	3	Пътен работник	1	Ден 18	Ден 18																																																												
Съставни и подписване на акт-образец 19 за действително изпълнение СМР																																																																							

Диаграма на работната ръка

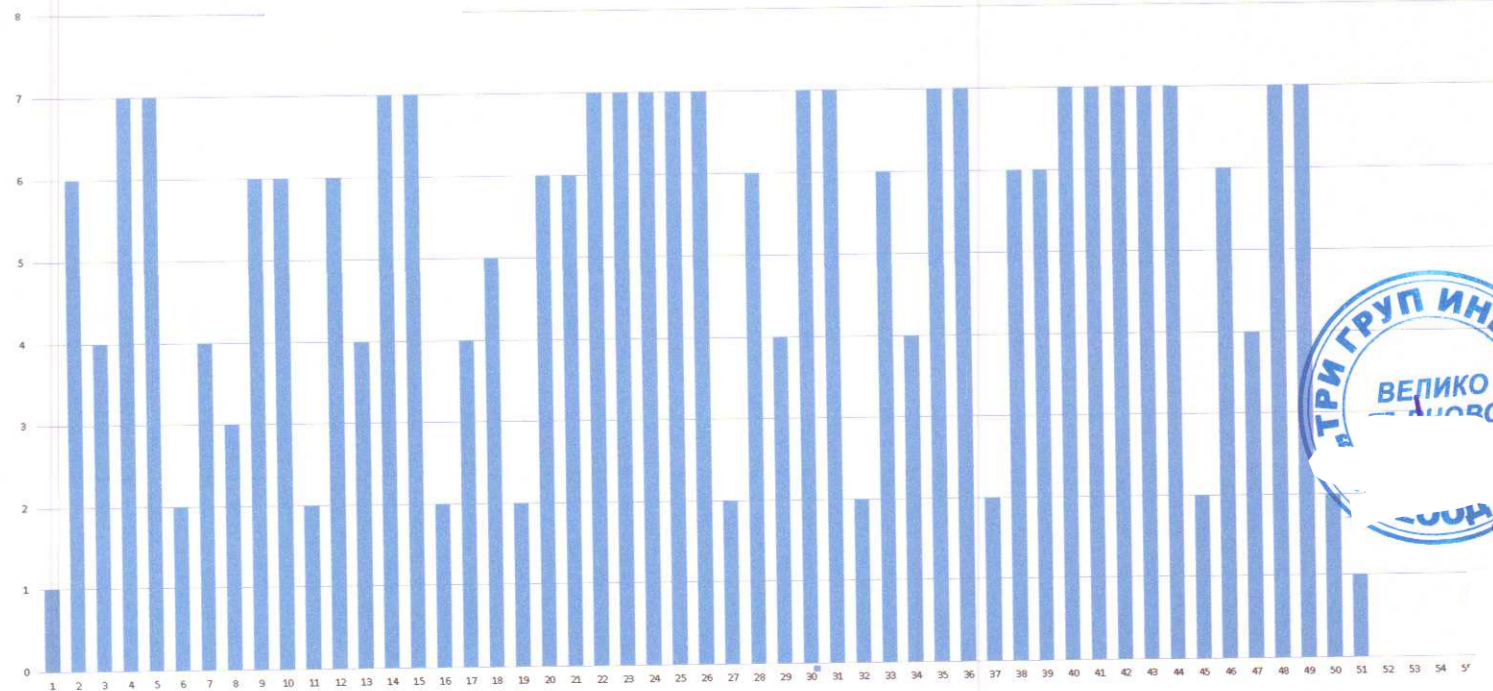




ГРАФИК НА ИЗПОЛЗВАНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ

Номер	Наименование	мерка	К-во	Начало	Край	Механизация	Р.Н.	мсм	Дни	Машини	Първи месец																														Втори месец																																																														
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																	
Обособена позиция №4 "Бетонени настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Голѝма Чинка, Топѝчка и Г.Муѝла"																																																																																																							
Съставяне и подписване на двустранен протокол между представители на възлѝчителя и изпълнителя												ч.дни	1,00	Ден 1	Ден 1	Няма механизация	0,000	0,000	1	0	0																																																																																		
Бетонѝва настилка на път за с. Раличево																																																																																																							
1	Ръчно подравняване в земи почви	м2	300,00	Ден 46	Ден 46	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
				Ден 47	Ден 47	Багер	0,010	0,300	1	1																														1																																																															
2	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	30,00	Ден 47	Ден 47	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1																														1																																																															
3	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	Ден 47	Ден 47	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
4	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	22,00	Ден 48	Ден 50	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	3	1																														1	1	1																																																													
5	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	Ден 48	Ден 49	Бетоновоз	0,030	0,900	2	1																														1	1																																																														
Бетонѝва настилка на път за с. Топоѝлка																																																																																																							
6	Ръчно подравняване в земи почви	м2	300,00	Ден 33	Ден 33	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
				Ден 34	Ден 34	Багер	0,010	0,300	1	1																														1																																																															
7	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	30,00	Ден 34	Ден 34	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1																														1																																																															
8	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	Ден 34	Ден 34	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
9	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	22,00	Ден 35	Ден 37	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	3	1																														1	1	1																																																													
10	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	Ден 35	Ден 36	Бетоновоз	0,030	0,900	2	1																														1	1																																																														
Бетонѝва настилка на път за м. Сестрѝмо с. Буѝ																																																																																																							
11	Ръчно подравняване в земи почви	м2	600,00	Ден 38	Ден 39	Няма механизация	0,000	0,000	2	0																														0	0																																																														
				Ден 40	Ден 40	Багер	0,010	0,600	1	1																														1																																																															
12	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	60,00	Ден 40	Ден 40	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,300	1	1																														1																																																															
13	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	600,00	Ден 40	Ден 40	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
14	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	44,00	Ден 41	Ден 45	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,176	5	1																														1	1	1	1	1																																																											
15	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	60,00	Ден 41	Ден 44	Бетоновоз	0,030	1,800	4	1																														1	1	1	1																																																												
Бетонѝва настилка на път за м. Друнѝнци с. Г. Чинка																																																																																																							
16	Ръчно подравняване в земи почви	м2	600,00	Ден 20	Ден 21	Няма механизация	0,000	0,000	2	0																														0	0																																																														
				Ден 22	Ден 22	Багер	0,010	0,600	1	1																														1																																																															
17	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	60,00	Ден 22	Ден 22	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,300	1	1																														1																																																															
18	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	600,00	Ден 22	Ден 22	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
19	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	44,00	Ден 23	Ден 27	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,176	5	1																														1	1	1	1	1																																																											
20	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	60,00	Ден 23	Ден 26	Бетоновоз	0,030	1,800	4	1																														1	1	1	1																																																												
Бетонѝва настилка на път зам. Топоѝлица с. Метѝлика																																																																																																							
21	Ръчно подравняване в земи почви	м2	300,00	Ден 28	Ден 28	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
				Ден 29	Ден 29	Багер	0,010	0,300	1	1																														1																																																															
22	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	30,00	Ден 29	Ден 29	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1																														1																																																															
23	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	Ден 29	Ден 29	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
24	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	22,00	Ден 30	Ден 32	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	3	1																														1	1	1																																																													
25	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	Ден 30	Ден 31	Бетоновоз	0,030	0,900	2	1																														1	1																																																														
Бетонѝва настилка на път за м. Песъѝарка, с. Долна Муѝла																																																																																																							
26	Ръчно подравняване в земи почви	м2	300,00	Ден 2	Ден 2	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
				Ден 3	Ден 3	Багер	0,010	0,300	1	1																														1																																																															
27	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	30,00	Ден 3	Ден 3	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1																														1																																																															
28	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	Ден 3	Ден 3	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
29	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	22,00	Ден 4	Ден 6	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	3	1																														1	1	1																																																													
30	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	Ден 4	Ден 5	Бетоновоз	0,030	0,900	2	1																														1	1																																																														
Бетонѝва настилка на път за м. Нова маѝала, с. Барѝци																																																																																																							
31	Ръчно подравняване в земи почви	м2	210,00	Ден 7	Ден 7	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
				Ден 8	Ден 8	Багер	0,010	0,210	1	1																														1																																																															
32	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	21,00	Ден 8	Ден 8	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,105	1	1																														1																																																															
33	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	210,00	Ден 8	Ден 8	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
34	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	22,00	Ден 9	Ден 11	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	3	1																														1	1	1																																																													
35	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	20,16	Ден 9	Ден 10	Бетоновоз	0,030	0,605	2	1																														1	1																																																														
Бетонѝва настилка на път за м. Метѝичена, с. Барѝци																																																																																																							
36	Ръчно подравняване в земи почви	м2	300,00	Ден 12	Ден 12	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
				Ден 13	Ден 13	Багер	0,010	0,300	1	1																														1																																																															
37	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	30,00	Ден 13	Ден 13	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,150	1	1																														1																																																															
38	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	300,00	Ден 13	Ден 13	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
39	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	22,00	Ден 14	Ден 16	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,088	3	1																														1	1	1																																																													
40	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	30,00	Ден 14	Ден 15	Бетоновоз	0,030	0,900	2	1																														1	1																																																														
Бетонѝва настилка на път за с. Дѝанѝка																																																																																																							
41	Ръчно подравняване в земи почви	м2	92,00	Ден 17	Ден 17	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
				Ден 17	Ден 17	Багер	0,010	0,090	1	1																														1																																																															
42	Доставка и полагане на балѝстра за основа деб.10 см	м3	9,00	Ден 17	Ден 17	Товарен автомобил самосвал	0,005	0,045	1	1																														1																																																															
43	Доставка и монтаж на армѝровъчна мрежа с ф 6, 15/15 см	м2	76,00	Ден 17	Ден 17	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																														0																																																															
44	Направа и разваляне кофраж за бетонѝва настилка	м2	10,00	Ден 18	Ден 19	Товарен автомобил самосвал	0,004	0,040	2	1																														1	1																																																														
45	Доставка и полагане на бетон с деб.10 см	м3	9,00	Ден 18	Ден 18	Бетоновоз	0,030	0,270	1	1																														1																																																															
Съставяне и подписване на акт-образец 19 за действително изпълнени СМР												ч.дни	1,00	Ден 51	Ден 51	Няма механизация	0,000	0,000	1	0																																																																																			
Всичко:																																																																										0																													
														14,395																																																																																									
														3,000																																																														мсм																											
														2,420																																																														мсм																											
														8,975																																																														мсм																											

