

ДОГОВОР
№ 508..... от 25.10......2019 г.

Днес 25.10 2019 год., в гр. Крумовград, на основание заповед № КО - .873 от 03.10.2019 г. на ВРИД кмет на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от инж. Абидин Хаджимехмед – ВРИД кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 115872945 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район р-н Западен, ул. Рая № 9, вх. Е, представлявано от Гюрчай Сюлейман с ЕГН , в качеството му на управител на **„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящия договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект по обособена позиция № 4 **„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“** по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: гр. Крумовград, общ. Крумовград.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на пълното изпълнение на правата и задълженията на страните по договора, в това число изпълнение на задълженията по време на гаранционния период.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е **47 (четиридесет и седем) календарни дни**, съгласно техническото предложение на Изпълнителя и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и

протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горесцитираната наредба.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на **110 064.83 лева /сто и десет хиляди шестдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС или 132 077.80 лева (сто тридесет и две хиляди нула седемдесет и седем лева и осемдесет стотинки) с ДДС в това число:**

- 106 137.73 лв. без ДДС и 127 365.28 лева с ДДС за СМР

и

- 3 927.10 лв. без ДДС и 4 712.52 лева с ДДС 3,7 % **непредвидени разходи,**

и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка: 4,80 лв.
- Допълнителни разходи върху труд: 95%.
- Допълнителни разходи върху механизация: 35%.
- Доставно-складови разходи: 4%.
- Печалба: 10.%.

(2) Посочената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(3) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(4) Непредвидените разходи по ал. 1 от настоящия договор, се доказват с подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя. Непредвидените работи/разходи ще бъдат изпълнявани само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител, при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Кривопаланка по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка

Банков код

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(2) Авансово плащане в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на сключения договор, платимо в срок до 30 (тридесет) дни при едновременното наличие на следните предпоставки:

- подписан и надлежно оформен Протокол за откриване на строителната площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа – Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

- получено авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0035-C01 от 16.05.2019 г., сключен между ДФЗ – РА и Възложителя;

- издадена фактура от Изпълнителя.

(3) Окончателно плащане – в размер на разликата между действително извършените и приети СМР и платения аванс, в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал.

3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаването на фактура от Изпълнителя на Възложителя.

Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора, както и да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове по ал. 1 започват да текат съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, ал. 1;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
 - 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
 - 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
 - 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
 - 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, извън случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.
 - 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат ценовото и техническото предложение към оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на **обект по обособена позиция № 4 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“.**

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВрИД Кмет на Община Крумовград
(инж. Абидин Хаджимехмед)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД
(Гюрчай Сюлейман)

Главен Счетоводител
на Община Крумовград
(Нури Нури)

Съгласувано е
Директор на дирекция „ПОП“:
.....
(В. Пехливанова)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

ДО
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр.Крумовград, община Крумовград“

От: „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД,

представявано от ГЮРЧАЙ . СЮЛЕЙМАН, в качеството на УПРАВИТЕЛ
с БУЛСТАТ/ЕИК 115872945,

със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Тодор Хрулев“ №7, ет.3,

адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.“Тодор Хрулев“ №7, ет.3,

телефон за контакт 032/280072, факс 032/280072,

електронна поща office@gertgroup.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка, заявяваме, че:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр.Крумовград, община Крумовград“**

2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към строителството.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **47 (четиридесет и седем календарни дни) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

ВАЖНО!!!!

При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!

Към Техническото предложение прилагаме линеен календарен график, съобразен с горното условие, и диаграма на работната ръка, изготвени в съответствие с поставените изисквания, които са неразделна част към настоящото техническо предложение.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Дата: 19.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
(Гюрчай Сюлейман-Управител)

Важно!!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Образец № 4

ДО
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД,
представявано от: инж. Гюрчай Сюлейман
в качеството на: Управител на фирмата
с БУЛСТАТ/ЕИК: 115872945, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.
„Тодор Хрулев“ №7, ет.3, адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“
№7, ет.3, телефон за контакт: 032/28 00 72, факс: -, електронна поща:
office@gertgroup.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за обособена позиция № 4 - „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за обособена позиция № 4 - „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“ предлагаме обща цена: 110 064,83 (сто и десет хиляди и шейсет и четири лева, осемдесет и три ст.) лева без ДДС или 132 077,80 (сто тридесет и две хиляди и седемдесет и седем лева, осемдесет ст.) лева с включен ДДС, в това число:

- 106 137,73 лв. без ДДС и 127 365,28 лева с ДДС за СМР

и

- 3 927,10 лв. без ДДС и 4 712,52 лева с ДДС 3,7 % непредвидени разходи.

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец 4.4), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- Часова ставка: 4,80 лв/чч.
- Допълнителни разходи върху труд: 95,00 %.
- Допълнителни разходи върху механизация: 35,00 %.



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

- Доставно-складови разходи: 4,00 %.
- Печалба: 8,00 %.

Допълнително непредвидени, но технологично необходими и възникнали в процеса на работа видове СМР, ще се заплащат, въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, които единични цени ще са изготвени при посочените по-горе ценообразуващи показатели.

Цената за изпълнение на договора:

- включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, включително и 3,7 % /до 3,7% /- непредвидени СМР.
- е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и инвестиционния проект по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 19.08.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
[инж. Горчай Сюлейман-
Управител на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД]



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Важно!!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликчета с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: " Улица Александър Стамболийски "

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	580.67 ✓	1.46 лв. ✓	847.78 лв.
7	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	18.00 ✓	10.48 лв. ✓	188.64 лв.
ЗЕМНИ РАБОТИ:					1 036.42 лв.
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	129.40 ✓	132.08 лв. ✓	17 091.15 лв.
2	Доставка и полагане на пълтна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1 101.14 ✓	14.12 лв. ✓	15 548.10 лв.
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2 202.28 ✓	0.86 лв. ✓	1 893.96 лв.
АСФАЛТОВИ РАБОТИ:					34 533.21 лв.
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	10.36 ✓	9.99 лв. ✓	103.50 лв.
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2.00 ✓	225.96 лв. ✓	451.92 лв.
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6.00 ✓	57.89 лв. ✓	347.34 лв.
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	20.00 ✓	80.39 лв. ✓	1 607.80 лв.
5	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	6.00 ✓	137.09 лв. ✓	822.54 лв.
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	6.00 ✓	51.72 лв. ✓	310.32 лв.
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	2.00 ✓	51.72 лв. ✓	103.44 лв.
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	2.00 ✓	51.72 лв. ✓	103.44 лв.
9	Изработка на четирикрак метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	6.00 ✓	68.29 лв. ✓	409.74 лв.
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	2.00 ✓	68.29 лв. ✓	136.58 лв.
ПЪТНИ РАБОТИ:					4 396.62 лв.
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м'	62.00 ✓	1.97 лв. ✓	122.14 лв.

2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	46.00	25.59 лв.	1 177.14 лв.
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	77.00	3.91 лв.	301.07 лв.
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					1 600.35 лв.
Общо за обекта без ДДС:					41 566.60 лв.
20 % ДДС :					8 313.32 лв.
ВСИЧКО :					49 879.92 лв.

ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	374.70	1.84 лв.	689.45 лв.
2	Разваляне на стар тротоар вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м2	1 374.00	4.08 лв.	5 605.92 лв.
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл. натоварване и извозване до склад	бр.	2.00	32.11 лв.	64.22 лв.
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	2.00	60.65 лв.	121.30 лв.
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	260.96	2.92 лв.	762.00 лв.
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	374.70	26.80 лв.	10 041.96 лв.
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	260.96	14.95 лв.	3 901.35 лв.
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1 304.81	33.25 лв.	43 384.93 лв.
Общо за тротоари без ДДС:					64 571.13 лв.
20 % ДДС :					12 914.23 лв.
ВСИЧКО :					77 485.36 лв.

Обща цена за СМР в лева без ДДС:	106137.73
Непредвидени разходи 3.7 %:	3927.10
20 % ДДС:	22012.97
Обща цена - Всичко за обекта:	132077.80

Управител:

/ инж. Георчай Сюлейман /



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679


Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“;

	Пътна фреза:	0,38	мсм
	Самосвал:	1,69	мсм
	Бордова кола:	5,81	мсм
	Валек до 10т:	8,26	мсм
	Валек до 22т:	2,24	мсм
Асфалторазстилка:		1,80	мсм
	Валек до 2т:	1,11	мсм
Маркировъчна машина:		0,04	мсм
	Автозвудатор:	0,33	мсм
	Фугорезачка:	1,32	мсм
	Багер:	4,12	мсм
	Грейдер:	0,29	мсм
	Булдозер:	1,30	мсм

/ инж. Гюрчай Сюлейман /


ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА - Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“;

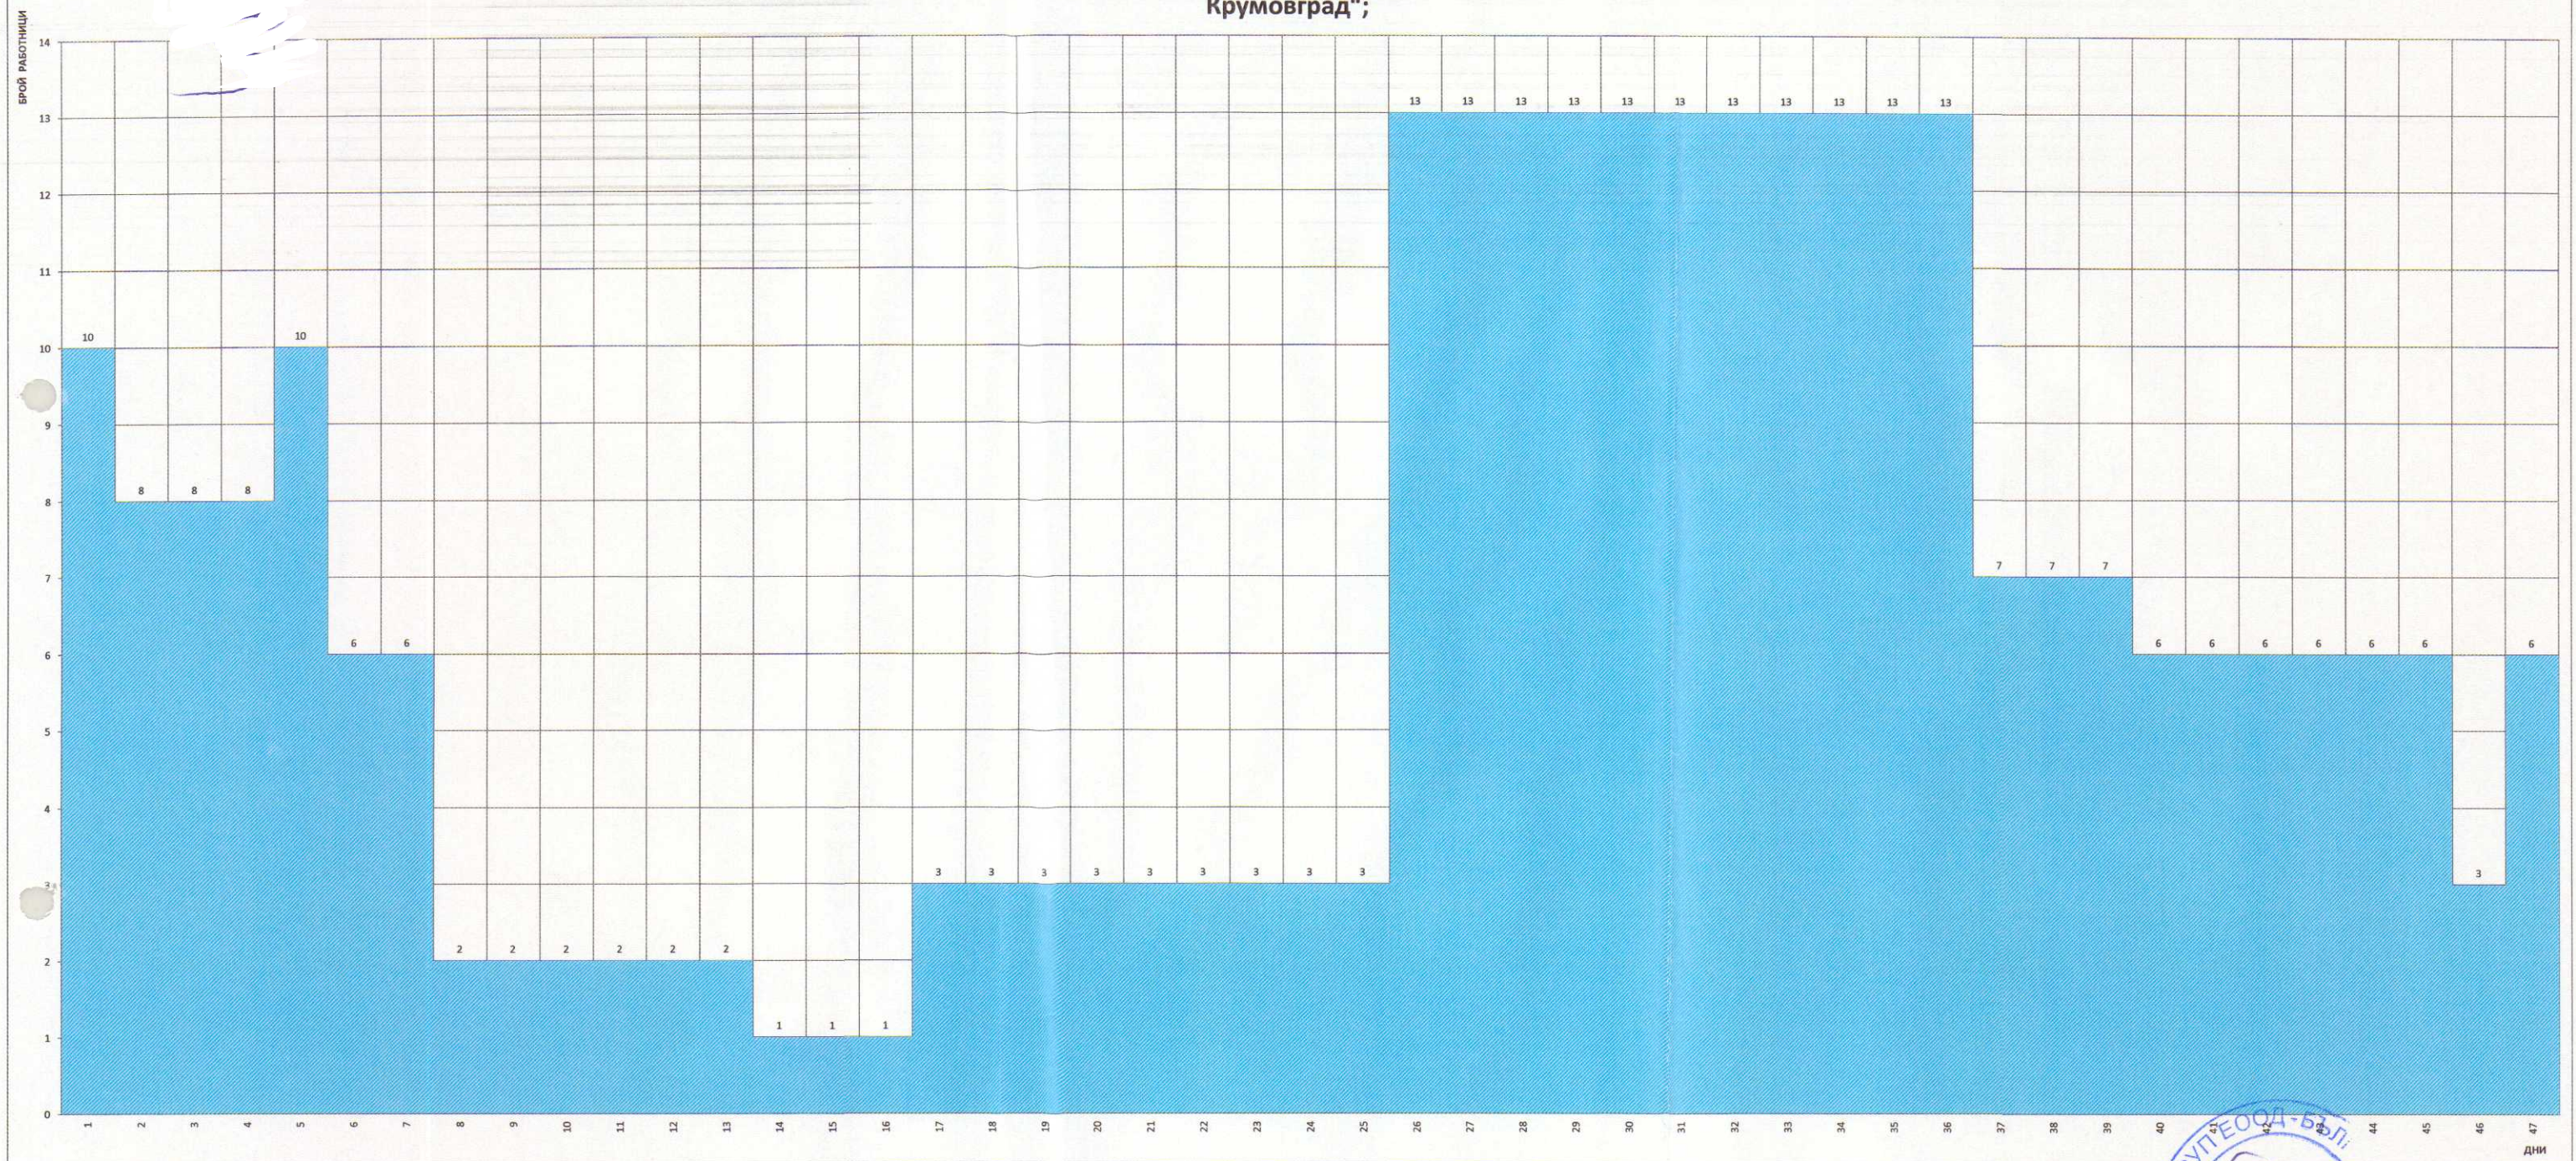

ПОДПИС:

/ инж. Горчай Сюлейман /

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА - Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“;

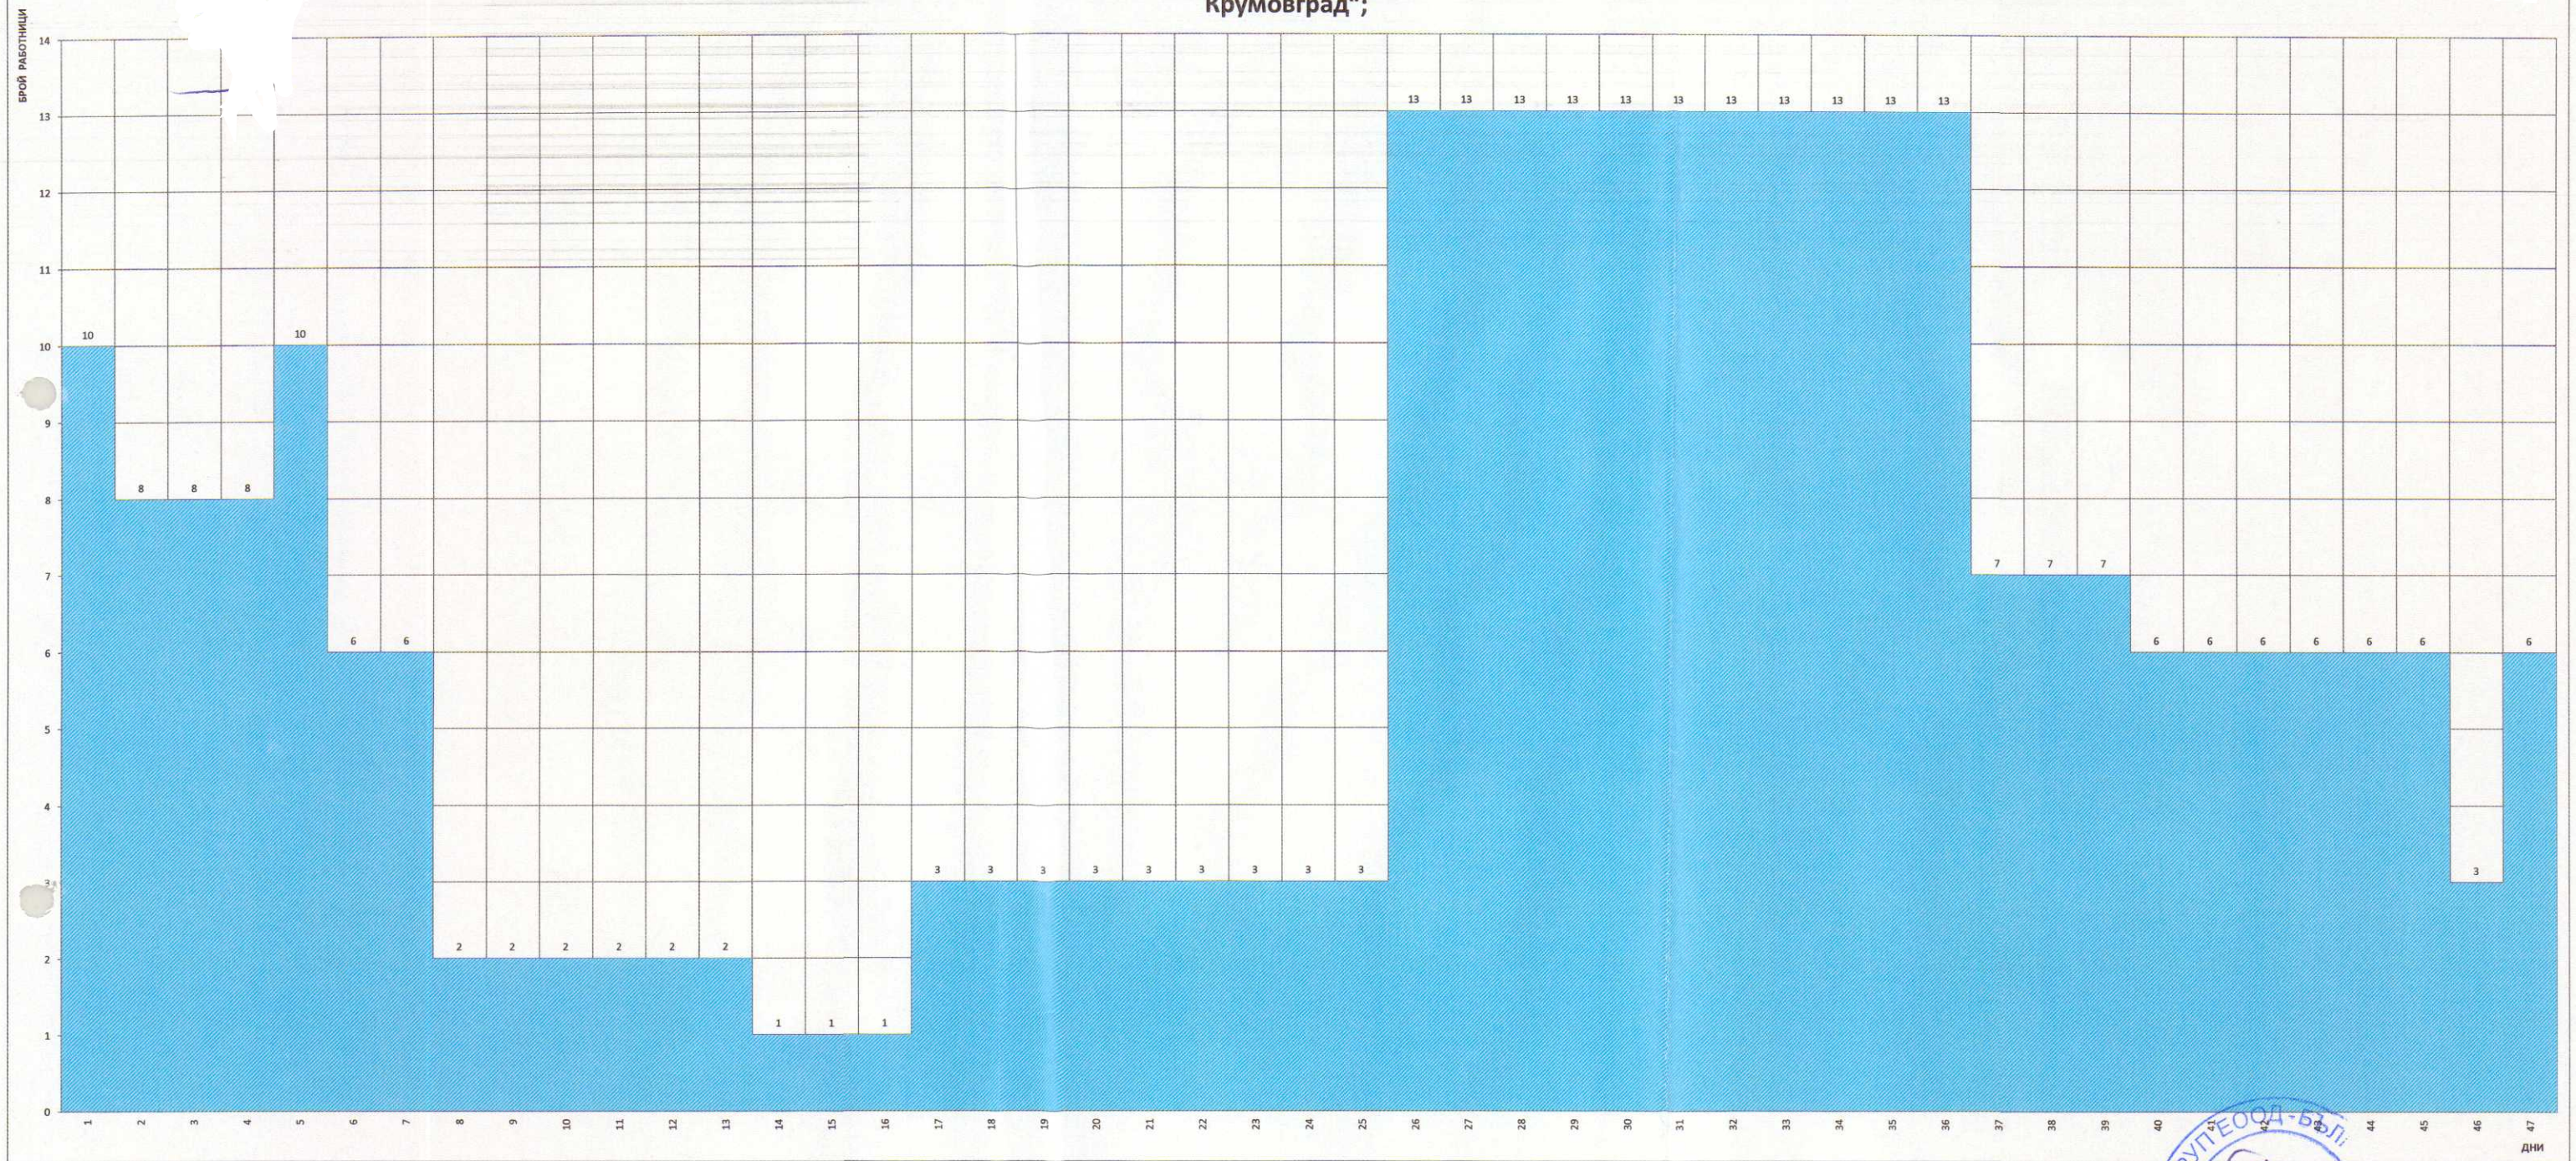

ПОДПИС:
/ инж. Горчай Сюлейман /
